SINAR DELIMA, KSO

BTN Makkio Baji Blok E9/2A, RT 006, RW 005, Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar

Parepare, 24 Januari 2025

Nomor : 021-A/SD/I/2025
Lamp. : -

Kepada Yth :
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Parepare T.A 2024
Di-
Tempat

Perihal : Pengajuan Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO)

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Nomor : In.39/KU.00.2?PPK-SBSN/370/6/2024 tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (7-6-2024) Beserta Perubahannya, maka dengan hormat kami mengajukan penyerahan akhir pekerjaan tersebut. Adapun kami menugaskan sebagai wakil koordinator untuk melaksanakan serah terima pertama pekerjaan tersebut adalah:

1. Imran Syahruddin bertugas sebagai Project Manager
2. Agus Sarwanto bertugas sebagai Site Manager
3. Shila Selvika bertugas sebagai Quantity
4. Sudirman bertugas sebagai Drafter dan tenaga admin Teknik
5. Sri Saniawati Ilyas bertugas sebagai Keuangan
6. Setiyadjie Bertugas Sebagai Pelaksana
7. Muhammad Satria Gisdar P bertugas sebagai Logistik

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pelaksana Pekerjaan
SINAR DELIMA, KSO

SINAR DELIMA, KSO

ANDREW KRISNA EKAPUTRA
Kuasa KSO

Tembusan:
1. Rektor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Tim Pengelola SBSN Tahun 2024;
3. Konsultan Pengawas;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
Po Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Parepare, 25 Januari 2024

Kepada

Nomor	:	In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/27 /1/2025
Lampiran	:	1 Set
Perihal	:	Instruksi Pemeriksaan dan Pengujian

Yth. Direktur PT Biosfera Widhy Engineering
Selaku Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Parepare
di
Tempat

Berdasarkan Surat Direktur Sinar Delima, KSO nomor 021-A/SD/1/2025 Tanggal 24 Januari 2024 Perihal *Permohonan Pemeriksaan Hasil Sementara Pekerjaan (PHO)*, maka dengan Hormat disampaikan untuk melakukan pemeriksaan dan Pengujian hasil Pekerjaan terhadap:

Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Parepare
Nomor/Tanggal Kontrak	:	In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tanggal Tujuh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Empat (7-6-2024) beserta perubahannya.
Nilai Kontrak	:	Rp. 38.483.500.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan Terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu,

Akmal Ibrahim, S.Kom, M.M
NIP. 198206022014111003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. KPA (sebagai laporan).
2. Arsip

PT. BIOSFERA WIDHY ENGINEERING
RANCANGBANGUN, PEREKAYASAAN DAN MANAJEMEN
Jl. Letjend. Hertasning C-1 Phone 081344150094 Fax 62411-871539, Makassar
Email :pt.biosferawidhy@yahoo.co.id
SULAWESI SELATAN - INDONESIA

Parepare 26 Januari 2025

Nomor : 033/PHO/BWE
Lampiran : -

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung
Laboratorium Terpadu IAIN Parepare
Di-
Tempat

Perihal : Laporan Hasil Verifikasi Lapangan

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : B.27/In.39/KU.00.2/PPK/1/2025 tanggal 25 Januari 2025 Perihal Instruksi Pemeriksaan dan Pengujian, maka dengan hormat kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan dan Pengujian hasil Pekerjaan terhadap:

Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Parepare
Nomor/Tanggal Kontrak	:	In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tanggal Tujuh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Empat (7- 6-2024) beserta perubahannya.
Nilai Kontrak	:	Rp. 38.483.500.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Verifikasi lapangan yang telah dilakukan dinyatakan bahwa Penyedia **telah menyelasaikan/tidak menyelesaikan** pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan kami mengajukan laporan dokumen terlampir dalam rangka persetujuan,
Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Konsultan Pengawas
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu
PT. Biosfera Widhy Engineering

Iqbal Mastur, ST., MT
Team Leader

Tembusan:
1. KPA (sebagai laporan)
2. Pelaksana Pekerjaan Sinar Delima, KSO
3. Arsip.

PT. BIOSFERA WIDHY ENGINEERING
RANCANGBANGUN, PEREKAYASAAN DAN MANAJEMEN
Jl. Letjend. Hertasning C-1 Phone 081344150094 Fax 62411-871539, Makassar
Email : pt.biosferawidhy@yahoo.co.id
SULAWESI SELATAN - INDONESIA

Parepare, 26 Januari 2025

Nomor : 033/PHO/IBWE
Lampiran : -

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung
Laboratorium Terpadu IAIN Parepare
Di-
Tempat

Perihal : Laporan Hasil Verifikasi Lapangan

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : B.27/In.39/KU.00.2/PPK/1/2025 tanggal 25 Januari 2025 Perihal Instruksi Pemeriksaan dan Pengujian, maka dengan hormat kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan dan Pengujian hasil Pekerjaan terhadap:

Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Parepare
Nomor/Tanggal Kontrak	:	In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/370/6/2024 Tanggal Tujuh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Empat (7- 6-2024) beserta perubahannya.
Nilai Kontrak	:	Rp. 38.483.500.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Verifikasi lapangan yang telah dilakukan dinyatakan bahwa Penyedia **telah menyelesaikan/~~tidak menyelesaikan~~** pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan kami mengajukan laporan dokumen terlampir dalam rangka persetujuan.

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Konsultan Pengawas
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu
PT. Biosfera Widhy Engineering

Iqbal Mastur, ST., MT
Team Leader

Tembusan:
1. KPA (sebagai laporan)
2. Pelaksana Pekerjaan Sinar Delima, KSO
3. Arsip.

final pho

RENCANA KEGIATAN MASA PEMELIHARAAN

NO	KEGIATAN	URAIAN	PENANGANAN
1	Memperbaiki	1. Pekerjaan yang kurang bagus	
		2. Lantai 5 Jika ada atap bocor	✓
		3. Lantai dalam ruangan pecah	✓
		4. Lampu tidak menyala	
		5. Plafond rusak	
		6. Acp yang rusak	✓
		7. Silikon jendela kaca	✓
		8. Perapian Instalasi Listrik	
		9. Rembesan balkon lantai 2 untuk pembuangan air kelantai 1 zona A	✓
		10.Plamir Dinding	✓
2	Pengetesan	1. Fungsi bangunan apakah layak untuk izin pakai bangunan	
		2. Sanitasi air bersih	
		3. Sanitasi air kotor	✓
		4. Saluran WC	✓
3	Penyelesaian	Administrasi kontrak	
4	Bongkar	1. Faslitas Proyek	
		2. Barak pekerja	
		3. Macam-macam perlengkapan pembangunan	✓
5	Lain-lain	Yang tidak termasuk pada angka 1-4 yang menjadi tanggungjawab penyedia, harus dikerjakan/ diperbaiki sampai waktu yang ditentukan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)	✓

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132
website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Dibuat Oleh :
Kosnsultan Pengawas
PT. BIOSFERA WIDHY ENGINEERING

REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Pekerjaan : **PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU**
Lokasi : **KOTA PAREPARE**
Sumber Dana : **SBSN**
Tahun Anggaran : **2024**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRES BOBOT REALISASI (%)		
			MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	1,251	1,251	-	1,251
II	**GEDUNG LABORATORIUM TERPADU**				
1	PEKERJAAN PONDASI	13,688	13,457	0,231	13,688
2	PEKERJAAN STRUKTUR	35,492	35,492	-	35,492
3	PEKERJAAN ATAP	1,365	1,365	-	1,365
4	PEKERJAAN ARSITEKTUR	26,744	26,515	0,160	26,674
5	PEKERJAAN SANITAIR	1,270	0,958	0,311	1,270
6	PEKERJAAN MECHANIKAL ELEKTRIKAL	19,319	18,174	1,087	19,261
III	**PEKERJAAN LANDSCAPE**	0,477	0,477	-	0,477
IV	**RUMAH GENSET**	0,446	0,400	0,046	0,446
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN	100	98,09	1,83	99,92
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN		100,00	-	100,00
	DEVIASI		- 1,91	-	- 0,08

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu
Istitut Agama Islam Negeri Parepare

Akmal Ibrahim, S.Kom., M.M
NIP. 198206022014111003

Parepare, 26 Januari 2025
Dibuat Oleh :
Konsultan Supervisi
PT. Biosfera Widhy Engineering

Iqbal Maulana, ST., MT
Team Leader

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Diisi (Isi):
Konsultan Pengawas
PT. BIOSFERA WIDHY ENGINEERING

RINCIAN LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU
Lokasi : KOTA PAREPARE
Sumber Dana : BMN
Tahun Anggaran : 2024

Kontraktor Pelaksana : Sinar Delima, KSO
Minggu Ke : 04 (Tiga Puluh Empat)
Periode : 22 Januari s/d 26 Januari 2025

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					KEMAJUAN PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN												
	Penyiapan Dokumen SMKK												
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00	0,006	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,006	-	0,006
	Pembuatan Pelaporan Penerapan SMKK	Set	1,00	0,010	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,010	-	0,010
	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan												
	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Org	100,00	0,001	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	0,001	-	0,001
	Pelatihan Keselamatan Konstruksi												
	Tenaga Ahli Ketinggian	Org	50,00	0,004	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	0,004	-	0,004
	Sparatus (Harness)	Ut	5,00	0,001	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,001	-	0,001
	Pegas Pengaman V2	Bh	3,00	0,005	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,005	-	0,005
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri												
	Pagar Pengaman Sisi Galembang Setinggi 1,8 m	m1	109,31	0,111	100,000	-	100,000	109,306	-	109,306	0,111	-	0,111
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	100,00	0,013	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	0,013	-	0,013
	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Box	10,00	0,000	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	0,000	-	0,000
	Sarung Tangan	Pr	100,00	0,004	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	0,004	-	0,004
	Sepatu Keselamatan	Pr	100,00	0,029	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	0,029	-	0,029
	Kamp Keselamatan	Bh	100,00	0,005	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	0,005	-	0,005
	Body Harness	Bh	20,00	0,020	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	0,020	-	0,020
	Asuransi dan Perizinan												
	Asuransi (Construction All Risk)	Ls	1,00	0,059	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,059	-	0,059
	Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan												
	Peralatan P3K	Set	5,00	0,029	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,029	-	0,029
	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 1 kg	Bh	2,00	0,005	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,005	-	0,005
	Perbaikan Mobile Crane	Bh	2,37	0,829	100,000	-	100,000	2,370	-	2,370	0,829	-	0,829
	Awal menggunakan Crane 25 ton (tanggung jawab kontraktor)												
	Untuk 12-4 trip Biaya menggunakan Crane 50 ton,												
	mengakan Add. Pekerjaan ini tidak dapat dijanjikan,												
	Rambu-Rambu K3												
	Rambu Peringatan	Bh	5,00	0,001	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,001	-	0,001
	Rambu Petunjuk	Bh	5,00	0,001	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,001	-	0,001
	Rambu Larangan	Bh	5,00	0,001	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,001	-	0,001
	Pengaturan dan Pemasangan Bunderan	m1	95,00	0,016	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000	0,016	-	0,016
	II. GEDUNG LABORATORIUM TERPADU												
	1.PEKERJAAN PONDASI												
	1. Pondasi Bore Pile & Pile Cap P1												
1	Pek. Pengeboran Wash Boring	m1	436,00	0,402	100,000	-	100,000	436,00	-	436,00	0,402	-	0,402
2	Pek. Pengeboran Hidrolik	m1	941,00	1,766	100,000	-	100,000	941,000	-	941,000	1,766	-	1,766
	Beton Bore Pile Kelas K.300	Kg	281,60	0,181	100,000	-	100,000	281,600	-	281,600	0,181	-	0,181
3	Besi Beton Ulir Bore Pile	Kg	18.181,32	0,825	100,000	-	100,000	18.181,320	-	18.181,320	0,825	-	0,825
4	Besi Beton Polos Bore Pile	Kg	3.194,09	0,203	100,000	-	100,000	3.194,090	-	3.194,090	0,203	-	0,203
5	Beton K300 (Ready Mix)	m3	164,28	0,773	100,000	-	100,000	164,280	-	164,280	0,773	-	0,773
	Beton K300 (Ready Mix), penambahan adukan dia. 40 cm,	m3	157,68	0,704	100,000	-	100,000	157,680	-	157,680	0,704	-	0,704
	menjadi 40 cm (rencana/ bentuk asal)												
	Beton K300 (Ready Mix) dia. 60 cm (2 titik)	m3	3,42	0,015	100,000	-	100,000	3,423	-	3,423	0,015	-	0,015
6	Galian Pile Cap	m3	105,60	0,024	100,000	-	100,000	105,600	-	105,600	0,024	-	0,024
	Galian P.Cap Gandulan (berada di atas : -0,70 m) T= 2,5 x	m3	101,25	0,091	100,000	-	100,000	101,250	-	101,250	0,091	-	0,091
	Galian Pile Cap (Tanah keras)	m3	105,60	0,095	100,000	-	100,000	105,600	-	105,600	0,095	-	0,095
7	Urugan Pasir Bawah Pile Cap (T = 5 cm)	m3	6,00	0,004	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,004	-	0,004
8	Rabat Beton Bawah Pile Cap (T = 10 cm)	m3	12,00	0,043	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,043	-	0,043
9	Bekisting Pile Cap	m2	180,00	0,073	100,000	-	100,000	180,000	-	180,000	0,073	-	0,073
10	Besi Beton Ulir	Kg	9.612,10	0,764	100,000	-	100,000	9.612,100	-	9.612,100	0,764	-	0,764
11	Beton K300 (Ready Mix)	m3	108,00	0,482	100,000	-	100,000	108,000	-	108,000	0,482	-	0,482
	2. Pondasi Bore Pile & Pile Cap P2												
1	Pek. Pengeboran Wash Boring	m1	377,31	0,348	100,000	-	100,000	377,310	-	377,310	0,348	-	0,348
2	Pek. Pengeboran Hidrolik	m1	774,19	1,447	100,000	-	100,000	774,190	-	774,190	1,447	-	1,447
3	Besi Beton Ulir Bore Pile	Kg	14.538,75	0,773	100,000	-	100,000	14.538,750	-	14.538,750	0,773	-	0,773
4	Besi Beton Polos Bore Pile	Kg	3.091,00	0,164	100,000	-	100,000	3.091,000	-	3.091,000	0,164	-	0,164
5	Beton (K300) Ready Mix	m	144,63	0,646	100,000	-	100,000	144,630	-	144,630	0,646	-	0,646
6	Galian Pile Cap	m3	151,25	0,024	100,000	-	100,000	151,250	-	151,250	0,024	-	0,024
	Galian Pile Cap (Tanah keras)	m3	70,40	0,063	100,000	-	100,000	70,400	-	70,400	0,063	-	0,063
7	Urugan Pasir Bawah Pile Cap (T = 5 cm)	m3	6,05	0,004	100,000	-	100,000	6,050	-	6,050	0,004	-	0,004
8	Rabat Beton Bawah Pile Cap (T = 10 cm)	m3	12,10	0,043	100,000	-	100,000	12,100	-	12,100	0,043	-	0,043
9	Bekisting Pile Cap	m2	180,00	0,073	100,000	-	100,000	180,000	-	180,000	0,073	-	0,073
10	Besi Beton Ulir	Kg	8.902,62	0,594	100,000	-	100,000	8.902,620	-	8.902,620	0,594	-	0,594
11	Beton K300 (Ready Mix)	m3	90,00	0,402	100,000	-	100,000	90,000	-	90,000	0,402	-	0,402
	3. Pondasi Bore Pile & Pile Cap P3				-		-						
1	Pek. Pengeboran Wash Boring	m1	56,06	0,052	100,000	-	100,000	56,060	-	56,060	0,052	-	0,052
2	Pek. Pengeboran Hidrolik	m1	18,44	0,034	100,000	-	100,000	18,440	-	18,440	0,034	-	0,034
3	Besi Beton Ulir Bore Pile	Kg	940,63	0,050	100,000	-	100,000	940,630	-	940,630	0,050	-	0,050
4	Besi Beton Polos Bore Pile	Kg	201,81	0,011	100,000	-	100,000	201,810	-	201,810	0,011	-	0,011
5	Beton (K300) Ready Mix	m3	9,36	0,042	100,000	-	100,000	9,360	-	9,360	0,042	-	0,042
6	Galian Pile Cap	m3	6,60	0,002	100,000	-	100,000	6,600	-	6,600	0,002	-	0,002
	Galian Pile Cap (Tanah keras)	m3	2,20	0,002	100,000	-	100,000	2,200	-	2,200	0,002	-	0,002
	(Tambahan 1 unit di sb x04-x9-y03)				-		-						
7	Urugan Pasir Bawah Pile Cap (T = 5 cm)	m3	0,53	0,000	100,000	-	100,000	0,530	-	0,530	0,000	-	0,000
8	Rabat Beton Bawah Pile Cap (T = 10 cm)	m3	1,05	0,004	100,000	-	100,000	1,050	-	1,050	0,004	-	0,004
9	Bekisting Pile Cap	m2	21,60	0,009	100,000	-	100,000	21,600	-	21,600	0,009	-	0,009
10	Besi Beton Ulir	Kg	2.092,32	0,111	100,000	-	100,000	2.092,320	-	2.092,320	0,111	-	0,111
11	Beton K300 (Ready Mix)	m3	7,20	0,032	100,000	-	100,000	7,200	-	7,200	0,032	-	0,032
	Penambahan PC-3=1 bh (titik 236.A & 232.a)												
	Galian Pile Cap (Tanah keras)	m3	6,60	0,006	100,000	-	100,000	6,600	-	6,600	0,006	-	0,006
	Urugan Pasir Bawah Pile Cap (T = 5 cm)	m3	0,26	0,000	100,000	-	100,000	0,264	-	0,264	0,000	-	0,000
	Rabat Beton Bawah Pile Cap (T = 10 cm)	m3	0,53	0,002	100,000	-	100,000	0,528	-	0,528	0,002	-	0,002
	Bekisting Pile Cap	m2	10,80	0,004	100,000	-	100,000	10,800	-	10,800	0,004	-	0,004
	Besi Beton Ulir	kg	536,70	0,029	100,000	-	100,000	536,705	-	536,705	0,029	-	0,029
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	3,60	0,016	100,000	-	100,000	3,600	-	3,600	0,016	-	0,016
	4. Pondasi Bore Pile & Pile Cap P4												
1	Pek. Pengeboran Wash Boring	m1	43,60	0,040	100,000	-	100,000	43,600	-	43,600	0,040	-	0,040
2	Pek. Pengeboran Hidrolik	m1	36,90	0,069	100,000	-	100,000	36,900	-	36,900	0,069	-	0,069
3	Besi Beton Ulir Bore Pile	Kg	1.014,39	0,056	100,000	-	100,000	1.014,390	-	1.014,390	0,056	-	0,056
4	Besi Beton Polos Bore Pile	Kg	222,13	0,012	100,000	-	100,000	222,130	-	222,130	0,012	-	0,012
5	Beton (K300) Ready Mix	m3	10,11	0,045	100,000	-	100,000	10,110	-	10,110	0,045	-	0,045
6	Galian Pile Cap	m3	10,00	0,003	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	0,003	-	0,003
7	Urugan Pasir Bawah Pile Cap (T = 5 cm)	m3	0,40	0,000	100,000	-	100,000	0,400	-	0,400	0,000	-	0,000
8	Rabat Beton Bawah Pile Cap (T = 10 cm)	m3	0,80	0,003	100,000	-	100,000	0,800	-	0,800	0,003	-	0,003
9	Bekisting Pile Cap	m2	15,36	0,006	100,000	-	100,000	15,360	-	15,360	0,006	-	0,006
10	Besi Beton Ulir	Kg	494,94	0,026	100,000	-	100,000	494,940	-	494,940	0,026	-	0,026
11	Beton K300 (Ready Mix)	m3	3,07	0,014	100,000	-	100,000	3,070	-	3,070	0,014	-	0,014
	Penambahan PC-4=1 bh (titik 38.A -31.A-24.A-141A-172A)												
	Galian Pile Cap (Tanah keras)		6,25	0,006	100,000	-	100,000	6,250	-	6,250	0,006	-	0,006
	Urugan Pasir Bawah Pile Cap (T = 5 cm)		0,25	0,000	100,000	-	100,000	0,250	-	0,250	0,000	-	0,000
	Rabat Beton Bawah Pile Cap (T = 10 cm)		0,50	0,002	100,000	-	100,000	0,500	-	0,500	0,002	-	0,002
	Bekisting Pile Cap		9,60	0,004	100,000	-	100,000	9,600	-	9,600	0,004	-	0,004
	Besi Beton Ulir		309,34	0,016	100,000	-	100,000	309,335	-	309,335	0,016	-	0,016
	Beton K300 (Ready Mix)		1,92	0,009	100,000	-	100,000	1,920	-	1,920	0,009	-	0,009
	5. Pondasi Bore Pile & Pile Cap (Pondasi Lift)												
1	Pek. Pengeboran Wash Boring	m1	204,00	0,188	100,000	-	100,000	204,000	-	204,000	0,188	-	0,188
2	Besi Beton Ulir Bore Pile	Kg	2.487,31	0,132	100,000	-	100,000	2.487,310	-	2.487,310	0,132	-	0,132
3	Besi Beton Polos Bore Pile	Kg	540,98	0,029	100,000	-	100,000	540,980	-	540,980	0,029	-	0,029
4	Beton K300 (Ready Mix)	m3	24,74	0,110	100,000	-	100,000	24,740	-	24,740	0,110	-	0,110
5	Galian Pile Cap	m3	43,76	0,015	100,000	-	100,000	43,760	-	43,760	0,015	-	0,015

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					RENCANA PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
6	Lhugan Pasir Bawah Pile Cap (T = 5 cm)	m3	1,07	0,001	100,000	-	100,000	1,070	-	1,070	0,001	-	0,001
7	Rabat Beton Bawah Pile Cap (T = 10 cm)	m3	2,14	0,008	100,000	-	100,000	2,140	-	2,140	0,008	-	0,008
8	Bekisting Pile Cap	m2	43,56	0,018	100,000	-	100,000	43,560	-	43,560	0,018	-	0,018
9	Besi Beton Ulir	Kg	2.174,52	0,116	100,000	-	100,000	2.174,520	-	2.174,520	0,116	-	0,116
10	Beton K300 (Ready Mix)	m3	14,00	0,071	100,000	-	100,000	14,000	-	14,000	0,071	-	0,071
11	Bekisting Pit lift	m2	47,40	0,028	100,000	-	100,000	47,400	-	47,400	0,028	-	0,028
12	Besi Beton Ulir Pit Lift	Kg	1.450,82	0,077	100,000	-	100,000	1.450,820	-	1.450,820	0,077	-	0,077
13	Beton K300 (Ready Mix)	m3	8,69	0,079	100,000	-	100,000	8,690	-	8,690	0,079	-	0,079
14	Pek. Waterproofing Sika	m2	34,76	0,012	100,000	-	100,000	34,760	-	34,760	0,012	-	0,012
	Pek. Water Stop	m'	24,00	0,019	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,019	-	0,019
15	Pengujian PDA Test	Titik	3,00	0,199	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,199	-	0,199
	6. Pek. Pedestal Kolom K3 (90 x 90)												
1	Bekisting	m2	33,29	0,020	100,000	-	100,000	33,290	-	33,290	0,020	-	0,020
2	Besi Beton Ulir	Kg	608,60	0,032	100,000	-	100,000	608,600	-	608,600	0,032	-	0,032
3	Beton K300 (Ready Mix)	m3	2,69	0,012	100,000	-	100,000	2,690	-	2,690	0,012	-	0,012
	7. Pek. Pedestal Kolom K4 (40 x 40)												
1	Bekisting	m2	13,44	0,008	100,000	-	100,000	13,440	-	13,440	0,008	-	0,008
2	Besi Beton Polos	Kg	88,04	0,005	100,000	-	100,000	88,040	-	88,040	0,005	-	0,005
3	Besi Beton Ulir	Kg	298,48	0,016	100,000	-	100,000	298,480	-	298,480	0,016	-	0,016
4	Beton K300 (Ready Mix)	m3	1,34	0,008	100,000	-	100,000	1,340	-	1,340	0,008	-	0,008
	8. Pek. Pondasi Batu Gunung												
1	Galian Tanah Pondasi	m3	95,12	0,026	100,000	-	100,000	95,120	-	95,120	0,026	-	0,026
2	Lhugan Pasir Bawah Pondasi	m3	6,19	0,004	100,000	-	100,000	6,190	-	6,190	0,004	-	0,004
3	Lhugan Tanah Kembali	m3	31,71	0,009	100,000	-	100,000	31,710	-	31,710	0,009	-	0,009
4	Pas. Batu kosong	m3	24,86	0,034	100,000	-	100,000	24,860	-	24,860	0,034	-	0,034
5	Pas. Bats. Gunung Campuran 1 : 4	m3	57,11	0,165	100,000	-	100,000	57,110	-	57,110	0,165	-	0,165
	9. Pek. Pondasi Batu Sokoran dan Penggung												
1	Galian Tanah Pondasi	m3	13,52	0,004	80,000	20,000	100,000	10,816	-	10,816	0,003	0,001	0,004
2	Lhugan Pasir Bawah Pondasi	m3	1,78	0,001	80,000	20,000	100,000	1,424	0,356	1,780	0,001	0,000	0,001
3	Pas. Pondasi 1½ Batu Bata Campuran 1 3	m2	285,12	0,126	80,000	20,000	100,000	228,096	57,024	285,120	0,101	0,025	0,126
4	Pek. Plesteran Saluran Campuran 1 3	m2	384,00	0,091	80,000	20,000	100,000	307,200	76,800	384,000	0,073	0,018	0,091
5	Pek Gill Penutup Saluran	m1	160,00	0,196	-	100,000	100,000	-	160,000	160,000	-	0,196	0,196
	10. Pek. Pondasi Tangga												
1	Galian Tanah Pondasi	m3	5,40	0,001	100,000	-	100,000	5,400	-	5,400	0,001	-	0,001
2	Lhugan Pasir Bawah Pondasi	m3	0,18	0,000	100,000	-	100,000	0,180	-	0,180	0,000	-	0,000
3	Rabat Beton Bawah Pondasi	m3	0,36	0,001	100,000	-	100,000	0,360	-	0,360	0,001	-	0,001
4	Bekisting Tangga	m2	17,07	0,013	100,000	-	100,000	17,070	-	17,070	0,013	-	0,013
5	Besi Beton Polos	Kg	252,64	0,013	100,000	-	100,000	252,640	-	252,640	0,013	-	0,013
6	Beton K300 (Ready Mix)	m3	2,16	0,010	100,000	-	100,000	2,160	-	2,160	0,010	-	0,010
	II. GEDUNG LABORATORIUM TERPADU												
	PENERJAAN STRUKTUR												
	1. LANTAI 1 (TOC -0,10)												
	1.Balok S1 (30 x 60)												
	Rabat Beton Bawah Balok (T = 10 cm)	m3	8,73	0,071	100,000	-	100,000	8,730	-	8,730	0,071	-	0,071
	Bekisting	m2	505,32	0,210	100,000	-	100,000	505,320	-	505,320	0,210	-	0,210
	Besi Beton Polos	Kg	3.979,08	0,211	100,000	-	100,000	3.979,080	-	3.979,080	0,211	-	0,211
	Besi Beton Ulir	Kg	8.024,47	0,427	100,000	-	100,000	8.024,470	-	8.024,470	0,427	-	0,427
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	75,80	0,339	100,000	-	100,000	75,800	-	75,800	0,339	-	0,339
	2.Balok B2 (40 x 80)												
	Rabat Beton Bawah Balok (T = 10 cm)	m3	0,68	0,002	100,000	-	100,000	0,680	-	0,680	0,002	-	0,002
	Bekisting	m2	32,64	0,014	100,000	-	100,000	32,640	-	32,640	0,014	-	0,014
	Besi Beton Polos	Kg	229,71	0,012	100,000	-	100,000	229,710	-	229,710	0,012	-	0,012
	Besi Beton Ulir	Kg	483,79	0,026	100,000	-	100,000	483,790	-	483,790	0,026	-	0,026
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	5,44	0,024	100,000	-	100,000	5,440	-	5,440	0,024	-	0,024
	3.Balok B3 (15 x 20)												
	Bekisting	m2	21,52	0,009	100,000	-	100,000	21,520	-	21,520	0,009	-	0,009
	Besi Beton Polos	Kg	324,21	0,017	100,000	-	100,000	324,210	-	324,210	0,017	-	0,017
	Beton K225	m3	1,81	0,007	100,000	-	100,000	1,810	-	1,810	0,007	-	0,007
	4.Kolom K1 (90 x 90)												
	Bekisting	m2	103,68	0,062	100,000	-	100,000	103,680	-	103,680	0,062	-	0,062
	Besi Beton Ulir	Kg	6.184,92	0,329	100,000	-	100,000	6.184,920	-	6.184,920	0,329	-	0,329
	Besi Beton Ulir (tambahan area kolom el. -0,80 s/d -1,60	Kg	55,89	0,003	100,000	-	100,000	55,887	-	55,887	0,003	-	0,003
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	23,04	0,103	100,000	-	100,000	23,040	-	23,040	0,103	-	0,103
	5.Kolom K2 (80 x 80)												
	Bekisting	m2	760,32	0,455	100,000	-	100,000	760,320	-	760,320	0,455	-	0,455
	Besi Beton Ulir	Kg	39.814,63	2,116	100,000	-	100,000	39.814,630	-	39.814,630	2,116	-	2,116
	Besi Beton Ulir (tambahan area kolom el. -0,80 s/d -1,60	Kg	409,84	0,022	100,000	-	100,000	409,836	-	409,836	0,022	-	0,022
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	168,96	0,755	100,000	-	100,000	168,960	-	168,960	0,755	-	0,755
	6.Kolom K3 (60 x 60)												
	Bekisting	m2	105,60	0,063	100,000	-	100,000	105,600	-	105,600	0,063	-	0,063
	Besi Beton Ulir	Kg	3.996,43	0,212	100,000	-	100,000	3.996,430	-	3.996,430	0,212	-	0,212
	Besi Beton Ulir (tambahan area kolom el. -0,80 s/d -1,60	Kg	36,34	0,002	100,000	-	100,000	36,341	-	36,341	0,002	-	0,002
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	17,28	0,077	100,000	-	100,000	17,280	-	17,280	0,077	-	0,077
	7. Kolom K4 (40 x 40)												
	Bekisting	m2	38,40	0,023	100,000	-	100,000	38,400	-	38,400	0,023	-	0,023
	Besi Beton Polos	Kg	153,88	0,008	100,000	-	100,000	153,880	-	153,880	0,008	-	0,008
	Besi Beton Polos (tambahan area kolom el. -0,80 s/d -1,6	Kg	6,81	0,000	100,000	-	100,000	6,806	-	6,806	0,000	-	0,000
	Besi Beton Ulir	Kg	601,50	0,032	100,000	-	100,000	601,500	-	601,500	0,032	-	0,032
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	8,64	0,039	100,000	-	100,000	8,640	-		0,039	-	0,039
	8. Balok B14 (20 x 40) Area Lift (TOC 2,50)												
	Bekisting	m2	19,50	0,012	100,000	-	100,000	19,500	-	19,500	0,012	-	0,012
	Besi Beton Polos	Kg	97,41	0,005	100,000	-	100,000	97,410	-	97,410	0,005	-	0,005
	Besi Beton Ulir	Kg	184,65	0,010	100,000	-	100,000	184,650	-	184,650	0,010	-	0,010
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	1,56	0,007	100,000	-	100,000	1,560	-	1,560	0,007	-	0,007
	9. Balok B14 (20 x 40) Area Lift (TOC 3,30)												
	Bekisting	m2	19,50	0,012	100,000	-	100,000	19,500	-	19,500	0,012	-	0,012
	Besi Beton Polos	Kg	97,41	0,005	100,000	-	100,000	97,410	-	97,410	0,005	-	0,005

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					REALISASI PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	Besi Beton Ulir	kg	194,65	0,010	100,000	-	100,000	194,650	-	194,650	0,010	-	0,010
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	1,56	0,007	100,000	-	100,000	1,560	-	1,560	0,007	-	0,007
	10. Pek. Tangga												
	Bekisting	m2	96,21	0,057	100,000	-	100,000	96,210	-	96,210	0,057	-	0,057
	Besi Beton Polos	kg	1.214,76	0,065	100,000	-	100,000	1.214,760	-	1.214,760	0,065	-	0,065
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	9,74	0,044	100,000	-	100,000	9,740	-	9,740	0,044	-	0,044
	11.Balok Latei 1 (15 x 30)												
	Bekisting	m2	46,20	0,028	100,000	-	100,000	46,200	-	46,200	0,028	-	0,028
	Besi Beton Polos	kg	341,69	0,018	100,000	-	100,000	341,690	-	341,690	0,018	-	0,018
	Beton K225	m3	2,77	0,012	100,000	-	100,000	2,770	-	2,770	0,012	-	0,012
	12.Meja Beton												
	Bekisting	m2	4,08	0,002	100,000	-	100,000	4,080	-	4,080	0,002	-	0,002
	Besi Beton Polos	kg	33,54	0,002	100,000	-	100,000	33,540	-	33,540	0,002	-	0,002
	Beton K225	m3	0,41	0,002	100,000	-	100,000	0,410	-	0,410	0,002	-	0,002
	13.Balok Latei 2 Praktis	m1	92,40	0,040	100,000	-	100,000	92,400	-	92,400	0,040	-	0,040
	14.Kolom Praktis	m1	351,00	0,156	100,000	-	100,000	351,000	-	351,000	0,156	-	0,156
	LANTAI 2 (TOC +5,90)												
	15.Balok B11 (30 x 90)												
	Bekisting	m2	502,49	0,299	100,000	-	100,000	502,490	-	502,490	0,299	-	0,299
	Besi Beton Polos	kg	5.724,28	0,304	100,000	-	100,000	5.724,280	-	5.724,280	0,304	-	0,304
	Besi Beton Ulir	kg	12.197,77	0,648	100,000	-	100,000	12.197,770	-	12.197,770	0,648	-	0,648
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	71,78	0,321	100,000	-	100,000	71,780	-	71,780	0,321	-	0,321
	16.Balok B12 (45 x 90)												
	Bekisting	m2	41,00	0,024	100,000	-	100,000	41,000	-	41,000	0,024	-	0,024
	Besi Beton Polos	kg	471,58	0,025	100,000	-	100,000	471,580	-	471,580	0,025	-	0,025
	Besi Beton Ulir	kg	1.255,58	0,067	100,000	-	100,000	1.255,580	-	1.255,580	0,067	-	0,067
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	8,26	0,037	100,000	-	100,000	8,260	-	8,260	0,037	-	0,037
	17.Balok B13 (25 x 75)				-		-						
	Bekisting	m2	20,10	0,012	100,000	-	100,000	20,100	-	20,100	0,012	-	0,012
	Besi Beton Polos	kg	230,11	0,012	100,000	-	100,000	230,110	-	230,110	0,012	-	0,012
	Besi Beton Ulir	kg	569,95	0,030	100,000	-	100,000	569,950	-	569,950	0,030	-	0,030
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	3,26	0,015	100,000	-	100,000	3,260	-	3,260	0,015	-	0,015
	18.Balok B14 (20 x 40)												
	Bekisting	m2	197,68	0,118	100,000	-	100,000	197,680	-	197,680	0,118	-	0,118
	Besi Beton Polos	kg	1.267,52	0,067	100,000	-	100,000	1.267,520	-	1.267,520	0,067	-	0,067
	Besi Beton Ulir	kg	2.871,51	0,153	100,000	-	100,000	2.871,510	-	2.871,510	0,153	-	0,153
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	20,81	0,093	100,000	-	100,000	20,810	-	20,810	0,093	-	0,093
	18.A. Balok B14 (20 x 40) Area Balok Shaf												
	Bekisting	m2	7,89	0,005	100,000	-	100,000	7,890	-	7,890	0,005	-	0,005
	Besi Beton Polos	kg	45,69	0,002	100,000	-	100,000	45,690	-	45,690	0,002	-	0,002
	Besi Beton Ulir	kg	59,94	0,003	100,000	-	100,000	59,940	-	59,940	0,003	-	0,003
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	0,62	0,003	100,000	-	100,000	0,620	-	0,620	0,003	-	0,003
	19. Balok B14 (20 x 40) Area LIft (TOC 2,30)												
	Bekisting	m2	19,50	0,012	100,000	-	100,000	19,500	-	19,500	0,012	-	0,012
	Besi Beton Polos	kg	97,41	0,005	100,000	-	100,000	97,410	-	97,410	0,005	-	0,005
	Besi Beton Ulir	kg	194,65	0,010	100,000	-	100,000	194,650	-	194,650	0,010	-	0,010
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	1,26	0,007	100,000	-	100,000	1,560	-	1,560	0,007	-	0,007
	20. Pek. Plat Lantai Beton Konvensional												
	Bekisting	m2	70,95	0,080	100,000	-	100,000	70,950	-	70,950	0,080	-	0,080
	Besi Beton Polos	kg	1.428,80	0,076	100,000	-	100,000	1.428,800	-	1.428,800	0,076	-	0,076
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	8,51	0,038	100,000	-	100,000	8,510	-	8,510	0,038	-	0,038
	21. Pek. Plat Lantai Beton Floor Deck												
	Floor Deck 0,75	m2	647,04	0,729	100,000	-	100,000	647,040	-	647,040	0,729	-	0,729
	Wiremesh M 10	kg	6.921,47	0,314	100,000	-	100,000	6.921,470	-	6.921,470	0,314	-	0,314
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	77,64	0,347	100,000	-	100,000	77,640	-	77,640	0,347	-	0,347
	22. Pek. Tangga												
	Bekisting	m2	71,11	0,054	100,000	-	100,000	71,110	-	71,110	0,054	-	0,054
	Besi Beton Polos	kg	988,20	0,053	100,000	-	100,000	988,200	-	988,200	0,053	-	0,053
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	7,69	0,034	100,000	-	100,000	7,690	-	7,690	0,034	-	0,034
	23.Meja Beton												
	Bekisting	m2	4,08	0,002	100,000	-	100,000	4,080	-	4,080	0,002	-	0,002
	Besi Beton Polos	kg	33,54	0,002	100,000	-	100,000	33,540	-	33,540	0,002	-	0,002
	Beton K225	m3	0,41	0,002	100,000	-	100,000	0,410	-	0,410	0,002	-	0,002
	24 Pek.Kolom Praktis	m1	309,40	0,138	100,000	-	100,000	309,400	-	309,400	0,138	-	0,138
	25. Balok Latei 1 (15 x 30)												
	Bekisting	m2	33,15	0,020	100,000	-	100,000	33,150	-	33,150	0,020	-	0,020
	Besi Beton Polos	kg	245,42	0,013	100,000	-	100,000	245,420	-	245,420	0,013	-	0,013
	Beton K225	m3	1,99	0,008	100,000	-	100,000	1,990	-	1,990	0,008	-	0,008
	26. Balok Latei 2 Praktis	m1	66,90	0,029	100,000	-	100,000	66,900	-	66,900	0,029	-	0,029
	27. Kolom K1 (80 x 80)												
	Bekisting	m2	63,36	0,038	100,000	-	100,000	63,360	-	63,360	0,038	-	0,038
	Besi Beton Ulir	kg	3.660,28	0,195	100,000	-	100,000	3.660,280	-	3.660,280	0,195	-	0,195
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	15,36	0,069	100,000	-	100,000	15,360	-	15,360	0,069	-	0,069
	28. Kolom K2 (80 x 80)												
	Bekisting	m2	506,88	0,303	100,000	-	100,000	506,880	-	506,880	0,303	-	0,303
	Besi Beton Ulir	kg	23.758,47	1,263	100,000	-	100,000	23.758,470	-	23.758,470	1,263	-	1,263
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	112,64	0,503	100,000	-	100,000	112,640	-	112,640	0,503	-	0,503
	29. Kolom K4 (40 x 40)												
	Bekisting	m2	23,04	0,014	100,000	-	100,000	23,040	-	23,040	0,014	-	0,014
	Besi Beton Polos	kg	105,79	0,006	100,000	-	100,000	105,790	-	105,790	0,006	-	0,006
	Besi Beton Ulir	kg	351,51	0,019	100,000	-	100,000	351,510	-	351,510	0,019	-	0,019
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	5,18	0,023	100,000	-	100,000	5,180	-	5,180	0,023	-	0,023
	LANTAI 3 (TOC +9,80)												
	30. Balok B11 (30 x 90)												
	Bekisting	m2	420,84	0,251	100,000	-	100,000	420,840	-	420,840	0,251	-	0,251
	Besi Beton Polos	kg	4.785,03	0,254	100,000	-	100,000	4.785,030	-	4.785,030	0,254	-	0,254
	Besi Beton Ulir	kg	10.776,37	0,573	100,000	-	100,000	10.776,370	-	10.776,370	0,573	-	0,573
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	60,12	0,269	100,000	-	100,000	60,120	-	60,120	0,269	-	0,269
	31. Balok B12 (45 x 90)												
	Bekisting	m2	41,00	0,024	100,000	-	100,000	41,000	-	41,000	0,024	-	0,024
	Besi Beton Polos	kg	471,58	0,025	100,000	-	100,000	471,580	-	471,580	0,025	-	0,025
	Besi Beton Ulir	kg	1.241,84	0,066	100,000	-	100,000	1.241,840	-	1.241,840	0,066	-	0,066
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	8,26	0,037	100,000	-	100,000	8,260	-	8,260	0,037	-	0,037
	32. Balok B13 (25 x 75)												
	Bekisting	m2	20,10	0,012	100,000	-	100,000	20,100	-	20,100	0,012	-	0,012
	Besi Beton Polos	kg	230,11	0,012	100,000	-	100,000	230,110	-	230,110	0,012	-	0,012
	Besi Beton Ulir	kg	565,20	0,030	100,000	-	100,000	565,200	-	565,200	0,030	-	0,030
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	3,26	0,015	100,000	-	100,000	3,260	-	3,260	0,015	-	0,015
	33. Balok B14 (20 x 40)												
	Bekisting	m2	203,83	0,121	100,000	-	100,000	203,830	-	203,830	0,121	-	0,121
	Besi Beton Polos	kg	1.292,29	0,069	100,000	-	100,000	1.292,290	-	1.292,290	0,069	-	0,069
	Besi Beton Ulir	kg	2.929,75	0,156	100,000	-	100,000	2.929,750	-	2.929,750	0,156	-	0,156

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					RENCANA PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	21,30	0,095	100,000	-	100,000	21,300	-	21,300	0,095	-	0,095
	33A. Balok B14 (20 x 40) Area Balok Shaf												
	Bekisting	m2	7,89	0,005	100,000	-	100,000	7,890	-	7,890	0,005	-	0,005
	Besi Beton Polos	Kg	45,69	0,002	100,000	-	100,000	45,690	-	45,690	0,002	-	0,002
	Besi Beton Ulir	Kg	59,94	0,003	100,000	-	100,000	59,940	-	59,940	0,003	-	0,003
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	0,62	0,003	100,000	-	100,000	0,620	-	0,620	0,003	-	0,003
	34. Balok B24 (20 x 40) Area Lift												
	Bekisting	m2	19,50	0,012	100,000	-	100,000	19,500	-	19,500	0,012	-	0,012
	Besi Beton Polos	Kg	97,41	0,005	100,000	-	100,000	97,410	-	97,410	0,005	-	0,005
	Besi Beton Ulir	Kg	184,65	0,010	100,000	-	100,000	184,650	-	184,650	0,010	-	0,010
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	1,56	0,007	100,000	-	100,000	1,560	-	1,560	0,007	-	0,007
	35. Pek. Plat Lantai Beton Konvensional												
	Bekisting	m2	70,95	0,069	100,000	-	100,000	70,950	-	70,950	0,069	-	0,069
	Besi Beton Polos	Kg	1.428,80	0,076	100,000	-	100,000	1.428,800	-	1.428,800	0,076	-	0,076
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	8,51	0,038	100,000	-	100,000	8,510	-	8,510	0,038	-	0,038
	35.A. Pek. Plat Lantai Beton Konvensional												
	Bekisting	m2	15,68	0,015	100,000	-	100,000	15,680	-	15,680	0,015	-	0,015
	Besi Beton Polos harusnya sama dgn B.2 = 5,90	Kg	415,69	0,022	100,000	-	100,000	415,690	-	415,690	0,022	-	0,022
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	1,88	0,008	100,000	-	100,000	1,880	-	1,880	0,008	-	0,008
	36. Pek. Plat Lantai Beton Floor Deck												
	Floor Deck 0,75	m2	620,45	0,699	100,000	-	100,000	620,450	-	620,450	0,699	-	0,699
	Wiremesh M 10	Kg	6.649,98	0,302	100,000	-	100,000	6.649,980	-	6.649,980	0,302	-	0,302
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	74,45	0,333	100,000	-	100,000	74,450	-	74,450	0,333	-	0,333
	37. Pek. Tangga												
	Bekisting	m2	71,11	0,054	100,000	-	100,000	71,110	-	71,110	0,054	-	0,054
	Besi Beton Polos	Kg	988,20	0,053	100,000	-	100,000	988,200	-	988,200	0,053	-	0,053
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	7,69	0,034	100,000	-	100,000	7,690	-	7,690	0,034	-	0,034
	38. Meja Beton												
	Bekisting	m2	4,08	0,002	100,000	-	100,000	4,080	-	4,080	0,002	-	0,002
	Besi Beton Polos	Kg	33,54	0,002	100,000	-	100,000	33,540	-	33,540	0,002	-	0,002
	Beton K225	m3	0,41	0,002	100,000	-	100,000	0,410	-	0,410	0,002	-	0,002
	39. Pek.Kolom Praktis	m1	323,00	0,144	100,000	-	100,000	323,000	-	323,000	0,144	-	0,144
	40. Balok Latei 1 (15 x 30)												
	Bekisting	m2	31,50	0,019	100,000	-	100,000	31,500	-	31,500	0,019	-	0,019
	Besi Beton Polos	Kg	233,11	0,012	100,000	-	100,000	233,110	-	233,110	0,012	-	0,012
	Beton K225	m3	1,89	0,008	100,000	-	100,000	1,890	-	1,890	0,008	-	0,008
	41. Balok Latei 2 Praktis	m1	69,90	0,030	100,000	-	100,000	69,900	-	69,900	0,030	-	0,030
	42. Kolom K1 (90 x 90)												
	Bekisting	m2	63,36	0,038	100,000	-	100,000	63,360	-	63,360	0,038	-	0,038
	Besi Beton Ulir	Kg	3.642,15	0,194	100,000	-	100,000	3.642,150	-	3.642,150	0,194	-	0,194
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	15,36	0,069	100,000	-	100,000	15,360	-	15,360	0,069	-	0,069
	43. Kolom K2 (80 x 80)												
	Bekisting	m2	506,88	0,303	100,000	-	100,000	506,879	-	506,879	0,303	-	0,303
	Besi Beton Ulir	Kg	23.318,38	1,239	100,000	-	100,000	23.318,380	-	23.318,380	1,239	-	1,239
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	112,64	0,503	100,000	-	100,000	112,640	-	112,640	0,503	-	0,503
	44. Kolom K4 (40 x 40)												
	Bekisting	m2	23,04	0,014	100,000	-	100,000	23,040	-	23,040	0,014	-	0,014
	Besi Beton Polos	Kg	105,79	0,006	100,000	-	100,000	105,790	-	105,790	0,006	-	0,006
	Besi Beton Ulir	Kg	351,51	0,019	100,000	-	100,000	351,510	-	351,510	0,019	-	0,019
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	5,18	0,023	100,000	-	100,000	5,180	-	5,180	0,023	-	0,023
	LANTAI 4 (TOC +13,90)												
	45. Balok B11 (30 x 60)												
	Bekisting	m2	420,84	0,251	100,000	-	100,000	420,840	-	420,840	0,251	-	0,251
	Besi Beton Polos	Kg	4.785,03	0,254	100,000	-	100,000	4.785,030	-	4.785,030	0,254	-	0,254
	Besi Beton Ulir	Kg	10.836,13	0,576	100,000	-	100,000	10.836,130	-	10.836,130	0,576	-	0,576
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	60,12	0,269	100,000	-	100,000	60,120	-	60,120	0,269	-	0,269
	46. Balok B12 (45 x 90)												
	Bekisting	m2	41,00	0,024	100,000	-	100,000	41,000	-	41,000	0,024	-	0,024
	Besi Beton Polos	Kg	471,58	0,025	100,000	-	100,000	471,580	-	471,580	0,025	-	0,025
	Besi Beton Ulir	Kg	1.254,43	0,067	100,000	-	100,000	1.254,430	-	1.254,430	0,067	-	0,067
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	8,26	0,037	100,000	-	100,000	8,260	-	8,260	0,037	-	0,037
	47. Balok B13 (35 x 70)												
	Bekisting	m2	20,10	0,012	100,000	-	100,000	20,100	-	20,100	0,012	-	0,012
	Besi Beton Polos	Kg	230,11	0,012	100,000	-	100,000	230,110	-	230,110	0,012	-	0,012
	Besi Beton Ulir	Kg	569,95	0,030	100,000	-	100,000	569,950	-	569,950	0,030	-	0,030
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	3,26	0,015	100,000	-	100,000	3,260	-	3,260	0,015	-	0,015
	48. Balok B24 (20 x 40)												
	Bekisting	m2	203,83	0,121	100,000	-	100,000	203,830	-	203,830	0,121	-	0,121
	Besi Beton Polos	Kg	1.292,29	0,069	100,000	-	100,000	1.292,290	-	1.292,290	0,069	-	0,069
	Besi Beton Ulir	Kg	2.929,75	0,156	100,000	-	100,000	2.929,750	-	2.929,750	0,156	-	0,156
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	21,30	0,095	100,000	-	100,000	21,300	-	21,300	0,095	-	0,095
	48.A. Balok B14 (20 x 40) Area Balok Shaf												
	Bekisting	m2	7,89	0,005	100,000	-	100,000	7,890	-	7,890	0,005	-	0,005
	Besi Beton Polos	Kg	45,69	0,002	100,000	-	100,000	45,690	-	45,690	0,002	-	0,002
	Besi Beton Ulir	Kg	59,94	0,003	100,000	-	100,000	59,940	-	59,940	0,003	-	0,003
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	0,62	0,003	100,000	-	100,000	0,620	-	0,620	0,003	-	0,003
	49.Balok B14 (20 x 40) Area Lift												
	Bekisting	m2	19,50	0,012	100,000	-	100,000	19,500	-	19,500	0,012	-	0,012
	Besi Beton Polos	Kg	97,41	0,005	100,000	-	100,000	97,410	-	97,410	0,005	-	0,005
	Besi Beton Ulir	Kg	184,65	0,010	100,000	-	100,000	184,650	-	184,650	0,010	-	0,010
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	1,56	0,007	100,000	-	100,000	1,560	-	1,560	0,007	-	0,007
	50. Pek. Plat Lantai Beton Konvensional												
	Bekisting	m2	70,95	0,069	100,000	-	100,000	70,950	-	70,950	0,069	-	0,069
	Besi Beton Polos	Kg	1.428,80	0,141	100,000	-	100,000	1.428,800	-	1.428,800	0,141	-	0,141
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	8,51	0,038	100,000	-	100,000	8,510	-	8,510	0,038	-	0,038
	50.A. Pek. Plat Lantai Beton Konvensional												
	Bekisting	m2	8,25	0,008	100,000	-	100,000	8,250	-	8,250	0,008	-	0,008
	Besi Beton Polos harusnya sama dgn B.2 = 5,90	Kg	113,94	0,006	100,000	-	100,000	113,940	-	113,940	0,006	-	0,006
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	0,99	0,004	100,000	-	100,000	0,990	-	0,990	0,004	-	0,004
	51. Floor Deck 0,75												
	Floor Deck 0,75	m2	631,65	0,712	100,000	-	100,000	631,650	-	631,650	0,712	-	0,712
	Wiremesh M 10	Kg	6.649,98	0,302	100,000	-	100,000	6.649,980	-	6.649,980	0,302	-	0,302
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	75,80	0,339	100,000	-	100,000	75,800	-	75,800	0,339	-	0,339
	52. Pek. Tangga												
	Bekisting	m2	22,87	0,022	100,000	-	100,000	22,870	-	22,870	0,022	-	0,022
	Besi Beton Polos	Kg	497,91	0,026	100,000	-	100,000	497,910	-	497,910	0,026	-	0,026
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	2,47	0,011	100,000	-	100,000	2,470	-	2,470	0,011	-	0,011
	53. Meja Beton												
	Bekisting	m2	4,08	0,004	100,000	-	100,000	4,080	-	4,080	0,004	-	0,004
	Besi Beton Polos	Kg	33,54	0,002	100,000	-	100,000	33,540	-	33,540	0,002	-	0,002
	Beton K225	m3	0,41	0,002	100,000	-	100,000	0,410	-	0,410	0,002	-	0,002
	54. Pek.Kolom Praktis	m1	323,00	0,144	100,000	-	100,000	323,000	-	323,000	0,144	-	0,144
	55. Balok Latei 1												
	Bekisting	m2	34,65	0,021	100,000	-	100,000	34,650	-	34,650	0,021	-	0,021
	Besi Beton Polos	Kg	248,02	0,013	100,000	-	100,000	248,020	-	248,020	0,013	-	0,013
	Beton K225	m3	2,08	0,009	100,000	-	100,000	2,080	-	2,080	0,009	-	0,009
	56. Balok Latei 2 Praktis	m1	69,90	0,030	100,000	-	100,000	69,900	-	69,900	0,030	-	0,030
	57. Kolom K1 (90 x 90)												
	Bekisting	m2	81,28	0,049	100,000	-	100,000	81,280	-	81,280	0,049	-	0,049
	Besi Beton Ulir	Kg	3.620,02	0,192	100,000	-	100,000	3.620,020	-	3.620,020	0,192	-	0,192
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	16,26	0,072	100,000	-	100,000	16,260	-	16,260	0,073	-	0,073
	58. Kolom K2 (80 x 80)												
	Bekisting	m2	522,88	0,313	100,000	-	100,000	522,880	-	522,880	0,313	-	0,313
	Besi Beton Ulir	Kg	25.093,71	1,334	100,000	-	100,000	25.093,710	-	25.093,710	1,334	-	1,334
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	115,84	0,517	100,000	-	100,000	115,840	-	115,840	0,517	-	0,517
	59. Kolom K4 (40 x 40)												
	Bekisting	m2	23,04	0,014	100,000	-	100,000	23,040	-	23,040	0,014	-	0,014
	Besi Beton Polos	Kg	105,79	0,006	100,000	-	100,000	105,790	-	105,790	0,006	-	0,006
	Besi Beton Ulir	Kg	351,51	0,019	100,000	-	100,000	351,510	-	351,510	0,019	-	0,019
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	5,18	0,023	100,000	-	100,000	5,180	-	5,180	0,023	-	0,023

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					BOBOT RENCANA %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	LANTAI 3 (TOC +17,00)												
	66. Balok B11 (30 x 60)												
	Bekisting	m2	452,59	0,270	100,000	-	100,000	452,590	-	452,590	0,270	-	0,270
	Besi Beton Polos	Kg	5.109,95	0,272	100,000	-	100,000	5.109,950	-	5.109,950	0,272	-	0,272
	Besi Beton Ulir	Kg	11.585,10	0,816	100,000	-	100,000	11.585,100	-	11.585,100	0,816	-	0,816
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	64,66	0,289	100,000	-	100,000	64,660	-	64,660	0,289	-	0,289
	67. Balok B12 (45 x 90)												
	Bekisting	m2	41,00	0,024	100,000	-	100,000	41,000	-	41,000	0,024	-	0,024
	Besi Beton Polos	Kg	471,58	0,025	100,000	-	100,000	471,580	-	471,580	0,025	-	0,025
	Besi Beton Ulir	Kg	1.254,43	0,067	100,000	-	100,000	1.254,430	-	1.254,430	0,067	-	0,067
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	8,26	0,037	100,000	-	100,000	8,260	-	8,260	0,037	-	0,037
	63. Balok B13 (30 x 70)												
	Bekisting	m2	20,10	0,012	100,000	-	100,000	20,100	-	20,100	0,012	-	0,012
	Besi Beton Polos	Kg	230,11	0,012	100,000	-	100,000	230,110	-	230,110	0,012	-	0,012
	Besi Beton Ulir	Kg	569,95	0,030	100,000	-	100,000	569,950	-	569,950	0,030	-	0,030
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	3,26	0,015	100,000	-	100,000	3,260	-	3,260	0,015	-	0,015
	63. Balok B24 (30 x 60)												
	Bekisting	m2	197,68	0,118	100,000	-	100,000	197,680	-	197,680	0,118	-	0,118
	Besi Beton Polos	Kg	1.267,52	0,067	100,000	-	100,000	1.267,520	-	1.267,520	0,067	-	0,067
	Besi Beton Ulir	Kg	2.871,51	0,153	100,000	-	100,000	2.871,510	-	2.871,510	0,153	-	0,153
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	20,81	0,093	100,000	-	100,000	20,810	-	20,810	0,093	-	0,093
	68.A. Balok B14 (30 x 40) Area Balok Shaf												
	Bekisting	m2	7,99	0,005	100,000	-	100,000	7,990	-	7,990	0,005	-	0,005
	Besi Beton Polos	Kg	45,69	0,002	100,000	-	100,000	45,690	-	45,690	0,002	-	0,002
	Besi Beton Ulir	Kg	59,94	0,003	100,000	-	100,000	59,940	-	59,940	0,003	-	0,003
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	0,62	0,003	100,000	-	100,000	0,620	-	0,620	0,003	-	0,003
	68.B. Plat Konvensional & Bebakan Plat Beton (Area shaf)												
	Bekisting	m2	1,25	0,001	100,000	-	100,000	1,250	-	1,250	0,001	-	0,001
	Besi Beton Polos	Kg	40,07	0,002	100,000	-	100,000	40,070	-	40,070	0,002	-	0,002
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	0,15	0,001	100,000	-	100,000	0,150	-	0,150	0,001	-	0,001
	Bebakan Beton Plat	m2	1,25	0,001	100,000	-	100,000	1,250	-	1,250	0,001	-	0,001
	64. Balok B16 (20 x 40), Area Lift												
	Bekisting	m2	19,50	0,012	100,000	-	100,000	19,500	-	19,500	0,012	-	0,012
	Besi Beton Polos	Kg	97,41	0,005	100,000	-	100,000	97,410	-	97,410	0,005	-	0,005
	Besi Beton Ulir	Kg	184,65	0,010	100,000	-	100,000	184,650	-	184,650	0,010	-	0,010
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	1,56	0,007	100,000	-	100,000	1,560	-	1,560	0,007	-	0,007
	65. Pek. Plat Lantai Beton Konvensional Area WC												
	Bekisting	m2	70,95	0,069	100,000	-	100,000	70,950	-	70,950	0,069	-	0,069
	Besi Beton Polos	Kg	1.428,80	0,076	100,000	-	100,000	1.428,800	-	1.428,800	0,076	-	0,076
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	8,51	0,038	100,000	-	100,000	8,510	-	8,510	0,038	-	0,038
	66. Pek. Plat Lantai Beton Konvensional Area Laboratory												
	Bekisting	m2	268,79	0,261	100,000	-	100,000	268,790	-	268,790	0,261	-	0,261
	Besi Beton Ulir	Kg	9.025,64	0,480	100,000	-	100,000	9.025,640	-	9.025,640	0,480	-	0,480
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	32,37	0,145	100,000	-	100,000	32,370	-	32,370	0,145	-	0,145
	67. Pek. Plat Lantai Beton Floor Deck												
	Floor Deck 0,75	m2	393,50	0,444	100,000	-	100,000	393,500	-	393,500	0,444	-	0,444
	Wiremesh M 10	Kg	4.560,46	0,207	100,000	-	100,000	4.560,460	-	4.560,460	0,207	-	0,207
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	47,22	0,211	100,000	-	100,000	47,220	-	47,220	0,211	-	0,211
	68.Kolom K2 (50 x 90)												
	Bekisting	m2	604,80	0,362	100,000	-	100,000	604,800	-	604,800	0,362	-	0,362
	Besi Beton Ulir	Kg	24.877,39	1,329	100,000	-	100,000	24.877,390	-	24.877,390	1,329	-	1,329
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	120,96	0,540	100,000	-	100,000	120,960	-	120,960	0,540	-	0,540
	69. Kolom K4 (40 x 40)												
	Bekisting	m2	23,04	0,014	100,000	-	100,000	23,040	-	23,040	0,014	-	0,014
	Besi Beton Polos	Kg	105,79	0,006	100,000	-	100,000	105,790	-	105,790	0,006	-	0,006
	Besi Beton Ulir	Kg	351,51	0,019	100,000	-	100,000	351,510	-	351,510	0,019	-	0,019
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	5,18	0,023	100,000	-	100,000	5,180	-	5,180	0,023	-	0,023
	70. Pek. Tangga												
	Bekisting	m2	22,87	0,014	100,000	-	100,000	22,870	-	22,870	0,014	-	0,014
	Besi Beton Polos	Kg	497,91	0,026	100,000	-	100,000	497,910	-	497,910	0,026	-	0,026
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	2,47	0,011	100,000	-	100,000	2,470	-	2,470	0,011	-	0,011
	71. Plesteran												
	Bekisting	m2	4,08	0,004	100,000	-	100,000	4,080	-	4,080	0,004	-	0,004
	Besi Beton Polos	Kg	33,54	0,002	100,000	-	100,000	33,540	-	33,540	0,002	-	0,002
	Beton K225	m3	0,41	0,002	100,000	-	100,000	0,410	-	0,410	0,002	-	0,002
	72. Pek.Kolom Praktis	m1	275,40	0,122	100,000	-	100,000	275,400	-	275,400	0,122	-	0,122
	73. Balok Latei 1 (15 x 30)												
	Bekisting	m2	9,45	0,006	100,000	-	100,000	9,450	-	9,450	0,006	-	0,006
	Besi Beton Polos	Kg	69,93	0,004	100,000	-	100,000	69,930	-	69,930	0,004	-	0,004
	Beton K225	m3	0,57	0,002	100,000	-	100,000	0,570	-	0,570	0,002	-	0,002
	74. Balok Latei 2 Praktis	m1	54,30	0,024	100,000	-	100,000	54,300	-	54,300	0,024	-	0,024
	Top Floor (TOC +21,00)												
	75. Balok B11 (30 x 60)												
	Bekisting	m2	332,11	0,198	100,000	-	100,000	332,110	-	332,110	0,198	-	0,198
	Besi Beton Polos	Kg	3.968,29	0,211	100,000	-	100,000	3.968,290	-	3.968,290	0,211	-	0,211
	Besi Beton Ulir	Kg	8.226,80	0,437	100,000	-	100,000	8.226,800	-	8.226,800	0,437	-	0,437
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	45,22	0,202	100,000	-	100,000	45,220	-	45,220	0,202	-	0,202
	76. Balok B14 (20 x 40)												
	Bekisting	m2	66,96	0,040	100,000	-	100,000	66,960	-	66,960	0,040	-	0,040
	Besi Beton Polos	Kg	428,47	0,023	100,000	-	100,000	428,470	-	428,470	0,023	-	0,023
	Besi Beton Ulir	Kg	1.450,36	0,077	100,000	-	100,000	1.450,360	-	1.450,360	0,077	-	0,077
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	7,05	0,031	100,000	-	100,000	7,050	-	7,050	0,031	-	0,031
	77. Pek. Plat Lantai Beton Konvensional												
	Bekisting	m2	316,66	0,189	100,000	-	100,000	316,660	-	316,660	0,189	-	0,189
	Besi Beton Ulir	Kg	9.079,43	0,483	100,000	-	100,000	9.079,430	-	9.079,430	0,483	-	0,483
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	38,00	0,170	100,000	-	100,000	38,000	-	38,000	0,170	-	0,170
	78. Kolom K2 (50 x 90)												
	Bekisting	m2	57,60	0,034	100,000	-	100,000	57,600	-	57,600	0,034	-	0,034
	Besi Beton Ulir	Kg	2.249,94	0,120	100,000	-	100,000	2.249,940	-	2.249,940	0,120	-	0,120
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	11,26	0,050	100,000	-	100,000	11,260	-	11,260	0,050	-	0,050
	79. Kolom K4 (40 x 40)												
	Bekisting	m2	19,20	0,011	100,000	-	100,000	19,200	-	19,200	0,011	-	0,011
	Besi Beton Polos	Kg	76,94	0,004	100,000	-	100,000	76,940	-	76,940	0,004	-	0,004
	Besi Beton Ulir	Kg	227,27	0,012	100,000	-	100,000	227,270	-	227,270	0,012	-	0,012
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	1,92	0,009	100,000	-	100,000	1,920	-	1,920	0,009	-	0,009
	80. Kolom K5 (60 x 60)												
	Bekisting	m2	172,80	0,103	100,000	-	100,000	172,800	-	172,800	0,103	-	0,103
	Besi Beton Polos	Kg	943,25	0,050	100,000	-	100,000	943,250	-	943,250	0,050	-	0,050
	Besi Beton Ulir	Kg	1.872,80	0,105	100,000	-	100,000	1.872,800	-	1.872,800	0,105	-	0,105
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	22,75	0,102	100,000	-	100,000	22,750	-	22,750	0,102	-	0,102
	81. Pek.Kolom Praktis	m1	90,00	0,040	100,000	-	100,000	90,000	-	90,000	0,040	-	0,040
	82. Balok B11 (30 x 60) Lift												
	Bekisting	m2	66,02	0,041	100,000	-	100,000	66,020	-	66,020	0,041	-	0,041
	Besi Beton Polos	Kg	589,47	0,031	100,000	-	100,000	589,470	-	589,470	0,031	-	0,031
	Besi Beton Ulir	Kg	929,17	0,049	100,000	-	100,000	929,170	-	929,170	0,049	-	0,049
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	7,49	0,033	100,000	-	100,000	7,490	-	7,490	0,033	-	0,033
	83. Balok B14 (20 x 40)												
	Bekisting	m2	123,46	0,074	100,000	-	100,000	123,460	-	123,460	0,074	-	0,074
	Besi Beton Polos	Kg	624,51	0,033	100,000	-	100,000	624,510	-	624,510	0,033	-	0,033
	Besi Beton Ulir	Kg	1.199,78	0,064	100,000	-	100,000	1.199,780	-	1.199,780	0,064	-	0,064
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	10,14	0,045	100,000	-	100,000	10,140	-	10,140	0,045	-	0,045
	84. Plat Lift												
	Bekisting	m2	44,86	0,028	100,000	-	100,000	44,860	-	44,860	0,028	-	0,028
	Besi Beton Polos	Kg	1.172,58	0,062	100,000	-	100,000	1.172,580	-	1.172,580	0,062	-	0,062
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	5,62	0,025	100,000	-	100,000	5,620	-	5,620	0,025	-	0,025
	85. Dudukan Outdoor AC												
	Bekisting	m2	2,80	0,002	100,000	-	100,000	2,800	-	2,800	0,002	-	0,002
	Besi Beton Polos	Kg	368,05	0,020	100,000	-	100,000	368,050	-	368,050	0,020	-	0,020
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	5,40	0,024	100,000	-	100,000	5,400	-	5,400	0,024	-	0,024

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					REALISASI PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	Div. Dudukan Tangki Air												
	Pekerjaan	m2	2,80	0,002	100,000	-	100,000	2,800	-	2,800	0,002	-	0,002
	Pas. Beton Pelat	kg	194,81	0,010	100,000	-	100,000	194,810	-	194,810	0,010	-	0,010
	Beton K300 (Ready Mix)	m3	2,88	0,013	100,000	-	100,000	2,880	-	2,880	0,013	-	0,013
	B. GEDUNG LABORATORIUM TERPADU												
	1. PEKERJAAN ATAP												
1	Pek. Rangka Atap C 75.150 (Slm Bubungan)	m2	530,45	0,368	100,000	-	100,000	530,450	-	530,450	0,368	-	0,368
2	Pek. Atap Undeline	m2	530,45	0,331	100,000	-	100,000	530,450	-	530,450	0,331	-	0,331
3	Pek. Lisplank	m1	61,60	0,022	100,000	-	100,000	61,600	-	61,600	0,022	-	0,022
4	Pek. Talang	m1	49,30	0,026	100,000	-	100,000	49,300	-	49,300	0,026	-	0,026
5	Pek. Flashing	m1	76,45	0,041	100,000	-	100,000	76,450	-	76,450	0,041	-	0,041
6	Pek. Waterproofing Atap	m2	384,42	0,134	100,000	-	100,000	384,420	-	384,420	0,134	-	0,134
7	Pek. Plesteran Lantai (1:3)	m2	384,42	0,096	100,000	-	100,000	384,420	-	384,420	0,096	-	0,096
8	Pek. Acian	m2	384,42	0,057	100,000	-	100,000	384,420	-	384,420	0,057	-	0,057
9	Pek. Cat Anti Bocor (No Drop)	m2	384,42	0,093	100,000	-	100,000	384,420	-	384,420	0,093	-	0,093
	GEDUNG LABORATORIUM TERPADU												
	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
	LANTAI 1												
1	**Pekerjaan Dinding**												
	Pas. Dinding 1/2 Bata (1 : 5) Area 1/F, Pot depan, Pot hall Ruang	m2	110,110	0,069	100,000	-	100,000	110,110	-	110,110	0,069	-	0,069
	Pek. Plesteran Dinding (1 : 3)	m2	184,170	0,044	100,000	-	100,000	184,170	-	184,170	0,044	-	0,044
	Pek. Acian Dinding dan Beton	m2	430,570	0,059	100,000	-	100,000	430,570	-	430,570	0,059	-	0,059
	Pas. Bata Ringan Tebal 10 Mortar Siap Pakai	m2	857,770	0,400	100,000	-	100,000	857,770	-	857,770	0,400	-	0,400
	Pek. Plesteran Mortar Siap Pakai	m2	1.229,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pek. Acian Bata Ringan	m2	1.167,94	0,186	100,000	-	100,000	1.167,940	-	1.167,940	0,186	-	0,186
2	**Pek.Pintu dan Jendela**												
	Pek. Pintu Kaca Tempered (PT1)												
	Pas. Kaca Tempered 12 mm	m2	16,80	0,031	100,000	-	100,000	16,800	-	16,800	0,031	-	0,031
	Pas. Engsel Tanam	psg	4,00	0,012	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,012	-	0,012
	Pas. Kunci Tanam	bh	4,00	0,007	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,007	-	0,007
	Pas. Handle Pintu	Psg	4,00	0,008	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,008	-	0,008
3	**Pek. Pintu Kaca Tempered (PT2)**				-	-	-						
	Pas. Kaca Tempered 12 mm	m2	9,60	0,017	100,000	-	100,000	9,600	-	9,600	0,017	-	0,017
	Pas. Engsel Tanam	psg	2,00	0,006	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,006	-	0,006
	Pas. Kunci Tanam	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Pas. Handle Pintu	Psg	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
4	**Pek. Pintu Kaca Tempered (PT3)**												
	Pas. Kaca Tempered 12 mm	m2	6,16	0,011	100,000	-	100,000	6,160	-	6,160	0,011	-	0,011
	Pas. Engsel Tanam	psg	2,00	0,006	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,006	-	0,006
	Pas. Kunci Tanam	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Pas. Handle Pintu	Psg	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
5	Pek. Pintu P1 Partress/Type 150.11 Double Door (Lengkap ACC)	bh	2,00	0,039	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,039	-	0,039
6	Pek. Pintu P2 Partress/Type 120.11 Mother & Door (Lengkap ACC)	bh	2,00	0,020	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,020	-	0,020
7	**Pek. Pintu P3**				-	-	-						
	Pek. Kusen Pintu 4 (Alexandria)	m1	9,60	0,005	100,000	-	100,000	9,600	-	9,600	0,005	-	0,005
	Pas. Daun Pintu Kaca (Alexandria)	m2	2,73	0,002	100,000	-	100,000	2,730	-	2,730	0,002	-	0,002
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	2,73	0,002	100,000	-	100,000	2,730	-	2,730	0,002	-	0,002
	Pas. Kunci Pintu	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Pas Engsel Pintu	bh	4,00	0,000	10,000	-	10,000	0,400	-	0,400	0,000	-	0,000
8	**Pek. Pintu P4 Partress/Type 90.11 Single Door (Lengkap ACC)**				-	-	-						
9	**Pek. Pintu P5**				-	-	-						
	Pek. Pintu P4 Partress/Type 90.11 Single Door (Lengkap ACC)	bh	7,00	0,049	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,049	-	0,049
	Pek. Kusen Pintu 4 (Alexandria)	m1	51,70	0,025	100,000	-	100,000	51,700	-	51,700	0,025	-	0,025
	Pek. Daun Pintu Kaca (Alexandria)	m2	15,015	0,011	100,000	-	100,000	15,015	-	15,015	0,011	-	0,011
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	12,54	0,009	100,000	-	100,000	12,540	-	12,540	0,009	-	0,009
	Pas. Stiker Kaca Standaset	m2	12,54	0,003	100,000	-	100,000	12,540	-	12,540	0,003	-	0,003
	Pas. Kunci Pintu	bh	11,00	0,019	100,000	-	100,000	11,000	-	11,000	0,019	-	0,019
	Pas Engsel Pintu	bh	22,00	0,003	100,000	-	100,000	22,000	-	22,000	0,003	-	0,003
10	**Pek. Pintu P6 Pintu Besi Plat Rangka Besi Slim Minimo Cat (Lengkap ACC)**				-	-	-						
11	Pek. Pintu P6 Pintu Besi Plat Rangka Besi Slim Minimo Cat (Lengkap ACC)	m2	2,40	0,004	100,000	-	100,000	2,400	-	2,400	0,004	-	0,004
12	Pek. Jendela Kaca Tempered 12 mm (J1)	m2	43,20	0,079	100,000	-	100,000	43,200	-	43,200	0,079	-	0,079
13	**Pek. Jendela Kaca (J2&J)**				-	-	-						
	Pek. Jendela Kaca Tempered 12 mm (J2)	m2	33,60	0,061	100,000	-	100,000	33,600	-	33,600	0,061	-	0,061
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alexandria)	m1	294,40	0,141	100,000	-	100,000	294,400	-	294,400	0,141	-	0,141
	Pek. Daun Jendela (Alexandria)	m2	57,60	0,043	100,000	-	100,000	57,600	-	57,600	0,043	-	0,043
	Pas. Kaca Parasheap 5 mm	m2	112,96	0,185	100,000	-	100,000	112,960	-	112,960	0,185	-	0,185
	Pas. Aksesoris Jendela Gesar	ls	32,00	0,007	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,007	-	0,007
	Pas. Grendel Jendela	bh	32,00	0,003	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,003	-	0,003
14	**Pek. Jendela Kaca (J5)**				-	-	-						
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alexandria)	m1	162,00	0,078	100,000	-	100,000	162,000	-	162,000	0,078	-	0,078
	Pek. Daun Jendela (Alexandria)	m2	11,40	0,009	100,000	-	100,000	11,400	-	11,400	0,009	-	0,009
	Pas. Kaca Parasheap 5 mm	m2	51,90	0,085	100,000	-	100,000	51,900	-	51,900	0,085	-	0,085
	Pas. Engsel Jendela	Psg	24,00	0,003	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,003	-	0,003
	Pas. Grendel Jendela	bh	24,00	0,002	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,002	-	0,002
	Pas. Kait Angin	psg	24,00	0,002	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,002	-	0,002
15	**Pek. Jendela Kaca (J6)**				-	-	-						
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alexandria)	m1	9,60	0,005	100,000	-	100,000	9,600	-	9,600	0,005	-	0,005
	Pek. Daun Jendela (Alexandria)	m2	1,68	0,001	100,000	-	100,000	1,680	-	1,680	0,001	-	0,001
	Pas. Kaca Parasheap 5 mm	m2	2,04	0,003	100,000	-	100,000	2,040	-	2,040	0,003	-	0,003
	Pas. Aksesoris Jendela Gesar	ls	2,00	0,000	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,000	-	0,000
	Pas. Grendel Jendela	bh	2,00	0,000	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,000	-	0,000
16	**Pek. Jendela Kaca (V1)**				-	-	-						
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alexandria)	m1	25,20	0,012	100,000	-	100,000	25,200	-	25,200	0,012	-	0,012
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	2,88	0,002	100,000	-	100,000	2,880	-	2,880	0,002	-	0,002
17	**Pek. Jendela Kaca (V2)**				-	-	-						
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alexandria)	m1	2,20	0,001	100,000	-	100,000	2,200	-	2,200	0,001	-	0,001
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	0,30	0,000	100,000	-	100,000	0,300	-	0,300	0,000	-	0,000
18	**Pek. Jendela Kaca (V3)**				-	-	-						
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alexandria)	m1	8,00	0,004	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,004	-	0,004
	Pas. Jalusi Aluminium	m2	1,00	0,003	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,003	-	0,003
19	**Pekerjaan Partisi Kaca (PK1)**				-	-	-						
	Pek. Kusen 4 (Alexandria)	m2	47,80	0,023	100,000	-	100,000	47,800	-	47,800	0,023	-	0,023
	Pas. Daun Pintu Kaca	m2	2,30	0,002	100,000	-	100,000	2,300	-	2,300	0,002	-	0,002
	Pas. Kaca Bening 6 mm	m2	38,140	0,013	100,000	-	100,000	38,140	-	38,140	0,013	-	0,013
	Pas. Stiker Kaca Standaset	m2	5,27	0,001	100,000	-	100,000	5,270	-	5,270	0,001	-	0,001
	Pas. Kunci Pintu	bh	1,00	0,002	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,002	-	0,002
	Pas Engsel Pintu	bh	2,00	0,000	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,000	-	0,000
20	**Pekerjaan Partisi Kaca (PK2)**				-	-	-						
	Pek. Kusen 4 (Alexandria)	m1	31,80	0,015	100,000	-	100,000	31,800	-	31,800	0,015	-	0,015
	Pas. Kaca Bening 6 mm	m2	11,20	0,008	100,000	-	100,000	11,200	-	11,200	0,008	-	0,008
	Pas. Stiker Kaca Standaset	m2	3,60	0,001	100,000	-	100,000	3,600	-	3,600	0,001	-	0,001
21	**Pekerjaan Partisi Kaca (PK3)**				-	-	-						
	Pek. Kusen 4 (Alexandria)	m1	17,00	0,008	100,000	-	100,000	17,000	-	17,000	0,008	-	0,008
	Pas. Kaca Bening 6 mm	m2	5,60	0,004	100,000	-	100,000	5,600	-	5,600	0,004	-	0,004
	Pas. Stiker Kaca Standaset	m2	1,80	0,000	100,000	-	100,000	1,800	-	1,800	0,000	-	0,000
22	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**				-	-	-						
	Urugan Tanah Kembali	m3	623,52	0,178	100,000	-	100,000	623,520	-	623,520	0,178	-	0,178
	Pemadatan Tanah Menggunakan Stamper Kaki	m3	623,52	0,116	100,000	-	100,000	623,520	-	623,520	0,116	-	0,116
	Pek. Timbunan Pasir T = 5 cm	m3	58,73	0,038	100,000	-	100,000	58,730	-	58,730	0,038	-	0,038
	Kabel Beton K175 T = 10 cm	m3	91,02	0,325	100,000	-	100,000	91,020	-	91,020	0,325	-	0,325
	Pas. Lantai Granit Polished 60 x 60	m2	841,60	0,630	100,000	-	100,000	841,600	-	841,600	0,630	-	0,630
	Pas. Plinth	m2	7,20	0,013	100,000	-	100,000	7,200	-	7,200	0,013	-	0,013
	Pas. Lantai Granit WC Unpolished 60 x 60	m2	66,93	0,050	100,000	-	100,000	66,930	-	66,930	0,050	-	0,050
	Pas. Lantai Granit Meja Beton Polished 60 x 60	m2	9,83	0,004	100,000	-	100,000	9,830	-	9,830	0,004	-	0,004
	Pas. Lantai Granit Teras dan Ram Unpolished 60 x 60	m2	75,85	0,057	100,000	-	100,000	75,850	-	75,850	0,057	-	0,057
	Pas. Dinding Granit WC Polished 60 x 60 T = 2 cm	m2	251,58	0,187	100,000	-	100,000	251,580	-	251,580	0,187	-	0,187
	Pas. Lantai Granit Tangga Unfinished 60 x 60	m2	68,70	0,051	100,000	-	100,000	68,700	-	68,700	0,051	-	0,051
	Pas. Plint 10 x 60	m1	215,00	0,043	100,000	-	100,000	215,000	-	215,000	0,043	-	0,043
	Pas. Step Nosing Tangga dan Tangga Teras	m1	156,40	0,030	100,000	-	100,000	156,400	-	156,400	0,030	-	0,030

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					RENCANA PENGERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	Pas. Dinding Batu Alam Area Pol	m2	25,00	0,029	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000	0,029	-	0,029
23	**PEKERJAAN RANGKA DAN PLAFOND**												
	Pas. Rangka Plafond Hollow Almunium 40 x 40 (Modul 60 x 60)	m2	990,42	0,494	100,000	-	100,000	990,420	-	990,420	0,494	-	0,494
	Pas. Plafond PVC	m2	931,26	0,342	100,000	-	100,000	931,260	-	931,260	0,342	-	0,342
	Pas. Plafond Metalboard Dinding Kiri dan Tangga	m2	99,16	0,099	100,000	-	100,000	99,160	-	99,160	0,099	-	0,099
	Pas. List PVC	m1	492,72	0,049	100,000	-	100,000	492,720	-	492,720	0,049	-	0,049
24	**PEKERJAAN PENGECETAN**												
	Pek. Cat Dinding Interior Meshtex	m2	1.217,85	0,125	100,000	-	100,000	1.217,850	-	1.217,850	0,125	-	0,125
	Pek. Cat Dinding Exterior Meshtex	m2	390,26	0,045	100,000	-	100,000	390,260	-	390,260	0,045	-	0,045
	LANTAI 3												
25	**PEKERJAAN DINDING**												
	Pas. Dinding 1/2 Bata (1 ?) Area Lift dan Kaki Meja Beton	m2	43,55	0,019	100,000	-	100,000	43,550	-	43,550	0,019	-	0,019
	Pek. Plasteran Dinding (1 ?)	m2	87,10	0,021	100,000	-	100,000	87,100	-	87,100	0,021	-	0,021
	Pek. Acian Dinding dan Beton	m2	461,77	0,063	100,000	-	100,000	461,770	-	461,770	0,063	-	0,063
	Pas. Bata Ringan Tebal 10 Mortar Siap Pakai	m2	738,17	0,353	100,000	-	100,000	738,170	-	738,170	0,353	-	0,353
	Pek. Plasteran Mortar Siap Pakai	m2	801,12	0,362	100,000	-	100,000	801,120	-	801,120	0,362	-	0,362
	Pek. Acian Bata Ringan	m2	3.069,75	0,170	100,000	-	100,000	3.069,750	-	3.069,750	0,170	-	0,170
26	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**												
	Pek. Pintu, Kaca Tempered (PJ3)												
	Pas. Kaca Tempered 12 mm	m2	6,16	0,011	100,000	-	100,000	6,160	-	6,160	0,011	-	0,011
	Pas. Engsel Tanam	psg	2,00	0,006	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,006	-	0,006
	Pas. Kunci Tanam	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Pas. Handle Pintu	Psg	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
27	Pek. Pintu P1 FortressType 150.11 Double Door (Langkap ACC)	bh	1,00	0,078	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,078	-	0,078
28	Pek. Pintu P2 FortressType 120.11 Mother & Door (Langkap ACC)	bh	1,00	0,010	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,010	-	0,010
29	**Pek. Pintu P3**												
	Pek. Kusen Pintu 4 (Alokendo)	m1	9,60	0,005	100,000	-	100,000	9,600	-	9,600	0,005	-	0,005
	Pek. Daun Pintu Kaca (Alokendo)	m2	2,73	0,002	100,000	-	100,000	2,730	-	2,730	0,002	-	0,002
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	2,73	0,002	100,000	-	100,000	2,730	-	2,730	0,002	-	0,002
	Pas. Kunci Pintu	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Pas Engsel Pintu	bh	4,00	0,000	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,000	-	0,000
30	Pek. Pintu P4 FortressType 90.11 Single Door (Langkap ACC)	bh	7,00	0,049	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,049	-	0,049
31	**Pek. Pintu P5**												
	Pek. Kusen Pintu 4 (Alokendo)	m1	51,70	0,025	100,000	-	100,000	51,700	-	51,700	0,025	-	0,025
	Pek. Daun Pintu Kaca (Alokendo)	m2	15,01	0,011	100,000	-	100,000	15,010	-	15,010	0,011	-	0,011
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	12,54	0,009	100,000	-	100,000	12,540	-	12,540	0,009	-	0,009
	Pas. Silver Kaca Stainless	m2	12,54	0,003	100,000	-	100,000	12,540	-	12,540	0,003	-	0,003
	Pas. Kunci Pintu	bh	11,00	0,019	100,000	-	100,000	11,000	-	11,000	0,019	-	0,019
	Pas Engsel Pintu	bh	22,00	0,003	100,000	-	100,000	22,000	-	22,000	0,003	-	0,003
32	Pek. Pintu P6 Pintu Box Plat Rangka Box Situ Finishing Cat (Langk	m2	2,40	0,004	100,000	-	100,000	2,400	-	2,400	0,004	-	0,004
33	**Pek. Jendela Kaca (33)**												
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alokendo)	m1	92,40	0,044	100,000	-	100,000	92,400	-	92,400	0,044	-	0,044
	Pek. Daun Jendela (Alokendo)	m2	16,80	0,013	100,000	-	100,000	16,800	-	16,800	0,013	-	0,013
	Pas. Kaca Patahatap 5 mm	m2	29,56	0,047	100,000	-	100,000	29,560	-	29,560	0,047	-	0,047
	Pas. Aksesoris Jendela Glaser	ls	12,00	0,003	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,003	-	0,003
	Pas. Grendel Jendela	bh	12,00	0,001	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,001	-	0,001
34	**Pek. Jendela Kaca (34)**												
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alokendo)	m1	92,40	0,044	100,000	-	100,000	92,400	-	92,400	0,044	-	0,044
	Pas. Kaca Patahatap 5 mm	m2	29,76	0,049	100,000	-	100,000	29,760	-	29,760	0,049	-	0,049
35	**Pek. Jendela Kaca (36)**												
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alokendo)	m1	201,60	0,097	100,000	-	100,000	201,600	-	201,600	0,097	-	0,097
	Pek. Daun Jendela (Alokendo)	m2	35,28	0,027	100,000	-	100,000	35,280	-	35,280	0,027	-	0,027
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	42,84	0,031	100,000	-	100,000	42,840	-	42,840	0,031	-	0,031
	Pas. Aksesoris Jendela Glaser	ls	42,00	0,009	100,000	-	100,000	42,000	-	42,000	0,009	-	0,009
	Pas. Grendel Jendela	bh	42,00	0,004	100,000	-	100,000	42,000	-	42,000	0,004	-	0,004
36	**Pek. Jendela Kaca (37)**												
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alokendo)	m1	15,40	0,007	100,000	-	100,000	15,400	-	15,400	0,007	-	0,007
	Pas. Kaca Patahatap 5 mm	m2	5,72	0,009	100,000	-	100,000	5,720	-	5,720	0,009	-	0,009
37	**Pek. Jendela Kaca (38)**												
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alokendo)	m1	8,40	0,004	100,000	-	100,000	8,400	-	8,400	0,004	-	0,004
	Pas. Kaca Patahatap 5 mm	m2	1,17	0,002	100,000	-	100,000	1,170	-	1,170	0,002	-	0,002
38	**Pek. Jendela Kaca (V1)**												
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alokendo)	m1	12,60	0,006	100,000	-	100,000	12,600	-	12,600	0,006	-	0,006
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	1,44	0,001	100,000	-	100,000	1,440	-	1,440	0,001	-	0,001
39	**Pek. Jendela Kaca (V2)**												
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alokendo)	m1	2,20	0,001	100,000	-	100,000	2,200	-	2,200	0,001	-	0,001
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	0,30	0,000	100,000	-	100,000	0,300	-	0,300	0,000	-	0,000
40	**Pek. Jendela Kaca (V3)**												
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alokendo)	m1	8,00	0,004	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,004	-	0,004
	Pas. Jaluzi Aluminium	m2	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
41	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**												
	Pas. Lantai Granit dan Polished 60 x 60	m2	738,60	0,350	100,000	-	100,000	738,600	-	738,600	0,350	-	0,350
	Pas. Lantai Granit WC Unpolished 60 x 60	m2	66,51	0,050	100,000	-	100,000	66,510	-	66,510	0,050	-	0,050
	Pas. Lantai Granit Meja Beton Polished 60 x 60	m2	4,83	0,004	100,000	-	100,000	4,830	-	4,830	0,004	-	0,004
	Pas. waterproofing Slop Lantai WC	m2	66,51	0,023	100,000	-	100,000	66,510	-	66,510	0,023	-	0,023
	Pas. Dinding Granit WC Polished 60 x 60 T = 2 m	m2	251,58	0,187	100,000	-	100,000	251,580	-	251,580	0,187	-	0,187
	Pas. Lantai Granit Tangga Unfinished 60 x 60	m2	47,45	0,035	100,000	-	100,000	47,450	-	47,450	0,035	-	0,035
	Pas. Aluv 10 x 60	m1	187,90	0,038	100,000	-	100,000	187,900	-	187,900	0,038	-	0,038
	Pas. Step Nosing Tangga	m1	76,00	0,015	100,000	-	100,000	76,000	-	76,000	0,015	-	0,015
42	**PEKERJAAN RANGKA DAN PLAFOND**												
	Pas. Rangka Plafond Hollow Almunium 40 x 40 (Modul 60 x 60)	m2	805,96	0,402	100,000	-	100,000	805,960	-	805,960	0,402	-	0,402
	Pas. Plafond PVC	m2	805,96	0,296	100,000	-	100,000	805,960	-	805,960	0,296	-	0,296
	Pas. List PVC	m1	550,42	0,055	100,000	-	100,000	550,420	-	550,420	0,055	-	0,055
	PEKERJAAN PENGECETAN												
	Pek. Cat Dinding Interior Meshtex	m2	1.271,82	0,131	100,000	-	100,000	1.271,820	-	1.271,820	0,131	-	0,131
	Pek. Cat Dinding Exterior Meshtex	m2	259,60	0,030	100,000	-	100,000	259,600	-	259,600	0,030	-	0,030
	LANTAI 3												
44	**PEKERJAAN DINDING**												
	Pas. Dinding 1/2 Bata (1 ?) Area Lift dan Kaki Meja Beton	m2	37,11	0,016	100,000	-	100,000	37,110	-	37,110	0,016	-	0,016
	Pek. Plasteran Dinding (1 ?)	m2	74,22	0,018	100,000	-	100,000	74,220	-	74,220	0,018	-	0,018
	Pek. Acian Dinding dan Beton	m2	448,57	0,061	100,000	-	100,000	448,570	-	448,570	0,061	-	0,061
	Pas. Bata Ringan Tebal 10 Mortar Siap Pakai	m2	621,67	0,287	100,000	-	100,000	621,670	-	621,670	0,287	-	0,287
	Pek. Plasteran Mortar Siap Pakai	m2	1.245,26	0,562	100,000	-	100,000	1.245,260	-	1.245,260	0,562	-	0,562
	Pek. Acian Bata Ringan	m2	1.293,53	0,270	100,000	-	100,000	1.293,530	-	1.293,530	0,270	-	0,270
45	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**												
46	Pek. Pintu P1 FortressType 150.11 Double Door (Langkap ACC)	bh	8,00	0,624	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,624	-	0,624
47	Pek. Pintu P2 FortressType 120.11 Mother & Door (Langkap ACC)	bh	1,00	0,010	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,010	-	0,010
48	**Pek. Pintu P3**												
	Pek. Kusen Pintu 4 (Alokendo)	m1	9,60	0,005	100,000	-	100,000	9,600	-	9,600	0,005	-	0,005
	Pek. Daun Pintu Kaca (Alokendo)	m2	2,73	0,002	100,000	-	100,000	2,730	-	2,730	0,002	-	0,002
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	2,73	0,002	100,000	-	100,000	2,730	-	2,730	0,002	-	0,002
	Pas. Kunci Pintu	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Pas Engsel Pintu	bh	4,00	0,000	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,000	-	0,000
49	**Pek. Pintu P4 FortressType 90.11 Single Door (Langkap ACC)**												
50	**Pek. Pintu P5**												
	Pek. Pintu P4 FortressType 90.11 Single Door (Langkap ACC)	bh	7,00	0,049	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,049	-	0,049
	Pek. Pintu P5												
	Pek. Kusen Pintu 4 (Alokendo)	m1	51,70	0,025	100,000	-	100,000	51,700	-	51,700	0,025	-	0,025
	Pek. Daun Pintu Kaca (Alokendo)	m2	15,01	0,011	100,000	-	100,000	15,010	-	15,010	0,011	-	0,011
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	12,54	0,009	100,000	-	100,000	12,540	-	12,540	0,009	-	0,009
	Pas. Silver Kaca Stainless	m2	12,54	0,003	100,000	-	100,000	12,540	-	12,540	0,003	-	0,003
	Pas. Kunci Pintu	bh	11,00	0,019	100,000	-	100,000	11,000	-	11,000	0,019	-	0,019
	Pas Engsel Pintu	bh	22,00	0,003	100,000	-	100,000	22,000	-	22,000	0,003	-	0,003
51	**Pek. Pintu P6**												
52	Pek. Pintu P6 Pintu Box Plat Rangka Box Situ Finishing Cat (Langk	m2	2,40	0,004	100,000	-	100,000	2,400	-	2,400	0,004	-	0,004
	Pek. Jendela Kaca (33)												
	Pek. Kusen Jendela 4 (Alokendo)	m1	92,40	0,044	100,000	-	100,000	92,400	-	92,400	0,044	-	0,044
	Pek. Daun Jendela (Alokendo)	m2	16,80	0,013	100,000	-	100,000	16,800	-	16,800	0,013	-	0,013
	Pas. Kaca Patahatap 5 mm	m2	29,56	0,047	100,000	-	100,000	29,560	-	29,560	0,047	-	0,047

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					KEMAJUAN PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	Pek. Aksesories Jendela Gieser	Ls	12,00	0,003	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,003	-	0,003
	Pek. Grendel Jendela	bh	12,00	0,001	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,001	-	0,001
53	Pek. Jendela Kaca (34)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	92,40	0,044	100,000	-	100,000	92,400	-	92,400	0,044	-	0,044
	Pas. Kaca Penahan 5 mm	m2	29,76	0,049	100,000	-	100,000	29,760	-	29,760	0,049	-	0,049
54	Pek. Jendela Kaca (36)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	201,60	0,097	100,000	-	100,000	201,600	-	201,600	0,097	-	0,097
	Pek. Daun Jendela (Aluminium)	m2	35,28	0,027	100,000	-	100,000	35,280	-	35,280	0,027	-	0,027
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	42,84	0,031	100,000	-	100,000	42,840	-	42,840	0,031	-	0,031
	Pas. Aksesories Jendela Gieser	Ls	42,00	0,009	100,000	-	100,000	42,000	-	42,000	0,009	-	0,009
	Pas. Grendel Jendela	bh	42,00	0,004	100,000	-	100,000	42,000	-	42,000	0,004	-	0,004
55	Pek. Jendela Kaca (37)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	31,60	0,015	100,000	-	100,000	31,600	-	31,600	0,015	-	0,015
	Pas. Kaca Penahan 5 mm	m2	11,44	0,019	100,000	-	100,000	11,440	-	11,440	0,019	-	0,019
56	Pek. Jendela Kaca (38)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	8,40	0,004	100,000	-	100,000	8,400	-	8,400	0,004	-	0,004
	Pas. Kaca Penahan 5 mm	m2	1,17	0,002	100,000	-	100,000	1,170	-	1,170	0,002	-	0,002
57	Pek. Jendela Kaca (V1)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	12,60	0,006	100,000	-	100,000	12,600	-	12,600	0,006	-	0,006
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	1,44	0,001	100,000	-	100,000	1,440	-	1,440	0,001	-	0,001
58	Pek. Jendela Kaca (V2)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	2,20	0,001	100,000	-	100,000	2,200	-	2,200	0,001	-	0,001
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	0,30	0,000	100,000	-	100,000	0,300	-	0,300	0,000	-	0,000
59	Pek. Jendela Kaca (V3)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	8,00	0,004	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,004	-	0,004
	Pas. Jalusi Aluminium	m2	1,00	0,003	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,003	-	0,003
60	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING			-									
	Pas. Lantai Granit dan Polished 60 x 60	m2	724,59	0,340	100,000	-	100,000	724,590	-	724,590	0,340	-	0,340
	Pas. Lantai Granit WC Unpolished 60 x 60	m2	66,93	0,050	100,000	-	100,000	66,930	-	66,930	0,050	-	0,050
	Pek. Waterproofing Site Lantai WC	m2	66,93	0,023	100,000	-	100,000	66,930	-	66,930	0,023	-	0,023
	Pas. Lantai Granit Meja Beton Polished 60 x 60	m2	4,83	0,004	100,000	-	100,000	4,830	-	4,830	0,004	-	0,004
	Pas. Dinding Granit WC Polished 60 x 60 T = 2 m	m2	251,58	0,187	100,000	-	100,000	251,580	-	251,580	0,187	-	0,187
	Pas. Lantai Granit Tangga Unfinished 60 x 60	m2	47,45	0,035	100,000	-	100,000	47,450	-	47,450	0,035	-	0,035
	Pas. Plint 10 x 60	m1	244,70	0,049	100,000	-	100,000	244,700	-	244,700	0,049	-	0,049
	Pas. Step Nosing Tangga dan Tangga Teras	m1	76,00	0,015	100,000	-	100,000	76,000	-	76,000	0,015	-	0,015
61	PEKERJAAN RANGKA DAN PLAFOND			-									
	Pek. Rangka Plafond Hollow Aluminium 40 x 40 (Modul 60 x 60)	m2	809,65	0,404	100,000	-	100,000	809,650	-	809,650	0,404	-	0,404
	Pas. Plafond PVC	m2	809,65	0,298	100,000	-	100,000	809,650	-	809,650	0,298	-	0,298
	Pas. List PVC	m1	546,23	0,054	100,000	-	100,000	546,230	-	546,230	0,054	-	0,054
62	PEKERJAAN PENGECATAN			-									
	Pek. Cat Dinding Interior Mowilex	m2	1.327,95	0,137	100,000	-	100,000	1.327,950	-	1.327,950	0,137	-	0,137
	Pek. Cat Dinding Exterior Mowilex	m2	314,16	0,036	100,000	-	100,000	314,160	-	314,160	0,036	-	0,036
	LANTAI 4												
63	PEKERJAAN DINDING												
	Pas. Dinding 1½ Bata (1 2) Area Lift dan Kali Meja Beton	m2	37,11	0,016	100,000	-	100,000	37,110	-	37,110	0,016	-	0,016
	Pek. Plesteran Dinding (1 3)	m2	74,22	0,018	100,000	-	100,000	74,220	-	74,220	0,018	-	0,018
	Pek. Acian Dinding dan Beton	m2	473,21	0,065	100,000	-	100,000	473,210	-	473,210	0,065	-	0,065
	Pas. Bata Ringan Tebal 10 Mortar Siap Pakai	m2	839,35	0,391	100,000	-	100,000	839,350	-	839,350	0,391	-	0,391
	Pas. Plesteran Mortar Siap Pakai	m2	1.274,39	0,576	100,000	-	100,000	1.274,390	-	1.274,390	0,576	-	0,576
	Pek. Acian Bata Ringan	m2	1.274,39	0,195	100,000	-	100,000	1.274,390	-	1.274,390	0,195	-	0,195
64	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			-									
65	Pek. Pintu P1 PartroonTipe 150.11 Double Door (Lengkap	bh	8,00	0,059	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,059	-	0,059
66	Pek. Pintu P2 PartroonTipe 120.11 Mother & Soon (Lengk	bh	1,00	0,006	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,006	-	0,006
67	Pek. Pintu P3			-									
	Pek. Kusen Pintu 4 (Aluminium)	m1	9,60	0,005	100,000	-	100,000	9,600	-	9,600	0,005	-	0,005
	Pas. Daun Pintu Kaca (Aluminium)	m2	2,73	0,002	100,000	-	100,000	2,730	-	2,730	0,002	-	0,002
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	2,73	0,002	100,000	-	100,000	2,730	-	2,730	0,002	-	0,002
	Pas. Kunci Pintu	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Pas Engsel Pintu	bh	4,00	0,000	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,000	-	0,000
68	Pek. Pintu P4 PartroonTipe 90.11 Single Door (Lengkap ACC)			-									
	Pek. Pintu P4 PartroonTipe 90.11 Single Door (Lengkap ACC)	bh	7,00	0,049	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,049	-	0,049
69	Pek. Pintu P5			-									
	Pek. Kusen Pintu 4 (Aluminium)	m1	51,70	0,025	100,000	-	100,000	51,700	-	51,700	0,025	-	0,025
	Pek. Daun Pintu Kaca (Aluminium)	m2	15,01	0,011	100,000	-	100,000	15,010	-	15,010	0,011	-	0,011
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	12,54	0,009	100,000	-	100,000	12,540	-	12,540	0,009	-	0,009
	Pas. Stiker Kaca Stainlesel	m2	12,54	0,003	100,000	-	100,000	12,540	-	12,540	0,003	-	0,003
	Pas. Kunci Pintu	bh	11,00	0,019	100,000	-	100,000	11,000	-	11,000	0,019	-	0,019
	Pas Engsel Pintu	bh	22,00	0,003	100,000	-	100,000	22,000	-	22,000	0,003	-	0,003
70	Pek. Pintu P6 Pintu Besi Plat Rangka Besi Siku Pinking Cat (Lengkap ACC)			-									
	Pek. Pintu P6 Pintu Bes Plat Rangka Bes Siku Pinking Cat (Lengk	m2	2,40	0,004	100,000	-	100,000	2,400	-	2,400	0,004	-	0,004
71	Pek. Jendela Kaca (33)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	92,40	0,044	100,000	-	100,000	92,400	-	92,400	0,044	-	0,044
	Pek. Daun Jendela (Aluminium)	m2	16,80	0,013	100,000	-	100,000	16,800	-	16,800	0,013	-	0,013
	Pas. Kaca Penahan 5 mm	m2	28,56	0,047	100,000	-	100,000	28,560	-	28,560	0,047	-	0,047
	Pas. Aksesoris Jendela Gieser	Ls	12,00	0,003	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,003	-	0,003
	Pas. Grendel Jendela	bh	12,00	0,001	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,001	-	0,001
72	Pek. Jendela Kaca (34)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	92,40	0,044	100,000	-	100,000	92,400	-	92,400	0,044	-	0,044
	Pas. Kaca Penahan 5 mm	m2	29,76	0,049	100,000	-	100,000	29,760	-	29,760	0,049	-	0,049
73	Pek. Jendela Kaca (36)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	201,60	0,097	100,000	-	100,000	201,600	-	201,600	0,097	-	0,097
	Pek. Daun Jendela (Aluminium)	m2	35,28	0,027	100,000	-	100,000	35,280	-	35,280	0,027	-	0,027
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	42,84	0,031	100,000	-	100,000	42,840	-	42,840	0,031	-	0,031
	Pas. Aksesoras Jendela Gieser	Ls	42,00	0,009	100,000	-	100,000	42,000	-	42,000	0,009	-	0,009
	Pas. Grendel Jendela	bh	42,00	0,004	100,000	-	100,000	42,000	-	42,000	0,004	-	0,004
74	Pek. Jendela Kaca (37)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	31,60	0,015	100,000	-	100,000	31,600	-	31,600	0,015	-	0,015
	Pas. Kaca Penahan 5 mm	m2	11,44	0,019	100,000	-	100,000	11,440	-	11,440	0,019	-	0,019
75	Pek. Jendela Kaca (38)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	8,40	0,004	100,000	-	100,000	8,400	-	8,400	0,004	-	0,004
	Pas. Kaca Penahan 5 mm	m2	1,17	0,002	100,000	-	100,000	1,170	-	1,170	0,002	-	0,002
76	Pek. Jendela Kaca (V1)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	12,60	0,006	100,000	-	100,000	12,600	-	12,600	0,006	-	0,006
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	1,44	0,001	100,000	-	100,000	1,440	-	1,440	0,001	-	0,001
77	Pek. Jendela Kaca (V2)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	2,20	0,001	100,000	-	100,000	2,200	-	2,200	0,001	-	0,001
	Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	0,30	0,000	100,000	-	100,000	0,300	-	0,300	0,000	-	0,000
78	Pek. Jendela Kaca (V3)			-									
	Pek. Kusen Jendela 4 (Aluminium)	m1	8,00	0,004	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,004	-	0,004
	Pas. Jalusi Aluminium	m2	1,00	0,003	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,003	-	0,003
79	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING			-									
	Pas. Lantai Granit Polished 60 x 60	m2	724,23	0,340	100,000	-	100,000	724,230	-	724,230	0,340	-	0,340
	Pas. Lantai Granit WC Unpolished 60 x 60	m2	66,93	0,050	100,000	-	100,000	66,930	-	66,930	0,050	-	0,050
	Pek. Waterproofing Site Lantai WC	m2	66,93	0,023	100,000	-	100,000	66,930	-	66,930	0,023	-	0,023
	Pas. Lantai Granit Meja Beton Polished 60 x 60	m2	4,83	0,004	100,000	-	100,000	4,830	-	4,830	0,004	-	0,004
	Pas. Dinding Granit WC Polished 60 x 60 T = 2 m	m2	251,58	0,187	100,000	-	100,000	251,580	-	251,580	0,187	-	0,187
	Pas. Lantai Granit Tangga Unfinished 60 x 60	m2	47,45	0,035	100,000	-	100,000	47,450	-	47,450	0,035	-	0,035
	Pas. Plint 10 x 60	m1	244,70	0,049	100,000	-	100,000	244,700	-	244,700	0,049	-	0,049
	Pas. Step Nosing Tangga dan Tangga Teras	m1	76,00	0,015	100,000	-	100,000	76,000	-	76,000	0,015	-	0,015
80	PEKERJAAN RANGKA DAN PLAFOND			-									
	Pek. Rangka Plafond Hollow Aluminium 40 x 40 (Modul 60 x 60)	m2	809,49	0,404	100,000	-	100,000	809,490	-	809,490	0,404	-	0,404
	Pas. Plafond PVC	m2	809,49	0,298	100,000	-	100,000	809,490	-	809,490	0,298	-	0,298
	Pas. List PVC	m1	546,23	0,054	100,000	-	100,000	546,230	-	546,230	0,054	-	0,054
81	PEKERJAAN PENGECATAN			-									
	Pek. Cat Dinding Interior Mowilex	m2	1.366,75	0,141	100,000	-	100,000	1.366,750	-	1.366,750	0,141	-	0,141
	Pek. Cat Dinding Exterior Mowilex	m2	329,45	0,038	100,000	-	100,000	329,450	-	329,450	0,038	-	0,038
	LANTAI 5												
82	PEKERJAAN DINDING												
	Pas. Dinding 1½ Bata (1 3) Area Lift dan Kali Meja Beton	m2	37,11	0,016	100,000	-	100,000	37,110	-	37,110	0,016	-	0,016
	Pek. Plesteran Dinding (1 3)	m2	74,22	0,018	100,000	-	100,000	74,220	-	74,220	0,018	-	0,018

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					REALISASI PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	Pek. Acian Dinding dan Beton	m2	473,219	0,065	100,000	-	100,000	473,219	-	473,219	0,065	-	0,065
	Pek. Bata Ringan Tebal 10 Mortar Siap Pakai	m2	814,500	0,380	100,000	-	100,000	814,500	-	814,500	0,380	-	0,380
	Pek. Plesteran Mortar Siap Pakai	m2	1.234,530	0,558	100,000	-	100,000	1.234,530	-	1.234,530	0,558	-	0,558
	Pek. Acian Bata Ringan	m2	1.234,530	0,189	100,000	-	100,000	1.234,530	-	1.234,530	0,189	-	0,189
97	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			-									
98	Pek. Kusen Pintu P1 Partress(Type 170.11 Double Door (Langkap ACC)	bh	6,00	0,078	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,078	-	0,078
99	Pek. Kusen Pintu P2 Partress(Type 120.11 Mother & Door (Langkap ACC)	bh	2,00	0,029	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,029	-	0,029
100	Pek. Pintu P3			-									
	Pek. Kusen Pintu + (Aluminium)	m1	9,80	0,005	100,000	-	100,000	9,800	-	9,800	0,005	-	0,005
	Pek. Daun Pintu Kaca (Aluminium)	m2	2,73	0,002	100,000	-	100,000	2,730	-	2,730	0,002	-	0,002
	Pek. Kaca Bening 5 mm	m2	2,73	0,002	100,000	-	100,000	2,730	-	2,730	0,002	-	0,002
	Pek. Kunci Pintu	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Pek Engsel Pintu	bh	4,00	0,000	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,000	-	0,000
97	Pek. Pintu P4 Partress(Type 90.11 Single Door (Langkap ACC)			-									
	Pek. Kusen Pintu P4 Partress(Type 90.11 Single Door (Langkap ACC)	bh	7,00	0,049	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,049	-	0,049
98	Pek. Pintu P5			-									
	Pek. Kusen Pintu + (Aluminium)	m1	51,70	0,025	100,000	-	100,000	51,700	-	51,700	0,025	-	0,025
	Pek. Daun Pintu Kaca (Aluminium)	m2	15,01	0,011	100,000	-	100,000	15,010	-	15,010	0,011	-	0,011
	Pek. Kaca Bening 5 mm	m2	12,54	0,009	100,000	-	100,000	12,540	-	12,540	0,009	-	0,009
	Pek. Kaca Kaca Stainless	m2	12,54	0,003	100,000	-	100,000	12,540	-	12,540	0,003	-	0,003
	Pek. Kunci Pintu	bh	11,00	0,019	100,000	-	100,000	11,000	-	11,000	0,019	-	0,019
	Pek Engsel Pintu	bh	22,00	0,003	100,000	-	100,000	22,000	-	22,000	0,003	-	0,003
99	Pek. Pintu P6 Pintu Besi Plat Rangka Besi Kaca Pintu Kaca Cat (Langkap ACC)			-									
	Pek. Kusen Pintu P6 Pintu Besi Plat Rangka Besi Kaca Pintu Kaca Cat (Langkap ACC)	m2	2,40	0,004	100,000	-	100,000	2,400	-	2,400	0,004	-	0,004
90	Pek. Jendela Kaca (J4)			-									
	Pek. Kusen Jendela + (Aluminium)	m1	92,40	0,044	100,000	-	100,000	92,400	-	92,400	0,044	-	0,044
	Pek. Kaca Penyetop 5 mm	m2	29,76	0,049	100,000	-	100,000	29,760	-	29,760	0,049	-	0,049
91	Pek. Jendela Kaca (J6)			-									
	Pek. Kusen Jendela + (Aluminium)	m1	124,80	0,060	100,000	-	100,000	124,800	-	124,800	0,060	-	0,060
	Pek. Daun Jendela (Aluminium)	m2	21,84	0,016	100,000	-	100,000	21,840	-	21,840	0,016	-	0,016
	Pek. Kaca Bening 5 mm	m2	26,52	0,019	100,000	-	100,000	26,520	-	26,520	0,019	-	0,019
	Pek. Aksesoris Jendela Kaca	ls	26,00	0,006	100,000	-	100,000	26,000	-	26,000	0,006	-	0,006
	Pek. Grendel Jendela	bh	26,00	0,002	100,000	-	100,000	26,000	-	26,000	0,002	-	0,002
92	Pek. Jendela Kaca (J7)			-									
	Pek. Kusen Jendela + (Aluminium)	m1	27,20	0,013	100,000	-	100,000	27,200	-	27,200	0,013	-	0,013
	Pek. Kaca Penyetop 5 mm	m2	11,44	0,019	100,000	-	100,000	11,440	-	11,440	0,019	-	0,019
97	Pek. Jendela Kaca (V1)			-									
	Pek. Kusen Jendela + (Aluminium)	m1	12,60	0,006	100,000	-	100,000	12,600	-	12,600	0,006	-	0,006
	Pek. Kaca Bening 5 mm	m2	1,44	0,001	100,000	-	100,000	1,440	-	1,440	0,001	-	0,001
94	Pek. Jendela Kaca (V2)			-									
	Pek. Kusen Jendela + (Aluminium)	m2	2,20	0,001	100,000	-	100,000	2,200	-	2,200	0,001	-	0,001
	Pek. Kaca Bening 5 mm	m2	0,30	0,000	100,000	-	100,000	0,300	-	0,300	0,000	-	0,000
97	Pek. Jendela Kaca (V3)			-									
	Pek. Kusen Jendela + (Aluminium)	m1	8,00	0,004	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,004	-	0,004
	Pek. Jalusi Aluminium	m2	1,00	0,003	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,003	-	0,003
96	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING			-									
	Pek. Lantai Granit Polished 60 x 60	m2	539,27	0,402	100,000	-	100,000	539,270	-	539,270	0,402	-	0,402
	Pek. Lantai Granit WC Unpolished 60 x 60	m2	66,93	0,050	100,000	-	100,000	66,930	-	66,930	0,050	-	0,050
	Pek. Waterproofing Site Lantai WC	m2	66,93	0,023	100,000	-	100,000	66,930	-	66,930	0,023	-	0,023
	Pek. Lantai Granit Meja Beton Polished 60 x 60	m2	4,83	0,004	100,000	-	100,000	4,830	-	4,830	0,004	-	0,004
	Pek. Dinding Granit WC Polished 60 x 60 T = 2 m	m2	251,58	0,187	100,000	-	100,000	251,580	-	251,580	0,187	-	0,187
	Pek. Lantai Granit Tangga Unfinished 60 x 60	m2	47,45	0,035	100,000	-	100,000	47,450	-	47,450	0,035	-	0,035
	Pek. Rise 10 x 60	m2	225,30	0,047	100,000	-	100,000	231,300	-	231,300	0,047	-	0,047
	Pek. Step Nosing Tangga dan Tanggo Teras	m2	76,00	0,015	100,000	-	100,000	76,000	-	76,000	0,015	-	0,015
97	PEKERJAAN RANGKA DAN PLAFOND			-									
	Pek. Rangka Rafond Hollow Aluminium 40 x 40 (Modul 60 x 60)	m2	843,80	0,421	100,000	-	100,000	843,800	-	843,800	0,421	-	0,421
	Pek. Rafond PVC	m2	843,80	0,310	100,000	-	100,000	843,800	-	843,800	0,310	-	0,310
	Pek. List PVC	m1	479,32	0,048	100,000	-	100,000	479,320	-	479,320	0,048	-	0,048
98	PEKERJAAN PENGECATAN			-									
	Pek. Cat Dinding Interior Hawlon	m2	1.267,00	0,171	100,000	-	100,000	1.267,000	-	1.267,000	0,171	-	0,171
	Pek. Cat Dinding Exterior Hawlon	m2	445,74	0,044	75,000	-	75,000	330,555	-	330,555	0,033	-	0,033
	TOP FLOOR												
99	PEKERJAAN DINDING												
	Pek. Dinding LV2 Bata Ø 15 Area Lift	m2	27,45	0,012	100,000	-	100,000	27,450	-	27,450	0,012	-	0,012
	Pek. Plesteran Dinding Ø 15	m2	54,90	0,013	100,000	-	100,000	54,900	-	54,900	0,013	-	0,013
	Pek. Acian Dinding dan Beton	m2	187,65	0,026	100,000	-	100,000	187,650	-	187,650	0,026	-	0,026
	Pek. Bata Ringan Tebal 10 Mortar Siap Pakai	m2	300,44	0,140	100,000	-	100,000	300,440	-	300,440	0,140	-	0,140
	Pek. Plesteran Mortar Siap Pakai	m2	600,87	0,271	100,000	-	100,000	600,870	-	600,870	0,271	-	0,271
	Pek. Acian Bata Ringan	m2	600,87	0,096	100,000	-	100,000	600,870	-	600,870	0,096	-	0,096
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			-									
100	Pek. Pintu P3			-									
	Pek. Kusen Pintu + (Aluminium)	m1	4,80	0,002	100,000	-	100,000	4,800	-	4,800	0,002	-	0,002
	Pek. Daun Pintu Kaca (Aluminium)	m2	1,37	0,001	100,000	-	100,000	1,370	-	1,370	0,001	-	0,001
	Pek. Kaca Bening 5 mm	m2	1,37	0,001	100,000	-	100,000	1,370	-	1,370	0,001	-	0,001
	Pek. Kunci Pintu	bh	1,00	0,002	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,002	-	0,002
	Pek Engsel Pintu	bh	2,00	0,000	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,000	-	0,000
101	Pek. Jendela Kaca (V5)			-									
	Pek. Kusen Jendela + (Aluminium)	m1	12,60	0,006	100,000	-	100,000	12,600	-	12,600	0,006	-	0,006
	Pek. Kaca Bening 5 mm	m2	1,44	0,001	100,000	-	100,000	1,440	-	1,440	0,001	-	0,001
102	PEKERJAAN PENGECATAN			-									
	Pek. Cat Dinding Exterior Hawlon	m2	788,52	0,091	100,000	-	100,000	788,520	-	788,520	0,091	-	0,091
103	PEKERJAAN FASADE DAN INTERIOR												
	PEKERJAAN FASADE DAN INTERIOR												
	Pek. ACP (Aluminium Composite Panel) 0,3 Alloy 3003 PVDF Exte	m2	2.763,20	6,065	98,500	1,500	100,000	2.721,752	41,448	2.763,200	5,974	0,091	6,065
	Pek. Huruf Stainless Steel + Stiker	ls	1,00	0,076	70,000	-	70,000	0,700	-	0,700	0,054	-	0,054
	Pek. Backdrop Resepsionis	m2	20,88	0,046	-	100,000	100,000	-	20,880	20,880	-	0,046	0,046
	Pek. Meja Receptionist	m2	4,00	-	70,000	-	70,000	2,800	-	2,800	-	-	-
	Pek. Huruf Acrilic Receptionist	ls	1,00	0,068	70,000	-	70,000	0,700	-	0,700	0,047	-	0,047
	Pek. Pembungkus Kolom Finishing Conwood	m2	28,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pek. Rangka Multipleks Finishing Kolom Lt 1	m2	212,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pek. HPL Finishing Kolom Lt 1	m2	212,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pek. Reding Stainless Steel + Kaca Tempered 10 mm Outdoor	m2	20,52	0,080	100,000	-	100,000	20,520	-	20,520	0,080	-	0,080
	Pek. Reding Stainless Steel + Kaca Tempered 10 mm (Tangga)	m2	63,80	0,247	100,000	-	100,000	63,800	-	63,800	0,247	-	0,247
	Pek. Reding Stainless Steel + Kaca Tempered 10 mm (Void)	m2	19,25	0,075	100,000	-	100,000	19,250	-	19,250	0,075	-	0,075
	Pek. Reding Bes Stainless Steel Tangga	m2	39,80	0,155	100,000	-	100,000	39,800	-	39,800	0,155	-	0,155
	Pek. Reding Bes Stainless Steel Dinabel	m2	4,75	0,018	100,000	-	100,000	4,750	-	4,750	0,018	-	0,018
	Pek. Rangka Bes Hollow 40(40 T. 1.8 mm Modul 40 x 40 Finishing	m2	259,74	0,022	100,000	-	100,000	259,740	-	259,740	0,102	-	0,102
	Pek. Conwood Dek Dudukan Kursi Audio Visual	m2	259,74	0,153	75,000	15,000	90,000	194,805	38,961	233,766	0,114	0,023	0,137
	II. GEDUNG LABORATORIUM TERPADU												
	I. PEKERJAAN SANITAIR												
	LANTAI 1												
	Pek. Kloset Duduk (Toto)	set	13,00	0,146	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,109	0,036	0,146
	Pek. Wastafel Meja (Toto)	set	7,00	0,043	75,000	25,000	100,000	5,250	1,750	7,000	0,032	0,011	0,043
	Pek. Wastafel Gantung (Toto)	set	2,00	0,007	75,000	25,000	100,000	1,500	0,500	2,000	0,005	0,002	0,007
	Pek. Jet Washer (Stainless Steel)	set	13,00	0,022	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,017	0,006	0,022
	Pek. Kran Wastafel (Stainless Steel)	set	9,00	0,005	75,000	25,000	100,000	6,750	2,250	9,000	0,004	0,001	0,005
	Pek. Kran Air (Stainless Steel)	set	15,00	0,004	75,000	25,000	100,000	11,250	3,750	15,000	0,003	0,001	0,004
	Pek. Floor Drain (Stainless Steel)	set	14,00	0,006	75,000	25,000	100,000	10,500	3,500	14,000	0,004	0,001	0,006
	Pek. Floor Clean Out 4	set	8,00	0,003	75,000	25,000	100,000	6,000	2,000	8,000	0,002	0,001	0,003
	Pek. Cermin Tebal 5 mm	m2	4,50	0,002	75,000	25,000	100,000	3,375	1,125	4,500	0,002	0,001	0,002
	Pek. Grab Bar 150 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Grab Bar 100 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,001	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,001	-	0,001
	Pek. Grab Bar 80 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Tempat Sabun	bh	13,00	0,006	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,004	0,001	0,006
	Pek. Tempat Tissue	bh	13,00	0,006	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,004	0,001	0,006

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					NILAI/HARGA PEKERJAAN (Rp)			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI (%)		
					S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	LANTAI 3												
	Pas. Kloset Duduk (Toto)	set	13,00	0,146	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,139	0,036	0,146
	Pas. Washtafel Meja (Toto)	set	7,00	0,043	75,000	25,000	100,000	5,250	1,750	7,000	0,032	0,011	0,043
	Pas. Washtafel Gantung (Toto)	set	2,00	0,007	75,000	25,000	100,000	1,500	0,500	2,000	0,005	0,002	0,007
	Pas. Jet Washer (Stainless Steel)	set	13,00	0,022	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,017	0,006	0,022
	Pas. Kran Washtafel (Stainless Steel)	set	9,00	0,005	70,000	30,000	100,000	6,300	2,700	9,000	0,004	0,002	0,005
	Pas. Kran Air (Stainless Steel)	set	15,00	0,004	70,000	30,000	100,000	10,500	4,500	15,000	0,003	0,001	0,004
	Pas. Floor Drain (Stainless Steel)	set	14,00	0,006	75,000	25,000	100,000	10,500	3,500	14,000	0,004	0,001	0,006
	Pas. Floor Cleen Out 4	set	8,00	0,003	75,000	25,000	100,000	6,000	2,000	8,000	0,002	0,001	0,003
	Pas. Cermin Tebal 5 mm	m2	4,50	0,002	75,000	25,000	100,000	3,375	1,125	4,500	0,002	0,001	0,002
	Pas. Grab Bar 150 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pas. Grab Bar 100 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,001	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,001	-	0,001
	Pas. Grab Bar 80 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pas. Tempat Sabun	bh	13,00	0,006	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,004	0,001	0,006
	Pas. Tempat Tissue	bh	13,00	0,006	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,004	0,001	0,006
	LANTAI 3												
	Pas. Kloset Duduk (Toto)	set	13,00	0,146	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,139	0,036	0,146
	Pas. Washtafel Meja (Toto)	set	7,00	0,043	75,000	25,000	100,000	5,250	1,750	7,000	0,032	0,011	0,043
	Pas. Washtafel Gantung (Toto)	set	2,00	0,007	75,000	25,000	100,000	1,500	0,500	2,000	0,005	0,002	0,007
	Pas. Jet Washer (Stainless Steel)	set	13,00	0,022	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,017	0,006	0,022
	Pas. Kran Washtafel (Stainless Steel)	set	9,00	0,005	75,000	25,000	100,000	6,750	2,250	9,000	0,004	0,001	0,005
	Pas. Kran Air (Stainless Steel)	set	15,00	0,004	75,000	25,000	100,000	11,250	3,750	15,000	0,003	0,001	0,004
	Pas. Floor Drain (Stainless Steel)	set	14,00	0,006	75,000	25,000	100,000	10,500	3,500	14,000	0,004	0,001	0,006
	Pas. Floor Cleen Out 4	set	8,00	0,003	75,000	25,000	100,000	6,000	2,000	8,000	0,002	0,001	0,003
	Pas. Cermin Tebal 5 mm	m2	4,50	0,002	75,000	25,000	100,000	3,375	1,125	4,500	0,002	0,001	0,002
	Pas. Grab Bar 150 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pas. Grab Bar 100 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,001	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,001	-	0,001
	Pas. Grab Bar 80 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pas. Tempat Sabun	bh	13,00	0,006	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,004	0,001	0,006
	Pas. Tempat Tissue	bh	13,00	0,006	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,004	0,001	0,006
	LANTAI 4												
	Pas. Kloset Duduk (Toto)	set	13,00	0,146	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,139	0,036	0,146
	Pas. Washtafel Meja (Toto)	set	7,00	0,043	75,000	25,000	100,000	5,250	1,750	7,000	0,032	0,011	0,043
	Pas. Washtafel Gantung (Toto)	set	2,00	0,007	75,000	25,000	100,000	1,500	0,500	2,000	0,005	0,002	0,007
	Pas. Jet Washer (Stainless Steel)	set	13,00	0,022	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,017	0,006	0,022
	Pas. Kran Washtafel (Stainless Steel)	set	9,00	0,005	75,000	25,000	100,000	6,750	2,250	9,000	0,004	0,001	0,005
	Pas. Kran Air (Stainless Steel)	set	15,00	0,004	75,000	25,000	100,000	11,250	3,750	15,000	0,003	0,001	0,004
	Pas. Floor Drain (Stainless Steel)	set	14,00	0,006	75,000	25,000	100,000	10,500	3,500	14,000	0,004	0,001	0,006
	Pas. Floor Cleen Out 4	set	8,00	0,003	75,000	25,000	100,000	6,000	2,000	8,000	0,002	0,001	0,003
	Pas. Cermin Tebal 5 mm	m2	4,50	0,002	75,000	25,000	100,000	3,375	1,125	4,500	0,002	0,001	0,002
	Pas. Grab Bar 150 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pas. Grab Bar 100 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,001	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,001	-	0,001
	Pas. Grab Bar 80 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pas. Tempat Sabun	bh	13,00	0,006	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,004	0,001	0,006
	Pas. Tempat Tissue	bh	13,00	0,006	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,004	0,001	0,006
	LANTAI 5												
1,00	Pas. Kloset Duduk (Toto)	set	13,00	0,146	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,139	0,036	0,146
2,00	Pas. Washtafel Meja (Toto)	set	7,00	0,043	75,000	25,000	100,000	5,250	1,750	7,000	0,032	0,011	0,043
3,00	Pas. Washtafel Gantung (Toto)	set	2,00	0,007	75,000	25,000	100,000	1,500	0,500	2,000	0,005	0,002	0,007
4,00	Pas. Jet Washer (Stainless Steel)	set	13,00	0,022	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,017	0,006	0,022
5,00	Pas. Kran Washtafel (Stainless Steel)	set	9,00	0,005	75,000	25,000	100,000	6,750	2,250	9,000	0,004	0,001	0,005
6,00	Pas. Kran Air (Stainless Steel)	set	15,00	0,004	75,000	25,000	100,000	11,250	3,750	15,000	0,003	0,001	0,004
7,00	Pas. Floor Drain (Stainless Steel)	set	14,00	0,006	75,000	25,000	100,000	10,500	3,500	14,000	0,004	0,001	0,006
8,00	Pas. Floor Cleen Out 4	set	8,00	0,003	75,000	25,000	100,000	6,000	2,000	8,000	0,002	0,001	0,003
9,00	Pas. Cermin Tebal 5 mm	m2	4,50	0,002	75,000	25,000	100,000	3,375	1,125	4,500	0,002	0,001	0,002
10,00	Pas. Grab Bar 150 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
11,00	Pas. Grab Bar 100 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,001	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,001	-	0,001
12,00	Pas. Grab Bar 80 cm (Stainless Steel)	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
13,00	Pas. Tempat Sabun	bh	13,00	0,006	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,004	0,001	0,006
14,00	Pas. Tempat Tissue	bh	13,00	0,006	75,000	25,000	100,000	9,750	3,250	13,000	0,004	0,001	0,006
	II. GEDUNG LABORATORIUM TERPADU												
	4. PEKERJAAN MECHANICAL ELEKTRICAL												
	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH												
	1. PERALATAN UTAMA												
	Pompa Booster lengkap Panel Kontrol + Kabel + Asesoris dan V	Set	2,00	0,269	50,000	50,000	100,000	1,000	1,000	2,000	0,134	0,134	0,269
	Type Multy Stage			-									
	Kapasitas 24 M3/h			-									
	Total head 40 meter			-									
	Penggerak motor listrik			-									
	Daya 1,1 kw			-									
	Putaran 2900 rpm			-									
	Kompl. listrik 380 V/3 phase y/50 hz	unit	2,00	0,190	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,190	-	0,190
	Tipe Reservoir (Roof Tank)			-									
	Kapasitas 12 m3			-									
	Material Fibre Glass (panel type)			-									
	Type Hg 125			-									
	Transfer Pump	Set	1,00	0,216	50,000	50,000	100,000	0,500	0,500	1,000	0,108	0,108	0,216
	Multi stage Pump, Horisontal			-									
	Flow 11 m3/jh			-									
	Tinggi 28 meter			-									
	Pompa Sumur dalam dan lengkap Pengeboran air Tanah	Set	1,00	0,218	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,218	-	0,218
	Multi stage Pump, Vertikal			-									
	Flow 11 m3/jh			-									
	Ground Reservoir (Ground Tank)	unit	1,00	0,314	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,314	-	0,314
	Bolier kapasitas 6 m3 lengkap dengan pemipaan dan instalasinya	unit	2,00	0,269	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,269	-	0,269
	- Diameter 25mm	m1	85,00	0,016	90,000	10,000	100,000	76,500	8,500	85,000	0,014	0,002	0,016
	- Gate Valve Diameter 25 mm	set	4,00	0,003	90,000	10,000	100,000	3,600	0,400	4,000	0,003	0,000	0,003
	standart, lengkap elbow, reducer, T Wes, dll												
	Lantai B1												
	- Diameter 13mm	mr	40,00	0,003	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	0,003	-	0,003
	- Diameter 20mm	mr	32,00	0,002	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,002	-	0,002
	- Diameter 25mm	mr	40,00	0,007	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	0,007	-	0,007
	- Diameter 50 mm	mr	24,00	0,004	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,004	-	0,004
	- Perelatan bantu, sambungan, Tee, Elbow, bracket/support, dl	ls	1,00	0,009	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,009	-	0,009
	- Gate Valve Diameter 50 mm	Set	4,00	0,008	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,008	-	0,008
	Lantai B2												
	- Diameter 13mm	mr	40,00	0,003	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	0,003	-	0,003
	- Diameter 20mm	mr	32,00	0,002	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,002	-	0,002
	- Diameter 25mm	mr	40,00	0,007	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	0,007	-	0,007
	- Diameter 50 mm	mr	24,00	0,004	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,004	-	0,004
	- Perelatan bantu, sambungan, Tee, Elbow, bracket/support, dl	ls	1,00	0,009	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,009	-	0,009
	- Gate Valve Diameter 50 mm	Set	4,00	0,008	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,008	-	0,008
	Lantai B3												
	- Diameter 13mm	mr	40,00	0,003	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	0,003	-	0,003
	- Diameter 20mm	mr	32,00	0,002	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,002	-	0,002
	- Diameter 25mm	mr	40,00	0,007	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	0,007	-	0,007
	- Diameter 50 mm	mr	24,00	0,004	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,004	-	0,004
	- Perelatan bantu, sambungan, Tee, Elbow, bracket/support, dl	ls	1,00	0,009	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,009	-	0,009
	- Gate Valve Diameter 50 mm	Set	4,00	0,008	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,008	-	0,008
	Lantai B4												
	- Diameter 13mm	mr	40,00	0,003	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	0,003	-	0,003

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					NILAI/HARI PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	- Diameter 20mm	mtr	32,00	0,002	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,002	-	0,002
	- Diameter 25mm	mtr	40,00	0,007	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	0,007	-	0,007
	- Diameter 32 mm	mtr	24,00	0,004	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,004	-	0,004
	- Peralatan bantu, sambungan, Tee, Elbow, bracket\support, dll	ls	1,00	0,009	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,009	-	0,009
	- Gate Valve Diameter 32 mm	Set	4,00	0,008	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,008	-	0,008
	Lantai 05												
	- Diameter 15mm	mtr	40,00	0,003	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	0,003	-	0,003
	- Diameter 20mm	mtr	32,00	0,002	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,002	-	0,002
	- Diameter 25mm	mtr	40,00	0,007	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	0,007	-	0,007
	- Diameter 32 mm	mtr	24,00	0,004	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,004	-	0,004
	- Peralatan bantu, sambungan, Tee, Elbow, bracket\support, dll	ls	1,00	0,009	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,009	-	0,009
	- Gate Valve Diameter 32 mm	Set	4,00	0,008	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,008	-	0,008
	PENYEMAAN INSTALASI AIR KOTOR												
	PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU												
	Pipa menggunakan uPVC Class AW												
	standard lengkap elbow, T-Wie, dll												
	Pipa Utama Vertikal												
	- Diameter 150mm	mtr	112,00	0,053	100,000	-	100,000	112,000	-	112,000	0,053	-	0,053
	Lantai 01		-										
	Pipa Horizontal (Area Km/Wc)		-										
	- Diameter 100mm	mtr	60,00	0,028	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	0,028	-	0,028
	- Diameter 80mm	mtr	32,00	0,009	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,009	-	0,009
	- Diameter 50mm	mtr	24,00	0,004	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,004	-	0,004
	- Diameter 50mm (Ventilasi) type D	mtr	28,00	0,004	100,000	-	100,000	28,000	-	28,000	0,004	-	0,004
	- Diameter 40mm (Ventilasi) Type D	mtr	16,00	0,002	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,002	-	0,002
	- Peralatan bantu, sambungan, Tee, Elbow, bracket\support, dll	ls	1,00	0,009	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,009	-	0,009
	Lantai 02												
	Pipa Horizontal (Area Km\Wc)												
	- Diameter 100mm	mtr	60,00	0,028	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	0,028	-	0,028
	- Diameter 80mm	mtr	32,00	0,009	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,009	-	0,009
	- Diameter 50mm	mtr	24,00	0,004	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,004	-	0,004
	- Diameter 50mm (Ventilasi) type D	mtr	28,00	0,004	100,000	-	100,000	28,000	-	28,000	0,004	-	0,004
	- Diameter 40mm (Ventilasi) Type D	mtr	16,00	0,002	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,002	-	0,002
	- Peralatan bantu, sambungan, Tee, Elbow, bracket\support, dll	ls	1,00	0,009	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,009	-	0,009
	- Diameter 100mm	mtr	60,00	0,028	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	0,028	-	0,028
	- Diameter 80mm	mtr	32,00	0,009	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,009	-	0,009
	- Diameter 50mm	mtr	24,00	0,004	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,004	-	0,004
	- Diameter 50mm (Ventilasi) type D	mtr	28,00	0,004	100,000	-	100,000	28,000	-	28,000	0,004	-	0,004
	- Diameter 40mm (Ventilasi) Type D	mtr	16,00	0,002	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,002	-	0,002
	- Peralatan bantu, sambungan, Tee, Elbow, bracket\support, dll	ls	1,00	0,009	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,009	-	0,009
	- Diameter 100mm	mtr	60,00	0,028	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	0,028	-	0,028
	- Diameter 80mm	mtr	32,00	0,009	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,009	-	0,009
	- Diameter 50mm	mtr	24,00	0,004	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,004	-	0,004
	- Diameter 50mm (Ventilasi) type D	mtr	28,00	0,004	100,000	-	100,000	28,000	-	28,000	0,004	-	0,004
	- Diameter 40mm (Ventilasi) Type D	mtr	16,00	0,002	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,002	-	0,002
	- Peralatan bantu, sambungan, Tee, Elbow, bracket\support, dll	ls	1,00	0,009	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,009	-	0,009
	- Diameter 100mm	mtr	60,00	0,028	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	0,028	-	0,028
	- Diameter 80mm	mtr	32,00	0,009	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,009	-	0,009
	- Diameter 50mm	mtr	24,00	0,004	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,004	-	0,004
	- Diameter 50mm (Ventilasi) type D	mtr	28,00	0,004	100,000	-	100,000	28,000	-	28,000	0,004	-	0,004
	- Diameter 40mm (Ventilasi) Type D	mtr	16,00	0,002	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,002	-	0,002
	- Peralatan bantu, sambungan, Tee, Elbow, bracket\support, dll	ls	1,00	0,009	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,009	-	0,009
	- Diameter 100mm	mtr	60,00	0,028	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	0,028	-	0,028
	- Diameter 80mm	mtr	32,00	0,009	100,000	-	100,000	32,000	-	32,000	0,009	-	0,009
	- Diameter 50mm	mtr	24,00	0,004	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000	0,004	-	0,004
	- Diameter 50mm (Ventilasi) type D	mtr	28,00	0,004	100,000	-	100,000	28,000	-	28,000	0,004	-	0,004
	- Diameter 40mm (Ventilasi) Type D	mtr	16,00	0,002	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,002	-	0,002
	- Peralatan bantu, sambungan, Tee, Elbow, bracket\support, dll	ls	1,00	0,009	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,009	-	0,009
	Pipa PVC AW dia 4 Kit Roof drain	bh	384,00	0,182	100,000	-	100,000	384,000	-	384,000	0,182	-	0,182
	Roof drain dia 4	bh	16,00	0,009	-	100,000	100,000	-	16,000	16,000	-	0,009	0,009
	Pekerjaan dan alat bantu termasuk support , bracket dan perlunjang	ls	1,00	0,007	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,007	-	0,007
	Kapasitas 300 KVA lengkap dgn panel	set	1,00	0,362	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,362	-	0,362
	TM (1 Incoming, 1 Outgoing) motorised operation testing	LS	1,00	0,505	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,505	-	0,505
	Grounding system	ls	1,00	0,019	-	100,000	100,000	-	1,000	1,000	-	0,019	0,019
	NOXSFGBY 3 X 1 x 50 mm2 HV Incoming & out going	mtr	20,00	0,063	-	100,000	100,000	-	20,000	20,000	-	0,063	0,063
	NOXSFGBY 3 X1 X 50 mm2 TRAFO 300 kva	mtr	16,00	0,051	-	100,000	100,000	-	16,000	16,000	-	0,051	0,051
	NYY 4 X (1 X 300) mm2 PANEL LVMDP ke trawo	mtr	8,00	0,096	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,096	-	0,096
	NYY 4 X (1 X300) mm2 PANEL LVMD - SDP	mtr	30,00	0,359	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	0,359	-	0,359
	NYY 4 x 16 mm2 LVMDP - LIFT	mtr	30,00	0,015	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	0,015	-	0,015
	NYY 4 x 16 mm2 SDP - PP.P LUAR	mtr	30,00	0,015	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	0,015	-	0,015
	NYY 4 x 16 mm2 SDP - POMPA	mtr	50,00	0,025	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	0,025	-	0,025
	NYY 4 x 50 mm2 LVMDP - HIDRANT	mtr	15,00	0,028	100,000	-	100,000	15,000	-	15,000	0,028	-	0,028
	NYY 4 x 10 mm2 SDP - AB DAN ELEKTRODE	mtr	15,00	0,005	100,000	-	100,000	15,000	-	15,000	0,005	-	0,005
	NYY 4 x 10 mm2 PP - AC LANTAI 01 - 05	mtr	100,00	0,033	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	0,033	-	0,033
	NYY 4 x 250 mm2 PP - AC outdoor lantai Atap	mtr	30,00	0,256	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	0,256	-	0,256
	NYY 4 x 16 mm2 PP - P LANTAI 01 - 05	mtr	100,00	0,049	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	0,049	-	0,049
	MDP	Unit	1,00	0,322	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,322	-	0,322
	SDP	Unit	1,00	0,248	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,248	-	0,248
	PP - HYDRANT	Unit	1,00	0,021	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,021	-	0,021
	PP - AB	Unit	1,00	0,021	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,021	-	0,021
	PP - LIFT	Unit	1,00	0,021	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,021	-	0,021
	PP- AC TOP FLOOR	Unit	1,00	0,035	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,035	-	0,035
	PP -AC LT 01-05	Unit	5,00	0,122	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,122	-	0,122
	PP - P LT. 01-05	Unit	5,00	0,122	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,122	-	0,122
	PP - BOOSTER B	Unit	2,00	0,045	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,045	-	0,045
	PP - LP Elektronik	Unit	5,00	0,112	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,112	-	0,112
	Lantai 01												
	Instalasi titik lampu	titk	149,00	0,198	100,000	-	100,000	149,000	-	149,000	0,198	-	0,198
	Instalasi titik stop kontak	titk	30,00	0,027	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	0,027	-	0,027
	Instalasi titik stop kontak khusus	titk	6,00	0,005	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,005	-	0,005
	Instalasi Ex House	titk	16,00	0,021	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,021	-	0,021
	Instalasi Axial Fan	titk	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	RM 300 2 X 18 LED	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Downlight 19 watt RD 4	bh	118,00	0,035	100,000	-	100,000	118,000	-	118,000	0,035	-	0,035
	Downlight 13 watt RD 3	bh	16,00	0,005	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,005	-	0,005
	Lampu Exit LED 3 watt + Batrai	bh	6,00	0,002	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,002	-	0,002
	Lampu TL TCS 097 1X14W	bh	4,00	0,005	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,005	-	0,005
	RM 300 2 X 18 TLED r/w Nicad Battery	bh	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
	TD LED 1 x 14 watt Dust Proof	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	LED Strip Ceiling	mtr	324,00	0,284	100,000	-	100,000	324,000	-	324,000	0,284	-	0,284
	Exhouse 250 Cfm	Set	16,00	0,021	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,021	-	0,021
	Psh, Pem, Axial Fan 3200 CFM lengkap Asesoris	Set	4,00	0,041	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,041	-	0,041
	Saklar set	bh	40,00	0,005	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	0,005	-	0,005
	Stop kontak khusus 1000 VA	bh	6,00	0,001	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,001	-	0,001
	Stop kontak 200 VA	bh	30,00	0,006	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	0,006	-	0,006
	Ducting Exhouse PVC type D 4	mtr	16,00	0,014	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,014	-	0,014
	Lantai 02												
	Instalasi titik lampu	titk	124,00	0,165	100,000	-	100,000	124,000	-	124,000	0,165	-	0,165
	Instalasi titik stop kontak	titk	48,00	0,043	100,000	-	100,000	48,000	-	48,000	0,043	-	0,043
	Instalasi titik stop kontak khusus	titk	3,00	0,003	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,003	-	0,003
	Instalasi Ex House	titk	42,00	0,021	100,000	-	100,000	42,000	-	42,000	0,021	-	0,021
	Instalasi Axial Fan	titk	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	RM 300 2 X 18 LED	bh	44,00	0,041	100,000	-	100,000	44,000	-	44,000	0,041	-	0,041
	Downlight 19 watt RD 4	bh	46,00	0,014	100,000	-	100,000	46,000	-	46,000	0,014	-	0,014
	Downlight 13 watt RD 3	bh	16,00	0,005	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,005	-	0,005
	Lampu Exit LED 3 watt + Batrai	bh	6,00	0,002	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,002	-	0,002
	Lampu TL TCS 097 1X14W	bh	4,00	0,005	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,005	-	0,005
	RM 300 2 X 18 TLED r/w Nicad Battery	bh	6,00	0,006	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,006	-	0,006
	TD LED 1 x 14 watt Dust Proof	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Exhouse 200 Cfm	Set	16,00	0,021	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,021	-	0,021
	Psh, Pem, Axial Fan 3200 CFM lengkap Asesoris	Set	2,00	0,021	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,021	-	0,021
	Saklar set	bh	46,00	0,006	100,000	-	100,000	46,000	-	46,000	0,006	-	0,006
	Stop kontak khusus 1000 VA	bh	3,00	0,001	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,001	-	0,001
	Stop kontak 200 VA	bh	48,00	0,010	100,000	-	100,000	48,000	-	48,000	0,010	-	0,010

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					RENCANAAN PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	Ducting Exhouse PVC type D 4	Mtr	16,00	0,014	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,014	-	0,014
	Lantai 03												
	Instalasi titik lampu	titik	133,00	0,177	100,000	-	100,000	133,000	-	133,000	0,177	-	0,177
	Instalasi titik stop kontak	titik	53,00	0,048	100,000	-	100,000	53,000	-	53,000	0,048	-	0,048
	Instalasi titik stop kontak khusus	titik	3,00	0,003	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,003	-	0,003
	Instalasi Ex House	titik	42,00	0,021	100,000	-	100,000	42,000	-	42,000	0,021	-	0,021
	Instalasi Axial Fan	titik	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	RM 300 2 X 18 LED	bh	56,00	0,052	100,000	-	100,000	56,000	-	56,000	0,052	-	0,052
	Downlight 19 watt RD 4	bh	42,00	0,012	100,000	-	100,000	42,000	-	42,000	0,012	-	0,012
	Downlight 13 watt RD 3	bh	16,00	0,005	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,005	-	0,005
	Lampu Exit LED 3 watt + Baterai	bh	6,00	0,002	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,002	-	0,002
	Lampu TL TCS 097 1X24W	bh	4,00	0,005	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,005	-	0,005
	RM 300 2 X 18 TLED c/w Nicad Battery	bh	7,00	0,007	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,007	-	0,007
	TD LED 1 x 14 watt Dust Proof	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Exhouse 200 Cfm	Set	16,00	0,021	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,021	-	0,021
	Pek. Pem. Axial Fan 3200 CFM lengkap Assesoris	Set	2,00	0,021	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,021	-	0,021
	Saklar set	bh	46,00	0,006	100,000	-	100,000	46,000	-	46,000	0,006	-	0,006
	Stop kontak khusus 1000 VA	bh	3,00	0,001	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,001	-	0,001
	Stop kontak 200 VA	bh	53,00	0,011	100,000	-	100,000	53,000	-	53,000	0,011	-	0,011
	Ducting Exhouse PVC type D 4	Mtr	16,00	0,014	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,014	-	0,014
	Lantai 04												
	Instalasi titik lampu	titik	133,00	0,177	100,000	-	100,000	133,000	-	133,000	0,177	-	0,177
	Instalasi titik stop kontak	titik	53,00	0,048	100,000	-	100,000	53,000	-	53,000	0,048	-	0,048
	Instalasi titik stop kontak khusus	titik	3,00	0,003	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,003	-	0,003
	Instalasi Ex House	titik	16,00	0,021	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,021	-	0,021
	Instalasi Axial Fan	titik	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	RM 300 2 X 18 LED	bh	56,00	0,052	100,000	-	100,000	56,000	-	56,000	0,052	-	0,052
	Downlight 19 watt RD 4	bh	42,00	0,012	100,000	-	100,000	42,000	-	42,000	0,012	-	0,012
	Downlight 13 watt RD 3	bh	16,00	0,005	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,005	-	0,005
	Lampu Exit LED 3 watt + Baterai	bh	6,00	0,002	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,002	-	0,002
	Lampu TL TCS 097 1X24W	bh	4,00	0,005	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,005	-	0,005
	RM 300 2 X 18 TLED c/w Nicad Battery	bh	7,00	0,007	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,007	-	0,007
	TD LED 1 x 14 watt Dust Proof	bh	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Exhouse 200 Cfm	Set	16,00	0,021	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,021	-	0,021
	Pek. Pem. Axial Fan 3200 CFM lengkap Assesoris	Set	2,00	0,021	70,000	30,000	100,000	1,400	0,600	2,000	0,014	0,006	0,021
	Saklar set	bh	46,00	0,006	100,000	-	100,000	46,000	-	46,000	0,006	-	0,006
	Stop kontak khusus 1000 VA	bh	3,00	0,001	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,001	-	0,001
	Stop kontak 200 VA	bh	53,00	0,011	100,000	-	100,000	53,000	-	53,000	0,011	-	0,011
	Ducting Exhouse PVC type D 4	Mtr	16,00	0,014	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,014	-	0,014
	Lantai 05												
	Instalasi titik lampu	titik	134,00	0,178	100,000	-	100,000	134,000	-	134,000	0,178	-	0,178
	Instalasi titik stop kontak	titik	33,00	0,030	100,000	-	100,000	33,000	-	33,000	0,030	-	0,030
	Instalasi titik stop kontak khusus	titik	6,00	0,005	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,005	-	0,005
	Instalasi Ex House	titik	16,00	0,021	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,021	-	0,021
	RM 300 2 X 18 LED	bh	22,00	0,021	100,000	-	100,000	22,000	-	22,000	0,021	-	0,021
	Downlight 19 watt RD 4	bh	80,00	0,024	80,000	20,000	100,000	64,000	16,000	80,000	0,019	0,005	0,024
	Downlight 13 watt RD 3	bh	16,00	0,005	80,000	20,000	100,000	12,800	3,200	16,000	0,004	0,001	0,005
	Lampu Exit LED 3 watt + Baterai	bh	6,00	0,002	70,000	30,000	100,000	4,200	1,800	6,000	0,001	0,000	0,002
	Lampu TL TCS 097 1X24W	bh	4,00	0,005	70,000	30,000	100,000	2,800	1,200	4,000	0,003	0,001	0,005
	RM 300 2 X 18 TLED c/w Nicad Battery	bh	4,00	0,004	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,004	-	0,004
	TD LED 1 x 14 watt Dust Proof	bh	2,00	0,002	70,000	30,000	100,000	1,400	0,600	2,000	0,002	0,001	0,002
	Exhouse 200 Cfm	Set	16,00	0,021	70,000	30,000	100,000	11,200	4,800	16,000	0,015	0,006	0,021
	Pek. Pem. Axial Fan 3200 CFM lengkap Assesoris	Set	2,00	0,021	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,021	-	0,021
	Saklar set	bh	39,00	0,005	100,000	-	100,000	39,000	-	39,000	0,005	-	0,005
	Stop kontak khusus 1000 VA	bh	6,00	0,001	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,001	-	0,001
	Stop kontak 200 VA	bh	33,00	0,007	100,000	-	100,000	33,000	-	33,000	0,007	-	0,007
	Ducting Exhouse PVC type D 4	Mtr	16,00	0,014	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	0,014	-	0,014
	INSTALASI CABLE TRAY												
	Lantai 01												
	Cable tray U 600 x 100, tebal 1,8 mm	mtr	5,00	0,004	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,004	-	0,004
	Cable tray U 600 x 100, tebal 1,8 mm	mtr	65,00	0,052	100,000	-	100,000	65,000	-	65,000	0,052	-	0,052
	Cable tray U 300 x 100, tebal 1,2 mm	mtr	65,00	0,031	100,000	-	100,000	65,000	-	65,000	0,031	-	0,031
	Support tray, Material bantu.	ls	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	Lantai 02				-								
	Cable tray U 600 x 100, tebal 1,8 mm	mtr	5,00	0,004	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,004	-	0,004
	Cable tray U 600 x 100, tebal 1,8 mm	mtr	45,00	0,036	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000	0,036	-	0,036
	Cable tray U 300 x 100, tebal 1,2 mm	mtr	45,00	0,022	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000	0,022	-	0,022
	Support tray, Material bantu.	ls	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	Lantai 03				-								
	Cable tray U 600 x 100, tebal 1,8 mm	mtr	5,00	0,004	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,004	-	0,004
	Cable tray U 600 x 100, tebal 1,8 mm	mtr	45,00	0,036	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000	0,036	-	0,036
	Cable tray U 300 x 100, tebal 1,2 mm	mtr	45,00	0,022	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000	0,022	-	0,022
	Support tray, Material bantu.	ls	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	Lantai 04				-								
	Cable tray U 600 x 100, tebal 1,8 mm	mtr	5,00	0,004	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,004	-	0,004
	Cable tray U 600 x 100, tebal 1,8 mm	mtr	45,00	0,036	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000	0,036	-	0,036
	Cable tray U 300 x 100, tebal 1,2 mm	mtr	45,00	0,022	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000	0,022	-	0,022
	Support tray, Material bantu.	ls	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	Lantai 05				-								
	Cable tray U 600 x 100, tebal 1,8 mm	mtr	5,00	0,004	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,004	-	0,004
	Cable tray U 600 x 100, tebal 1,8 mm	mtr	45,00	0,036	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000	0,036	-	0,036
	Cable tray U 300 x 100, tebal 1,2 mm	mtr	45,00	0,022	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000	0,022	-	0,022
	Support tray, Material bantu.	ls	2,00	0,003	20,000	80,000	100,000	0,400	1,600	2,000	0,001	0,002	0,003
	INSTALASI PENANGKAL PETIR												
	Kabel NYY 1 x 50 mm dari ground rod ke penangkal petir	m	35,00	0,065	95,000	5,000	100,000	33,250	1,750	35,000	0,062	0,003	0,065
	Lampu Obstruction 60 Watt + Photo Cell + Instalasi +UPS system	bh	1,00	0,016	-	100,000	100,000	-	1,000	1,000	-	0,016	0,016
	Pentanahan tembaga				-								
	Jasa Instalasi dan Material Bantu	lot	1,00	0,002	-	100,000	100,000	-	1,000	1,000	-	0,002	0,002
	Bak Kontrol 40 x 40 x 40 cm	lot	1,00	0,002	-	100,000	100,000	-	1,000	1,000	-	0,002	0,002
	3 x Copper rod 5/8 x 5 meter atau Tahanan Pentanahan maks. 5	lot	1,00	0,022	95,000	5,000	100,000	0,950	0,050	1,000	0,021	0,001	0,022
	Material Bantu	lot	1,00	0,001	-	100,000	100,000	-	1,000	1,000	-	0,001	0,001
	Klem-klem	lot	1,00	0,001	-	100,000	100,000	-	1,000	1,000	-	0,001	0,001
	Tiang sepanjang 1,2 meter di atas Bangunan	lot	1,00	0,009	-	100,000	100,000	-	1,000	1,000	-	0,009	0,009
	Isi Separator	lot	1,00	0,009	-	100,000	100,000	-	1,000	1,000	-	0,009	0,009
	Pekerjaan Pemasangan Instalasi Kontroler	Set	1,00	0,339	85,000	15,000	100,000	0,850	0,150	1,000	0,288	0,051	0,339
	Lantai 01												
	AC ceiling Cassette (4 way) 38.200 Btu/hjh type MMU-UP0361HP-E	Set	7,00	0,509	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,509	-	0,509
	AC ceiling Cassette (4 way) 30.700 Btu/hjh type MMU-UP0301HP-E	Set	3,00	0,203	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,203	-	0,203
	AC Wall Mounted 12.300 Btu/hjh type MMK-UP0121HP-E toshiba +	Unit	3,00	0,141	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,141	-	0,141
	Outdoor Unit type MMY-UP4211T8P toshiba	Unit	1,00	1,044	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	1,044	-	1,044
	Outdoor Unit type MMY-UP2811T8P toshiba	Unit	1,00	0,092	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,092	-	0,092
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga Ø280 Dia. 6.4 mm (1/4")	Mtr	23,20	0,005	100,000	-	100,000	23,200	-	23,200	0,005	-	0,005
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga Ø280 Dia. 9.5 mm (3/8)	Mtr	113,30	0,030	100,000	-	100,000	113,300	-	113,300	0,030	-	0,030
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga Ø280 Dia. 12.7 mm (1/2)	Mtr	35,30	0,012	100,000	-	100,000	35,300	-	35,300	0,012	-	0,012
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga Ø280 Dia. 15.9 mm (5/8)	Mtr	125,60	0,055	100,000	-	100,000	125,600	-	125,600	0,055	-	0,055
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga Ø280 Dia. 19.1 mm (3/4")	Mtr	15,50	0,008	100,000	-	100,000	15,500	-	15,500	0,008	-	0,008
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga Ø280 Dia. 22.2 mm (7/8)	Mtr	119,60	0,090	100,000	-	100,000	119,600	-	119,600	0,090	-	0,090
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga Ø280 Dia. 28.6 mm (1-1/8)	Mtr	30,00	0,030	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	0,030	-	0,030
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga Ø280 Dia. 34.9 mm (1-3/8)	Mtr	8,80	0,010	100,000	-	100,000	8,800	-	8,800	0,010	-	0,010
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga Ø280 Dia. 41.3 mm (1-5/8)	Mtr	120,70	0,170	100,000	-	100,000	120,700	-	120,700	0,170	-	0,170
	Pek. Pemasangan 1 Set Y Shape Branching Joint (Random Size)	Set	5,00	0,044	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,044	-	0,044
	Pek. Pemasangan 1 Titik Kabel Kontrol AC NYM 3 x 2,5 mm2	Set	5,00	0,022	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,022	-	0,022
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 1\2	Mtr	10,00	0,001	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	0,001	-	0,001
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 3 (drain indoor unit cell	Mtr	80,00	0,008	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000	0,008	-	0,008
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 2 (Main Drain line)	Mtr	76,00	0,012	100,000	-	100,000	76,000	-	76,000	0,012	-	0,012
	Instalasi Titik AC 1 Phase	titik	5,00	0,009	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,009	-	0,009

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					RENCANA PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	Instalasi Titik AC 3 Phase	Titik	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Hanger Indoor	Unit	7,00	0,007	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,007	-	0,007
	Testing Comissioning	Unit	7,00	0,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 02			-									
	AC ceiling Cassete (4 way) 24.200 Btuh\h type MMU-UP0241HP-E	Set	1,00	0,068	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,068	-	0,068
	AC ceiling Cassete (4 way) 19.100 Btuh\h type MMU-UP0181HP-E	Set	2,00	0,135	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,135	-	0,135
	AC Wall Mounted 12.300 Btuh\h typeMMK-UP0121HP-E toshiba +	Set	1,00	0,047	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,047	-	0,047
	Outdoor Unit type MMY-MUP1801TBP toshiba	Unit	2,00	0,183	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,183	-	0,183
	Pek. Pemasangan 1 m1 Pipa Tembaga B280 Dia. 6.4 mm (1\4")	My	89,40	0,019	100,000	-	100,000	89,400	-	89,400	0,019	-	0,019
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 9.5 mm (3\8)	My	35,00	0,009	100,000	-	100,000	35,000	-	35,000	0,009	-	0,009
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 12.7 mm (1\2)	My	100,40	0,033	100,000	-	100,000	100,400	-	100,400	0,033	-	0,033
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 15.9 mm (5\8)	My	128,50	0,056	100,000	-	100,000	128,500	-	128,500	0,056	-	0,056
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 19.1 mm (3\4)	My	7,00	0,004	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,004	-	0,004
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 22.2 mm (7\8)	My	14,50	0,011	100,000	-	100,000	14,500	-	14,500	0,011	-	0,011
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 28.6 mm (1-1\8)	My	126,00	0,125	100,000	-	100,000	126,000	-	126,000	0,125	-	0,125
	Pek. Pemasangan 1 Set Y-Shape Branching Joint (Random Size) t	Set	4,00	0,035	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,035	-	0,035
	Pek. Pemasangan 1 Titik Kabel Kontrol AC NYM 3 x 2,5 mm2	Set	4,00	0,018	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,018	-	0,018
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 1\2	My	10,00	0,001	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	0,001	-	0,001
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 1 (drain indoor unit cell	My	78,00	0,007	100,000	-	100,000	78,000	-	78,000	0,007	-	0,007
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 2 (Main Drain line)	My	70,00	0,011	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000	0,011	-	0,011
	Instalasi Titik AC 1 Phase	Titik	4,00	0,007	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,007	-	0,007
	Instalasi Titik AC 3 Phase	Titik	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Hanger Indoor	Unit	6,00	0,006	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,006	-	0,006
	Testing Comissioning	Unit	6,00	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 03			-									
	Pekerjaan Pemasangan AC Split dan Ceiling Casset			-									
	AC ceiling Cassete (4 way) 19.100 Btuh\h type MMU-UP0181HP-E	Set	2,00	0,135	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,135	-	0,135
	AC Wall Mounted 12.300 Btuh\h typeMMK-UP0121HP-E toshiba +	Unit	1,00	0,047	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,047	-	0,047
	Outdoor Unit type MMY-MUP1801TBP toshiba	Unit	2,00	0,183	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,183	-	0,183
	Pekerjaan Supply & Instalasi Pipa Refrigerant ASTM B280, termas			-									
	Pemipaan Refrigerant termasuk isolasi			-									
	Pek. Pemasangan 1 m1 Pipa Tembaga B280 Dia. 6.4 mm (1\4")	My	110,30	0,024	100,000	-	100,000	110,300	-	110,300	0,024	-	0,024
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 9.5 mm (3\8)	My	23,90	0,006	100,000	-	100,000	23,900	-	23,900	0,006	-	0,006
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 12.7 mm (1\2)	My	135,80	0,045	100,000	-	100,000	135,800	-	135,800	0,045	-	0,045
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 15.9 mm (5\8)	My	50,00	0,022	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	0,022	-	0,022
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 19.1 mm (3\4)	My	64,90	0,034	100,000	-	100,000	64,900	-	64,900	0,034	-	0,034
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 22.2 mm (7\8)	My	14,00	0,011	100,000	-	100,000	14,000	-	14,000	0,011	-	0,011
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 28.6 mm (1-1\8)	My	70,50	0,070	100,000	-	100,000	70,500	-	70,500	0,070	-	0,070
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 34.9 mm (1-3\8)	My	60,00	0,065	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	0,065	-	0,065
	Pek. Pemasangan 1 Set Y-Shape Branching Joint (Random Size) t	Set	3,00	0,026	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,026	-	0,026
	Pek. Pemasangan 1 Titik Kabel Kontrol AC NYM 3 x 2,5 mm2	Set	3,00	0,013	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,013	-	0,013
	PEKERJAAN INSTALASI PIPA DRAIN PVC			-									
	Pipa drain (PVC Pipe AW) ex. Rucika\Tetara, termasuk insulasi d			-									
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 1\2	My	10,00	0,001	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	0,001	-	0,001
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 1 (drain indoor unit cell	My	80,00	0,008	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000	0,008	-	0,008
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 2 (Main Drain line)	My	76,00	0,012	100,000	-	100,000	76,000	-	76,000	0,012	-	0,012
	Pekerjaan Instalasi Power Indoor Ac			-									
	Instalasi Titik AC 1 Phase	Titik	3,00	0,005	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,005	-	0,005
	Instalasi Titik AC 3 Phase	Titik	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Hanger Indoor	Unit	5,00	0,005	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,005	-	0,005
	Testing Comissioning	Unit	5,00	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 04			-									
	Pekerjaan Pemasangan AC Split dan Ceiling Casset			-									
	AC ceiling Cassete (4 way) 19.100 Btuh\h type MMU-UP0181HP-E	Set	2,00	0,135	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,135	-	0,135
	AC Wall Mounted 12.300 Btuh\h typeMMK-UP0121HP-E toshiba +	Unit	1,00	0,047	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,047	-	0,047
	Outdoor Unit type MMY-MUP1801TBP toshiba	Unit	2,00	0,183	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,183	-	0,183
	Pek. Pemasangan 1 m1 Pipa Tembaga B280 Dia. 6.4 mm (1\4")	My	110,30	0,024	100,000	-	100,000	110,300	-	110,300	0,024	-	0,024
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 9.5 mm (3\8)	My	23,90	0,006	100,000	-	100,000	23,900	-	23,900	0,006	-	0,006
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 12.7 mm (1\2)	My	135,80	0,045	100,000	-	100,000	135,800	-	135,800	0,045	-	0,045
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 15.9 mm (5\8)	My	50,00	0,022	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	0,022	-	0,022
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 19.1 mm (3\4)	My	54,90	0,028	100,000	-	100,000	54,900	-	54,900	0,028	-	0,028
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 22.2 mm (7\8)	My	14,00	0,011	100,000	-	100,000	14,000	-	14,000	0,011	-	0,011
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 28.6 mm (1-1\8)	My	70,50	0,070	100,000	-	100,000	70,500	-	70,500	0,070	-	0,070
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 34.9 mm (1-3\8)	My	50,00	0,054	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	0,054	-	0,054
	Pek. Pemasangan 1 Set Y-Shape Branching Joint (Random Size) t	Set	3,00	0,026	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,026	-	0,026
	Pek. Pemasangan 1 Titik Kabel Kontrol AC NYM 3 x 2,5 mm2	Set	3,00	0,013	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,013	-	0,013
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 1\2	My	10,00	0,001	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	0,001	-	0,001
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 1 (drain indoor unit cell	My	80,00	0,008	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000	0,008	-	0,008
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 2 (Main Drain line)	My	76,00	0,012	100,000	-	100,000	76,000	-	76,000	0,012	-	0,012
	Instalasi Titik AC 1 Phase	Titik	3,00	0,005	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,005	-	0,005
	Instalasi Titik AC 3 Phase	Titik	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Hanger Indoor	Unit	5,00	0,005	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,005	-	0,005
	Testing Comissioning	Unit	5,00	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 05			-									
	AC ceiling Cassete (4 way) 38.200 Btuh\h type MMU-UP0361HP-E	Set	1,00	0,068	95,000	5,000	100,000	0,950	0,050	1,000	0,064	0,003	0,068
	AC ceiling Cassete (4 way) 19.100 Btuh\h type MMU-UP0181HP-E	Set	2,00	0,135	95,000	5,000	100,000	1,900	0,100	2,000	0,128	0,007	0,135
	AC Wall Mounted 12.300 Btuh\h typeMMK-UP0121HP-E toshiba +	Unit	1,00	0,047	95,000	5,000	100,000	0,950	0,050	1,000	0,045	0,002	0,047
	Outdoor Unit type MMY-UP3411TBP toshiba	Unit	1,00	0,092	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,092	-	0,092
	Outdoor Unit type MMY-MUP1801TBP toshiba	Unit	1,00	0,092	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,092	-	0,092
	Pek. Pemasangan 1 m1 Pipa Tembaga B280 Dia. 6.4 mm (1\4")	My	58,70	0,013	100,000	-	100,000	58,700	-	58,700	0,013	-	0,013
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 9.5 mm (3\8)	My	46,10	0,012	100,000	-	100,000	46,100	-	46,100	0,012	-	0,012
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 12.7 mm (1\2)	My	78,60	0,026	100,000	-	100,000	78,600	-	78,600	0,026	-	0,026
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 15.9 mm (5\8)	My	63,10	0,028	100,000	-	100,000	63,100	-	63,100	0,028	-	0,028
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 19.1 mm (3\4)	My	105,50	0,055	100,000	-	100,000	105,500	-	105,500	0,055	-	0,055
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 22.2 mm (7\8)	My	5,40	0,004	100,000	-	100,000	5,400	-	5,400	0,004	-	0,004
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 28.6 mm (1-1\8)	My	19,00	0,019	100,000	-	100,000	19,000	-	19,000	0,019	-	0,019
	Pek. Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 34.9 mm (1-3\8)	My	118,00	0,128	100,000	-	100,000	118,000	-	118,000	0,128	-	0,128
	Pek. Pemasangan 1 Set Y-Shape Branching Joint (Random Size) t	Set	4,00	0,035	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,035	-	0,035
	Pek. Pemasangan 1 Titik Kabel Kontrol AC NYM 3 x 2,5 mm2	Set	4,00	0,018	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,018	-	0,018
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 1\2	My	10,00	0,001	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	0,001	-	0,001
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 1 (drain indoor unit cell	My	80,00	0,008	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000	0,008	-	0,008
	Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 2 (Main Drain line)	My	76,00	0,012	100,000	-	100,000	76,000	-	76,000	0,012	-	0,012
	Instalasi Titik AC 1 Phase	Titik	4,00	0,007	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,007	-	0,007
	Instalasi Titik AC 3 Phase	Titik	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Hanger Indoor	Unit	6,00	0,006	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,006	-	0,006
	Testing Comissioning	Unit	6,00	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSTALASI PEMADAN KEBAKARAN												
	Pemipaan Hydrant dan Sprinkler sesuai gambar dan spesifikasi te												
	Pekerjaan Di Ruang Pompa												
	Pek. Pemasangan 1 Unit Jockey Fire Pump Vertical Multi Stage, 7	Set	1,00	0,213	-	100,000	100,000	-	1,000	1,000	-	0,213	0,213
	Pek. Pemasangan 1 Unit Main Fire Pump Centrifugal End Suction,	Set	1,00	-									
	Pek. Pemasangan Header 10 Lengkap Assesoris dan Valve dan Ko	Set	1,00	0,247	65,000	35,000	100,000	0,650	0,350	1,000	0,161	0,087	0,247
	Pekerjaan Hydrant												
	Pemipaan Hydrant Pipa Black Steel di cat coating dan Assesoris												
	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, Dia. 4 (100 mm)	My	10,00	0,016	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	0,016	-	0,016
	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, Dia. 3 (80 mm)	My	20,00	0,018	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	0,018	-	0,018
	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, Dia. 2-1\2 (65 mm)	My	20,00	0,016	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	0,016	-	0,016
	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, Dia. 2 (50 mm)	My	6,00	0,005	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000	0,005	-	0,005
	Pek. Pemasangan BCV Set dia. 100 mm tap Lantai	Set	5,00	0,081	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,081	-	0,081
	Pek. Pemasangan 1 Unit Outdoor Hydrant Box (OHB)	Unit	2,00	0,027	75,000	25,000	100,000	1,500	0,500	2,000	0,020	0,007	0,027
	Pek. Pemasangan 1 Unit Siamese Connection	Unit	1,00	0,013	75,000	25,000	100,000	0,750	0,250	1,000	0,010	0,003	0,013
	Pek. Pemasangan 1 Unit Hydrant Pillar	Unit	1,00	0,012	75,000	25,000	100,000	0,750	0,250	1,000	0,009	0,003	0,012
	Lantai 01												
	Pek. Pemasangan 1 Unit Indoor Hydrant Box (IHB)	Unit	2,00	0,027	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,027	-	0,027
	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, Dia. 4 (100 mm)	My	5,00	0,008	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,008	-	0,008
	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, Dia. 3 (80 mm)	My	13,00	0,012	100,000	-	100,000	13,000	-	13,000	0,012	-	0,012
	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, Dia. 2-1\2 (65 mm)	My	25,00	0,020	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000	0,020	-	0,020
	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, Dia. 2 (50 mm)	My	8,00	0,007	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,007	-	0,007
	Gate valve dia 2	Ea	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Fitting dan assesoris , support , bracket dan lainnya	Is	2,00	0,003	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,002	0,001	0,003

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					NILAI/JUMLAH PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					SD MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI
	Lantai 02			-									
	Pek. Pemasangan 1 Unit Indoor Hydrant Box (IHB)	Unit	3,00	0,027	100,000	-	100,000	3,000	-	3,000	0,027	-	0,027
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 4 (100 mm)	My	5,00	0,008	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,008	-	0,008
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 3 (80 mm)	My	11,00	0,012	100,000	-	100,000	11,000	-	11,000	0,012	-	0,012
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 2 1\/2 (65 mm)	My	20,00	0,016	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	0,016	-	0,016
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 2 (50 mm)	My	8,00	0,007	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,007	-	0,007
	Gate valve dia 2	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Fitting dan acessories , support , bracket dan lainnya	ls	2,00	0,003	75,000	25,000	100,000	1,500	0,500	2,000	0,002	0,001	0,003
	Lantai 03			-								-	
	Pek. Pemasangan 1 Unit Indoor Hydrant Box (IHB)	Unit	2,00	0,027	70,000	30,000	100,000	1,400	0,600	2,000	0,019	0,008	0,027
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 4 (100 mm)	My	5,00	0,008	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,008	-	0,008
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 3 (80 mm)	My	11,00	0,012	100,000	-	100,000	11,000	-	11,000	0,012	-	0,012
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 2 1\/2 (65 mm)	My	20,00	0,016	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	0,016	-	0,016
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 2 (50 mm)	My	8,00	0,007	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,007	-	0,007
	Gate valve dia 2	bh	2,00	0,004	70,000	30,000	100,000	1,400	0,600	2,000	0,003	0,001	0,004
	Fitting dan acessories , support , bracket dan lainnya	ls	2,00	0,003	40,000	60,000	100,000	0,800	1,200	2,000	0,001	0,002	0,003
	Lantai 04			-								-	
	Pek. Pemasangan 1 Unit Indoor Hydrant Box (IHB)	Unit	2,00	0,027	70,000	30,000	100,000	1,400	0,600	2,000	0,019	0,008	0,027
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 4 (100 mm)	My	5,00	0,008	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,008	-	0,008
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 3 (80 mm)	My	11,00	0,012	100,000	-	100,000	11,000	-	11,000	0,012	-	0,012
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 2 1\/2 (65 mm)	My	20,00	0,016	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	0,016	-	0,016
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 2 (50 mm)	My	8,00	0,007	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,007	-	0,007
	Gate valve dia 2	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Fitting dan acessories , support , bracket dan lainnya	ls	2,00	0,003	70,000	30,000	100,000	1,400	0,600	2,000	0,002	0,001	0,003
	Lantai 05			-								-	
	Pek. Pemasangan 1 Unit Indoor Hydrant Box (IHB)	Unit	2,00	0,027	70,000	30,000	100,000	1,400	0,600	2,000	0,019	0,008	0,027
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 4 (100 mm)	My	5,00	0,008	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,008	-	0,008
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 3 (80 mm)	My	11,00	0,012	100,000	-	100,000	11,000	-	11,000	0,012	-	0,012
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 2 1\/2 (65 mm)	My	20,00	0,016	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	0,016	-	0,016
	Pemasangan 1 m pipa Bl SCH 40, Dia. 2 (50 mm)	My	8,00	0,007	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,007	-	0,007
	Gate valve dia 2	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Fitting dan acessories , support , bracket dan lainnya	ls	2,00	0,003	75,000	25,000	100,000	1,500	0,500	2,000	0,002	0,001	0,003
	Pekerjaan Sprinkle												
	Pipa Black steel Sch 40 ASTM A-120												
	Lantai 01												
	dia 80 mm	My	12,00	0,011	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,011	-	0,011
	dia 50 mm	My	56,00	0,046	100,000	-	100,000	56,000	-	56,000	0,046	-	0,046
	dia 25 mm	My	208,00	0,052	100,000	-	100,000	208,000	-	208,000	0,052	-	0,052
	Head Sprinker	bh	57,00	0,011	100,000	-	100,000	57,000	-	57,000	0,011	-	0,011
	Gate valve dia 2	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Fitting dan acessories , support , bracket dan lainnya	ls	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	Lantai 02			-								-	
	dia 80 mm	My	12,00	0,011	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,011	-	0,011
	dia 50 mm	My	56,00	0,046	100,000	-	100,000	56,000	-	56,000	0,046	-	0,046
	dia 25 mm	My	164,00	0,041	100,000	-	100,000	164,000	-	164,000	0,041	-	0,041
	Head Sprinker	bh	45,00	0,009	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000	0,009	-	0,009
	Gate valve dia 2	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Fitting dan acessories , support , bracket dan lainnya	ls	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	Lantai 03			-								-	
	dia 80 mm	My	12,00	0,011	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,011	-	0,011
	dia 50 mm	My	56,00	0,046	100,000	-	100,000	56,000	-	56,000	0,046	-	0,046
	dia 25 mm	My	164,00	0,041	100,000	-	100,000	164,000	-	164,000	0,041	-	0,041
	Head Sprinker	bh	49,00	0,009	100,000	-	100,000	49,000	-	49,000	0,009	-	0,009
	Gate valve dia 2	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Fitting dan acessories , support , bracket dan lainnya	ls	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	Lantai 04			-								-	
	dia 80 mm	My	12,00	0,011	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,011	-	0,011
	dia 50 mm	My	56,00	0,046	100,000	-	100,000	56,000	-	56,000	0,046	-	0,046
	dia 25 mm	My	164,00	0,041	100,000	-	100,000	164,000	-	164,000	0,041	-	0,041
	Head Sprinker	bh	49,00	0,009	100,000	-	100,000	49,000	-	49,000	0,009	-	0,009
	Gate valve dia 2	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Fitting dan acessories , support , bracket dan lainnya	ls	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	Lantai 05			-								-	
	dia 80 mm	My	12,00	0,011	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,011	-	0,011
	dia 50 mm	My	45,00	0,037	100,000	-	100,000	45,000	-	45,000	0,037	-	0,037
	dia 25 mm	My	228,00	0,057	100,000	-	100,000	228,000	-	228,000	0,057	-	0,057
	Head Sprinker	bh	59,00	0,011	100,000	-	100,000	59,000	-	59,000	0,011	-	0,011
	Gate valve dia 2	bh	2,00	0,004	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,004	-	0,004
	Fitting dan acessories , support , bracket dan lainnya	ls	2,00	0,003	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,003	-	0,003
	INSTALASI FERE ALARM												
	Pekerjaan ini meliputi pemasangan , pengadaan barang sesuai												
	spesifikasi teknis dan dapat berfungsi sesuai system meliputi												
	Instalasi lengkap dengan kabel FRC \/ JTC 4 X0,8 mm2 dari MFCA	mtr	125,00	0,042	100,000	-	100,000	125,000	-	125,000	0,042	-	0,042
	Fire Alarm Control Panel Konvensional c\/w battery			-									
	Type Seriel			-									
	MCFA 10 zone Control Panel Fire Detector Konvensional servo	Set	1,00	0,036	60,000	40,000	100,000	0,600	0,400	1,000	0,022	0,015	0,036
	Annuciator	lot	1,00	0,015	80,000	20,000	100,000	0,800	0,200	1,000	0,012	0,003	0,015
	Testing dan Comissioning	lot	1,00	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 1												
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Detector Konvensional Per Titik	tb	30,00	0,027	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	0,027	-	0,027
	Pek. Pemasangan 1 titik instalasi Lamp Indicator	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Manual Push Button	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Alarm Bell	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Alarm Indicator Bell	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Intercom Jack	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Flow & Temper Switch	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Terminal Box Fire Alarm (TB -01) c\/w BMSF-6 servo	Set	2,00	0,005	90,000	10,000	100,000	1,800	0,200	2,000	0,005	0,001	0,005
	Heat detector rate Of rise	Set	30,00	0,018	90,000	10,000	100,000	27,000	3,000	30,000	0,016	0,002	0,018
	Manual break glass	Set	2,00	0,002	90,000	10,000	100,000	1,800	0,200	2,000	0,001	0,000	0,002
	Alarm Break glass	Set	2,00	0,002	90,000	10,000	100,000	1,800	0,200	2,000	0,001	0,000	0,002
	Fire Man telephone	Set	2,00	0,002	90,000	10,000	100,000	1,800	0,200	2,000	0,002	0,000	0,002
	Lamp Indicator	Set	2,00	0,001	90,000	10,000	100,000	1,800	0,200	2,000	0,001	0,000	0,001
	Horn Strobo	Set	2,00	0,001	90,000	10,000	100,000	1,800	0,200	2,000	0,001	0,000	0,001
	flow Switch	Set	2,00	0,003	90,000	10,000	100,000	1,800	0,200	2,000	0,003	0,000	0,003
	Testing dan Comissioning	lot	2,00	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 2												
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Detector Konvensional Per Titik	tb	29,00	0,026	100,000	-	100,000	29,000	-	29,000	0,026	-	0,026
	Pek. Pemasangan 1 titik instalasi Lamp Indicator	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Manual Push Button	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Alarm Bell	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Alarm Indicator Bell	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Intercom Jack	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Flow & Temper Switch	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Terminal Box Fire Alarm (TB -01) c\/w BMSF-6 servo	Set	2,00	0,005	85,000	15,000	100,000	1,700	0,300	2,000	0,005	0,001	0,005
	Heat detector rate Of rise	Set	29,00	0,018	70,000	30,000	100,000	20,300	8,700	29,000	0,013	0,005	0,018
	Manual break glass	Set	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,002
	Alarm Break glass	Set	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,002
	Fire Man telephone	Set	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,002	0,000	0,002
	Lamp Indicator	Set	2,00	0,001	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,001
	Horn Strobo	Set	2,00	0,001	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,001
	flow Switch	Set	2,00	0,003	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,003	0,001	0,003
	Testing dan Comissioning	lot	2,00	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 3												
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Detector Konvensional Per Titik	tb	28,00	0,025	100,000	-	100,000	28,000	-	28,000	0,025	-	0,025
	Pek. Pemasangan 1 titik instalasi Lamp Indicator	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Manual Push Button	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Alarm Bell	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Alarm Indicator Bell	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Intercom Jack	tb	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					REALISASI PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Flow & Temper Switch	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Terminal Box Fire Alarm (TB -01) c/w BMMF 4 series	Set	2,00	0,005	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,004	0,001	0,005
	Heat detector rate Of rise	Set	28,00	0,017	70,000	30,000	100,000	19,600	8,400	28,000	0,012	0,005	0,017
	Manual break glass	Set	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,002
	Alarm Break glass	Set	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,002
	Fire Man telephone	Set	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,002	0,000	0,002
	Lamp Indikator	Set	2,00	0,001	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,001
	Horn Strobo	Set	2,00	0,001	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,001
	Bow Swith	Set	2,00	0,003	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,003	0,001	0,003
	Testing dan Comissioning	lot	2,00	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 4												
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Detector Konvensional Per Titik	Tik	28,00	0,025	100,000	-	100,000	28,000	-	28,000	0,025	-	0,025
	Pek. Pemasangan 1 titik Instalasi Lamp Indicator	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Manual Push Button	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Alarm Bell	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Alarm Indicator Bell	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Intercom Jack	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Flow & Temper Switch	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Terminal Box Fire Alarm (TB -01) c/w BMMF 4 series	Set	2,00	0,005	75,000	25,000	100,000	1,500	0,500	2,000	0,004	0,001	0,005
	Heat detector rate Of rise	Set	28,00	0,017	75,000	25,000	100,000	21,000	7,000	28,000	0,013	0,004	0,017
	Manual break glass	Set	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,002
	Alarm Break glass	Set	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,002
	Fire Man telephone	Set	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,002	0,000	0,002
	Lamp Indikator	Set	2,00	0,001	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,001
	Horn Strobo	Set	2,00	0,001	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,001
	Bow Swith	Set	2,00	0,003	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,003	0,001	0,003
	Testing dan Comissioning	lot	2,00	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 05												
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Detector Konvensional Per Titik	Tik	29,00	0,026	100,000	-	100,000	29,000	-	29,000	0,026	-	0,026
	Pek. Pemasangan 1 titik Instalasi Lamp Indicator	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Manual Push Button	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Alarm Bell	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Alarm Indicator Bell	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Intercom Jack	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Flow & Temper Switch	Tik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Terminal Box Fire Alarm (TB -01) c/w BMMF 4 series	Set	2,00	0,005	65,000	35,000	100,000	1,300	0,700	2,000	0,003	0,002	0,005
	Heat detector rate Of rise	Set	29,00	0,018	70,000	30,000	100,000	20,300	8,700	29,000	0,012	0,005	0,018
	Manual break glass	Set	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,002
	Alarm Break glass	Set	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,002
	Fire Man telephone	Set	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,002	0,000	0,002
	Lamp Indikator	Set	2,00	0,001	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,001
	Horn Strobo	Set	2,00	0,001	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,001	0,000	0,001
	Bow Swith	Set	2,00	0,003	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,003	0,001	0,003
	Testing dan Comissioning	lot	2,00	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-		-						
	INSTALASI CCTV				-		-						
	PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU				-		-						
	PEKERJAAN SENTRAL CCTV				-		-						
	Pek. Pemasangan Patch Panel UTP Cat 6 4 Port	NTR	56,00	0,075	90,000	10,000	100,000	50,400	5,600	56,000	0,067	0,007	0,075
	Pek. Pemasangan Rak HUB 12 U (Lengkap dengan Power Outlet)	Unit	1,00	0,012	90,000	10,000	100,000	0,900	0,100	1,000	0,011	0,001	0,012
	TV Monitor 50 Lengkap Braket & Assesoris	Unit	1,00	0,022	90,000	10,000	100,000	0,900	0,100	1,000	0,020	0,002	0,022
	Digital Recorder (DVR) lengkap assesoris	Unit	2,00	0,077	90,000	10,000	100,000	1,800	0,200	2,000	0,069	0,008	0,077
	Pek. Pemasangan Keyboard + Mouse	Unit	1,00	0,000	90,000	10,000	100,000	0,900	0,100	1,000	0,000	0,000	0,000
	Peralatan bantu + Accessories	Unit	1,00	0,009	90,000	10,000	100,000	0,900	0,100	1,000	0,008	0,001	0,009
	PEKERJAAN INSTALASI & FIXTURES												
	Lantai 01												
	Instalasi Camera CCTV colour camera c/w RG 59	Bhk	18,00	0,024	100,000	-	100,000	18,000	-	18,000	0,024	-	0,024
	Camera CCTV colaulit camera outdoor c/w fixed doom shaped ty	Bhk	4,00	0,044	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,044	-	0,044
	Camera CCTV colaulit camera indoor c/w fixed doom shaped type	Unit	12,00	0,029	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000	0,029	-	0,029
	Lantai 02				-								
	Instalasi Camera CCTV colour camera c/w RG 59	Bhk	8,00	0,011	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,011	-	0,011
	Camera CCTV colaulit camera indoor c/w fixed doom shaped type	Unit	8,00	0,019	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,019	-	0,019
	Lantai 03				-								
	Instalasi Camera CCTV colour camera c/w RG 59	Bhk	8,00	0,011	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,011	-	0,011
	Camera CCTV colaulit camera indoor c/w fixed doom shaped type	Unit	8,00	0,019	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,019	-	0,019
	Lantai 04				-								
	Instalasi Camera CCTV colour camera c/w RG 59	Bhk	8,00	0,011	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,011	-	0,011
	Camera CCTV colaulit camera indoor c/w fixed doom shaped type	Unit	8,00	0,019	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,019	-	0,019
	Lantai 05				-								
	Instalasi Camera CCTV colour camera c/w RG 59	Bhk	8,00	0,011	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,011	-	0,011
	Camera CCTV colaulit camera indoor c/w fixed doom shaped type	Unit	8,00	0,019	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,019	-	0,019
	PEKERJAAN KABEL MATV												
	Peralatan utama MATV (Ruang Control Engineering)												
	Terrestrial antenna VHF lengkap dengan tiang	Unit	1,00	0,003	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,003	-	0,003
	Terrestrial antenna UHF 1	Unit	1,00	0,003	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,003	-	0,003
	Terrestrial antenna UHF 2	Unit	1,00	0,003	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,003	-	0,003
	Alat bantu , penunjang lainya sehingga system berfungsi	ls	1,00	0,007	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,007	-	0,007
	Modulator Unit 27 Chanel	Unit	2,00	0,015	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,015	-	0,015
	Power Amplifier Modulator	Unit	5,00	0,020	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,020	-	0,020
	Receiver Chanel	Unit	27,00	0,060	100,000	-	100,000	27,000	-	27,000	0,060	-	0,060
	Antena Parabola 6 Feet Lengkap Assesoris dan Vertikal Horisontal	Unit	1,00	0,005	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,005	-	0,005
	PEKERJAAN INSTALASI				-								
	Kabel Coaxial RG 11 C - 2 volt dari lantai 8gake Ruang OPERATO	mtr	100,00	0,008	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	0,008	-	0,008
	Alat bantu dan material pendukung lainnya	lot	1,00	0,002	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,002	-	0,002
	Testing dan Comissioning	lot	1,00	0,002	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,002	-	0,002
	Lantai 01				-								
	Instalasi dalam pipa Conduit dengan kabel Coaxial 5 C -2 Volt 75	Titik	7,00	0,009	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,009	-	0,009
	Out let MATV	unit	7,00	0,001	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,001	-	0,001
	Splitter 6 way	Unit	7,00	0,001	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,001	-	0,001
	Terminal Box TBTV	Unit	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
	Lantai 02				-								
	Instalasi dalam pipa Conduit dengan kabel Coaxial 5 C -2 Volt 75	Titik	8,00	0,011	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,011	-	0,011
	Out let MATV	unit	8,00	0,002	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,002	-	0,002
	Splitter 6 way	Unit	8,00	0,002	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,002	-	0,002
	Terminal Box TBTV	Unit	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
	Lantai 03				-								
	Instalasi dalam pipa Conduit dengan kabel Coaxial 5 C -2 Volt 75	Titik	10,00	0,013	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	0,013	-	0,013
	Out let MATV	unit	10,00	0,002	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	0,002	-	0,002
	Splitter 6 way	Unit	10,00	0,002	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	0,002	-	0,002
	Terminal Box TBTV	Unit	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
	Lantai 04				-								
	Instalasi dalam pipa Conduit dengan kabel Coaxial 5 C -2 Volt 75	Titik	9,00	0,012	100,000	-	100,000	9,000	-	9,000	0,012	-	0,012
	Out let MATV	unit	9,00	0,002	100,000	-	100,000	9,000	-	9,000	0,002	-	0,002
	Splitter 6 way	Unit	9,00	0,002	100,000	-	100,000	9,000	-	9,000	0,002	-	0,002
	Terminal Box TBTV	Unit	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
	Lantai 05				-								
	Instalasi dalam pipa Conduit dengan kabel Coaxial 5 C -2 Volt 75	Titik	5,00	0,007	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,007	-	0,007
	Out let MATV	unit	5,00	0,001	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,001	-	0,001
	Splitter 6 way	Unit	5,00	0,001	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,001	-	0,001
	Terminal Box TBTV	Unit	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
	INSTALASE TELEPHONE												
	MDF. TEL Cap. 100 pair	Unit	1,00	0,004	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,004	-	0,004
	Instalasi kabel Jelly armord cable ITC 10x 2x0,6mm,	Mtr	100,00	0,081	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	0,081	-	0,081
	PABX Cap 10/ 150 (lengkap) ks id 824 md. dengan operator Kun	set	1,00	0,024	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,024	-	0,024
	INSTALASE KABEL FEEDER				-								
	Instalasi lengkap dengan kabel JTC 10 pairs x 0,2x0,6mm2 dari T	mtr	100,00	0,081	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	0,081	-	0,081
	Testing dan Comissioning	lot	1,00	0,002	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,002	-	0,002
	INSTALASE TITIK TELEPHONE				-								
	Lantai 01				-								

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					RENCANAAN PEKERJAAN %			VOLUME PEKERJAAN			BOBOT PEKERJAAN %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	Instalasi lengkap kabel (TC 2x0,6mm, dalam conduit Ø 20 mm	titik	5,00	0,004	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,004	-	0,004
	Out let Telpon	bh	5,00	0,000	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,000	-	0,000
	Terminal Box	bh	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
	Lantai 02		-	-									
	Instalasi lengkap kabel (TC 2x0,6mm, dalam conduit Ø 20 mm	titik	8,00	0,006	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,006	-	0,006
	Out let Telpon	bh	8,00	0,001	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,001	-	0,001
	Terminal Box	bh	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
	Lantai 03		-	-									
	Instalasi lengkap kabel (TC 2x0,6mm, dalam conduit Ø 20 mm	titik	8,00	0,006	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,006	-	0,006
	Out let Telpon	bh	8,00	0,001	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,001	-	0,001
	Terminal Box	bh	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
	Lantai 04		-	-									
	Instalasi lengkap kabel (TC 2x0,6mm, dalam conduit Ø 20 mm	titik	9,00	0,007	100,000	-	100,000	9,000	-	9,000	0,007	-	0,007
	Out let Telpon	bh	9,00	0,001	100,000	-	100,000	9,000	-	9,000	0,001	-	0,001
	Terminal Box	bh	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
	Lantai 05		-	-									
	Instalasi lengkap kabel (TC 2x0,6mm, dalam conduit Ø 20 mm	titik	4,00	0,003	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,003	-	0,003
	Out let Telpon	bh	4,00	0,000	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,000	-	0,000
	Terminal Box	bh	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
	INSTALASI SOUND SYSTEM												
	Pek. Pemasangan MIX-55	Unit	1,00	0,009	70,000	30,000	100,000	0,700	0,300	1,000	0,007	0,003	0,009
	Pek. Pemasangan Selector Switch c/w Control Panel Z-SS1010R	Unit	1,00	0,013	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,013	-	0,013
	Pek. Pemasangan Power Amplifier 480 Watt Z-PV2480PA-AS	Unit	1,00	0,030	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,030	-	0,030
	Pek. Pemasangan System Controller (Mixer Pre Amp+Equalizer)	Unit	1,00	0,098	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,098	-	0,098
	Pek. Pemasangan VCD/DVD/MP3/Mp4/MMC/USB Player With	Unit	1,00	0,016	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,016	-	0,016
	Pek. Pemasangan Sound Source	Unit	1,00	0,001	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,001	-	0,001
	Pek. Pemasangan Automatic Alarm System Z-PV200EV-AS	Unit	1,00	0,031	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,031	-	0,031
	Pek. Pemasangan Remote Paging Microphone EM-200M	Unit	1,00	0,020	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,020	-	0,020
	Pek. Pemasangan UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup	Unit	1,00	0,007	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,007	-	0,007
	Pek. Pemasangan Rack Cabinet c/w accesoris RACK 23.	Unit	1,00	0,060	100,000	-	100,000	1,000	-	1,000	0,060	-	0,060
	Instalasi kabel terminal box		-	-									
	Instalasi lengkap kabel,NYMHY 2 x 1,5 mm ke TB TS	Mtr	100,00	0,008	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	0,008	-	0,008
	Testing dan Commisioning	Ket	1,00	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lantai 01		-	-									
	Pek. Pemasangan Terminal Box Tata Suara (TBTS)	titik	1,00	0,001	70,000	30,000	100,000	0,700	0,300	1,000	0,000	0,000	0,001
	Pek. Pemasangan Instalasi Ceiling Speaker	titik	30,00	0,024	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	0,024	-	0,024
	Pek. Pemasangan Instalasi Horn Speaker	titik	8,00	0,006	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,006	-	0,006
	Ceiling Speaker 6 watt Z5-648R	titik	30,00	0,020	85,000	15,000	100,000	25,500	4,500	30,000	0,017	0,003	0,020
	Pek. Pemasangan Wall Speaker Z5-062	titik	4,00	0,004	80,000	20,000	100,000	3,200	0,800	4,000	0,004	0,001	0,004
	Pek. Pemasangan Horn Speaker ZH-615SM	titik	4,00	0,006	80,000	20,000	100,000	3,200	0,800	4,000	0,004	0,001	0,006
	Attenuator 30 db ZV-303	titik	7,00	0,007	80,000	20,000	100,000	5,600	1,400	7,000	0,006	0,001	0,007
	Lantai 02		-	-									
	Pek. Pemasangan Terminal Box Tata Suara (TBTS)	titik	1,00	0,001	70,000	30,000	100,000	0,700	0,300	1,000	0,000	0,000	0,001
	Pek. Pemasangan Instalasi Ceiling Speaker	titik	28,00	0,023	100,000	-	100,000	28,000	-	28,000	0,023	-	0,023
	Pek. Pemasangan Instalasi Horn Speaker	titik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Ceiling Speaker 6 watt Z5-648R	titik	28,00	0,018	80,000	20,000	100,000	22,400	5,600	28,000	0,015	0,004	0,018
	Pek. Pemasangan Wall Speaker Z5-062	titik	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,002	0,000	0,002
	Attenuator 30 db ZV-303	titik	10,00	0,010	50,000	50,000	100,000	5,000	5,000	10,000	0,005	0,005	0,010
	Lantai 03		-	-									
	Pek. Pemasangan Terminal Box Tata Suara (TBTS)	titik	1,00	0,001	70,000	30,000	100,000	0,700	0,300	1,000	0,000	0,000	0,001
	Pek. Pemasangan Instalasi Ceiling Speaker	titik	28,00	0,023	100,000	-	100,000	28,000	-	28,000	0,023	-	0,023
	Pek. Pemasangan Instalasi Horn Speaker	titik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Ceiling Speaker 6 watt Z5-648R	titik	28,00	0,018	80,000	20,000	100,000	22,400	5,600	28,000	0,015	0,004	0,018
	Pek. Pemasangan Wall Speaker Z5-062	titik	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,002	0,000	0,002
	Attenuator 30 db ZV-303	titik	10,00	0,010	50,000	50,000	100,000	5,000	5,000	10,000	0,005	0,005	0,010
	Lantai 04		-	-									
	Pek. Pemasangan Terminal Box Tata Suara (TBTS)	titik	1,00	0,001	70,000	30,000	100,000	0,700	0,300	1,000	0,000	0,000	0,001
	Pek. Pemasangan Instalasi Ceiling Speaker	titik	28,00	0,023	100,000	-	100,000	28,000	-	28,000	0,023	-	0,023
	Pek. Pemasangan Instalasi Horn Speaker	titik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Ceiling Speaker 6 watt Z5-648R	titik	28,00	0,018	60,000	40,000	100,000	16,800	11,200	28,000	0,011	0,007	0,018
	Pek. Pemasangan Wall Speaker Z5-062	titik	2,00	0,002	60,000	40,000	100,000	1,200	0,800	2,000	0,001	0,001	0,002
	Attenuator 30 db ZV-303	titik	10,00	0,010	50,000	50,000	100,000	5,000	5,000	10,000	0,005	0,005	0,010
	Lantai 05		-	-									
	Pek. Pemasangan Terminal Box Tata Suara (TBTS)	titik	1,00	0,001	70,000	30,000	100,000	0,700	0,300	1,000	0,000	0,000	0,001
	Pek. Pemasangan Instalasi Ceiling Speaker	titik	29,00	0,023	100,000	-	100,000	29,000	-	29,000	0,023	-	0,023
	Pek. Pemasangan Instalasi Horn Speaker	titik	2,00	0,002	100,000	-	100,000	2,000	-	2,000	0,002	-	0,002
	Ceiling Speaker 6 watt Z5-648R	titik	29,00	0,019	80,000	20,000	100,000	23,200	5,800	29,000	0,015	0,004	0,019
	Pek. Pemasangan Wall Speaker Z5-062	titik	2,00	0,002	80,000	20,000	100,000	1,600	0,400	2,000	0,002	0,000	0,002
	Attenuator 30 db ZV-303	titik	6,00	0,006	50,000	50,000	100,000	3,000	3,000	6,000	0,003	0,003	0,006
	INSTALASI DATA DAN INTERNET												
	Pek. Pemasangan Server/Gateway c/w PC, Monitor, Keyboard, M	Unit	1,00	0,042	40,000	40,000	100,000	0,600	0,400	1,000	0,025	0,017	0,042
	Pek. Pemasangan Main Switch HUB 12 Port	Unit	1,00	0,011	60,000	40,000	100,000	0,600	0,400	1,000	0,006	0,004	0,011
	Pek. Pemasangan Router Broadband	Unit	4,00	0,021	60,000	40,000	100,000	2,400	1,600	4,000	0,012	0,008	0,021
	INSTALASI TITIK DATA DAN INTERNET												
	Lantai 01												
	Pek. Pemasangan Outlet Data	Unit	5,00	0,001	85,000	15,000	100,000	4,250	0,750	5,000	0,001	0,000	0,001
	Pek. Pemasangan Instalasi Outlet Data	Unit	5,00	0,004	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	0,004	-	0,004
	Pek. Pemasangan Patch Cord	Unit	1,00	0,001	85,000	15,000	100,000	0,850	0,150	1,000	0,001	0,000	0,001
	Pek. Pemasangan Patch Panel 24 Port	Unit	1,00	0,005	85,000	15,000	100,000	0,850	0,150	1,000	0,004	0,001	0,005
	Pek. Pemasangan Wifi Access Point (Wifi 6 Radius 50 Meter)	Unit	5,00	0,004	85,000	15,000	100,000	4,250	0,750	5,000	0,004	0,001	0,004
	Lantai 02												
	Pek. Pemasangan Outlet Data	Unit	8,00	0,002	45,000	55,000	100,000	3,600	4,400	8,000	0,001	0,001	0,002
	Pek. Pemasangan Instalasi Outlet Data	Unit	8,00	0,006	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,006	-	0,006
	Pek. Pemasangan Patch Cord	Unit	1,00	0,001	85,000	15,000	100,000	0,850	0,150	1,000	0,001	0,000	0,001
	Pek. Pemasangan Patch Panel 24 Port	Unit	1,00	0,005	85,000	15,000	100,000	0,850	0,150	1,000	0,004	0,001	0,005
	Pek. Pemasangan Wifi Access Point (Wifi 6 Radius 50 Meter)	Unit	8,00	0,007	85,000	15,000	100,000	6,800	1,200	8,000	0,006	0,001	0,007
	Lantai 03												
	Pek. Pemasangan Outlet Data	Unit	8,00	0,001	45,000	55,000	100,000	3,600	4,400	8,000	0,001	0,001	0,001
	Pek. Pemasangan Instalasi Outlet Data	Unit	8,00	0,006	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000	0,006	-	0,006
	Pek. Pemasangan Patch Cord	Unit	1,00	0,001	85,000	15,000	100,000	0,850	0,150	1,000	0,001	0,000	0,001
	Pek. Pemasangan Patch Panel 24 Port	Unit	1,00	0,005	85,000	15,000	100,000	0,850	0,150	1,000	0,004	0,001	0,005
	Pek. Pemasangan Wifi Access Point (Wifi 6 Radius 50 Meter)	Unit	8,00	0,007	85,000	15,000	100,000	6,800	1,200	8,000	0,006	0,001	0,007
	Lantai 04												
	Pek. Pemasangan Outlet Data	Unit	9,00	0,001	45,000	55,000	100,000	4,050	4,950	9,000	0,001	0,001	0,001
	Pek. Pemasangan Instalasi Outlet Data	Unit	9,00	0,007	100,000	-	100,000	9,000	-	9,000	0,007	-	0,007
	Pek. Pemasangan Patch Cord	Unit	1,00	0,001	85,000	15,000	100,000	0,850	0,150	1,000	0,001	0,000	0,001
	Pek. Pemasangan Patch Panel 24 Port	Unit	1,00	0,005	85,000	15,000	100,000	0,850	0,150	1,000	0,004	0,001	0,005
	Pek. Pemasangan Wifi Access Point (Wifi 6 Radius 50 Meter)	Unit	9,00	0,008	85,000	15,000	100,000	7,650	1,350	9,000	0,007	0,001	0,008
	Lantai 05												
	Pek. Pemasangan Outlet Data	Unit	1,00	0,000	15,000	85,000	100,000	0,150	0,850	1,000	0,000	0,000	0,000
	Pek. Pemasangan Instalasi Outlet Data	Unit	4,00	0,003	100,000	-	100,000	4,000	-	4,000	0,003	-	0,003
	Pek. Pemasangan Patch Cord	Unit	1,00	0,001	75,000	25,000	100,000	0,750	0,250	1,000	0,001	0,000	0,001
	Pek. Pemasangan Patch Panel 24 Port	Unit	1,00	0,005	15,000	85,000	100,000	0,150	0,850	1,000	0,001	0,004	0,005
	Pek. Pemasangan Wifi Access Point (Wifi 6 Radius 50 Meter)	Unit	4,00	0,004	15,000	85,000	100,000	0,600	3,400	4,000	0,001	0,003	0,004
	PEMASANGAN ELEVATOR LIFT												
	LIFT PENUMPANG												

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES								
					REALISASI PEKERJAAN %			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI %		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
	Lift (Hoisway Duplex) L1 Dan L2 lengkap dengan Panel ARD dan Pe	Unit	1,00	1,907	97,000	3,000	100,000	0,970	0,030	1,000	1,850	0,057	1,907
	Capacity 1000 kg V 13 person						-						
	Type (RESIN) PA 15 (1000) CO 60 SVS STL HL						-						
	Stop (opening 5 stop dan open						-						
	Termasuk Hoist						-						
							-						
							-						
	III.PEKERJAAN LANDSCAPE						-						
	PEKERJAAN SALURAN						-						
	Pek. Galian Saluran	m3	10,30	0,003	100,000	-	100,000	10,300	-	10,300	0,003	-	0,003
	Pek. Galian Existing Tanah Dasar area diluar gedung	m3	1.145,41	0,310	100,000	-	100,000	1.145,410	-	1.145,410	0,310	-	0,310
	Pekerjaan Pondasi BWT						-						
	- Urugan tanah	m3	22,75	0,006	100,000	-	100,000	22,750	-	22,750	0,006	-	0,006
	- Lantai kerja 10 cm	m3	2,28	0,008	100,000	-	100,000	2,275	-	2,275	0,008	-	0,008
	- Bekesting Balok 30/60	m2	35,70	0,021	100,000	-	100,000	35,700	-	35,700	0,021	-	0,021
	- Pembesian Balok 30/60						-						
	- Pembesian Ulir	kg	240,21	0,013	100,000	-	100,000	240,210	-	240,210	0,013	-	0,013
	- Pembesian Polos	kg	199,29	0,011	100,000	-	100,000	199,290	-	199,290	0,011	-	0,011
	- Pengecoran Balok 30/60	m3	4,59	0,021	100,000	-	100,000	4,590	-	4,590	0,021	-	0,021
	- Pekerjaan Wiremesh 10 mm	kg	402,90	0,018	100,000	-	100,000	402,900	-	402,900	0,018	-	0,018
	- Pengecoran plat lebal 15 cm	m3	3,05	0,014	100,000	-	100,000	3,050	-	3,050	0,014	-	0,014
	Pas. Batu Gunung Campuran 1:4	m3	4,33	0,012	100,000	-	100,000	4,330	-	4,330	0,012	-	0,012
	Pek. Rasteran Saluran	m3	17,51	0,004	100,000	-	100,000	17,510	-	17,510	0,004	-	0,004
	Pek. Paving Blok dan Ramp						-						
	Paving Blok T = 8 cm K300	m2	70,20	0,033	100,000	-	100,000	70,200	-	70,200	0,033	-	0,033
	Pas. Kerebb Lk. 10x20x40	m1	21,00	0,002	100,000	-	100,000	21,000	-	21,000	0,002	-	0,002
							-						
	IV. RUMAH GENSET						-						
	1. PEKERJAAN PONDASI						-						
	Pek. Pondasi Foot (100 x 100 CM)						-						
	Pek. Galian Pondasi	m3	16,34	0,002	100,000	-	100,000	16,340	-	16,340	0,002	-	0,002
	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m3	0,54	0,000	100,000	-	100,000	0,540	-	0,540	0,000	-	0,000
	Rabat Beton Bawah Foot (T = 10 cm)	m3	1,08	0,002	100,000	-	100,000	1,080	-	1,080	0,002	-	0,002
	Bekesting Foot	m3	7,20	0,001	100,000	-	100,000	7,200	-	7,200	0,001	-	0,001
	Bes Beton Ulir	kg	393,83	0,010	100,000	-	100,000	393,830	-	393,830	0,010	-	0,010
	Beton K250	m3	2,25	0,005	100,000	-	100,000	2,250	-	2,250	0,005	-	0,005
	Urugan Tanah Kembali	m3	5,45	0,001	100,000	-	100,000	5,450	-	5,450	0,001	-	0,001
	2. Pek. Pondasi Batu Gunung						-						
	Galian Tanah Pondasi	m3	21,00	0,003	100,000	-	100,000	21,000	-	21,000	0,003	-	0,003
	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m3	2,10	0,001	100,000	-	100,000	2,100	-	2,100	0,001	-	0,001
	Urugan Tanah Kembali	m3	7,00	0,001	100,000	-	100,000	7,000	-	7,000	0,001	-	0,001
	Pas. Batu kosong	m3	6,72	0,005	100,000	-	100,000	6,720	-	6,720	0,005	-	0,005
	Pas. Batu Gunung Campuran 1:4	m3	17,64	0,026	100,000	-	100,000	17,640	-	17,640	0,026	-	0,026
	3. Pedestal Kolom						-						
	Bekesting Kolom	m2	16,20	0,005	100,000	-	100,000	16,200	-	16,200	0,005	-	0,005
	Bes Beton polos	kg	55,49	0,001	100,000	-	100,000	55,490	-	55,490	0,001	-	0,001
	Bes Beton Ulir	kg	85,22	0,002	100,000	-	100,000	85,220	-	85,220	0,002	-	0,002
	Beton K250	m3	1,22	0,003	100,000	-	100,000	1,220	-	1,220	0,003	-	0,003
	4. Sloof 30 x 30						-						
	Bekesting	m2	23,58	0,005	100,000	-	100,000	23,580	-	23,580	0,005	-	0,005
	Bes Beton polos	kg	113,07	0,003	100,000	-	100,000	113,070	-	113,070	0,003	-	0,003
	Bes Beton Ulir	kg	265,14	0,007	100,000	-	100,000	265,140	-	265,140	0,007	-	0,007
	Beton K250	m3	2,36	0,005	100,000	-	100,000	2,360	-	2,360	0,005	-	0,005
	5. Kolom K1 40 x 40						-						
	Bekesting Kolom	m2	6,40	0,002	100,000	-	100,000	6,400	-	6,400	0,002	-	0,002
	Bes Beton polos	kg	19,73	0,001	100,000	-	100,000	19,730	-	19,730	0,001	-	0,001
	Bes Beton Ulir	kg	50,50	0,001	100,000	-	100,000	50,500	-	50,500	0,001	-	0,001
	Beton K250	m3	0,36	0,001	100,000	-	100,000	0,360	-	0,360	0,001	-	0,001
	6. Kolom 30 x 30						-						
	Bekesting Kolom	m2	38,40	0,011	100,000	-	100,000	38,400	-	38,400	0,011	-	0,011
	Bes Beton polos	kg	133,16	0,004	100,000	-	100,000	133,160	-	133,160	0,004	-	0,004
	Bes Beton Ulir	kg	202,01	0,005	100,000	-	100,000	202,010	-	202,010	0,005	-	0,005
	Beton K250	m3	2,88	0,006	100,000	-	100,000	2,880	-	2,880	0,006	-	0,006
	7. Balok 30 x 40						-						
	Bekesting Balok	m2	29,87	0,009	100,000	-	100,000	29,870	-	29,870	0,009	-	0,009
	Bes Beton polos	kg	177,68	0,005	100,000	-	100,000	177,680	-	177,680	0,005	-	0,005
	Bes Beton Ulir	kg	265,14	0,007	100,000	-	100,000	265,140	-	265,140	0,007	-	0,007
	Beton K250	m3	2,20	0,005	100,000	-	100,000	2,200	-	2,200	0,005	-	0,005
	8. Plat Beton T 12 cm						-						
	Bekesting	m2	72,33	0,041	100,000	-	100,000	72,330	-	72,330	0,041	-	0,041
	Bes Beton polos	kg	1.020,92	0,027	100,000	-	100,000	1.020,920	-	1.020,920	0,027	-	0,027
	Beton K250	m3	8,68	0,019	100,000	-	100,000	8,680	-	8,680	0,019	-	0,019
	9. Balok Praktis	m	43,20	0,010	100,000	-	100,000	43,200	-	43,200	0,010	-	0,010
	10. Pekerjaan Dinding						-						
	Pas. Dinding 1\2 Batu (1 3)	m2	108,33	0,024	100,000	-	100,000	108,330	-	108,330	0,024	-	0,024
	Pek. Rasteran Dinding (1 3)	m2	216,66	0,026	100,000	-	100,000	216,660	-	216,660	0,026	-	0,026
	Pek. Acian Dinding dan Beton	m2	216,66	0,015	100,000	-	100,000	216,660	-	216,660	0,015	-	0,015
	Pek. Pengecatan	m2	216,66	0,012	100,000	-	100,000	216,660	-	216,660	0,012	-	0,012
	11. Pekerjaan Lantai						-						
	Rabat Beton (T = 10 cm) K250	m3	5,05	0,009	100,000	-	100,000	5,050	-	5,050	0,009	-	0,009
	Pek. Waterproofing Sika	m2	98,01	0,017	100,000	-	100,000	98,010	-	98,010	0,017	-	0,017
	Pek. Rasteran Lantai (1 2)	m2	98,01	0,012	100,000	-	100,000	98,010	-	98,010	0,012	-	0,012
	Pek. Acian	m2	98,01	0,007	100,000	-	100,000	98,010	-	98,010	0,007	-	0,007
	Pek. Cat Anti Bocor (No Drop)	m2	98,01	0,012	100,000	-	100,000	98,010	-	98,010	0,012	-	0,012
	12. Pekerjaan Pintu dan Jendela						-						
	Pekerjaan Pintu Besi	m2	18,75	0,034	-	100,000	100,000	-	18,750	18,750	-	0,034	0,034
	Pekerjaan Jendela	m2	14,40	0,010	-	100,000	100,000	-	14,400	14,400	-	0,010	0,010
	Pengecatan Pintu Besi dan Jendela	m2	37,50	0,002	-	100,000	100,000	-	37,500	37,500	-	0,002	0,002
	13.Pek. Dudukan Genset						-						
	Pek. Pondasi Batu Gunung						-						
	Galian Tanah Pondasi	m3	6,50	0,001	100,000	-	100,000	6,500	-	6,500	0,001	-	0,001
	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m3	0,65	0,000	100,000	-	100,000	0,650	-	0,650	0,000	-	0,000
	Urugan Tanah Kembali	m3	2,17	0,000	100,000	-	100,000	2,170	-	2,170	0,000	-	0,000
	Pas. Batu kosong	m3	2,08	0,001	100,000	-	100,000	2,080	-	2,080	0,001	-	0,001
	Pas. Batu Gunung Campuran 1:4	m3	5,46	0,008	100,000	-	100,000	5,460	-	5,460	0,008	-	0,008
	Sloof 20 x 30						-						
	Bekesting	m2	7,20	0,001	100,000	-	100,000	7,200	-	7,200	0,001	-	0,001
	Bes Beton polos	kg	34,52	0,001	100,000	-	100,000	34,520	-	34,520	0,001	-	0,001
	Bes Beton Ulir	kg	82,07	0,002	100,000	-	100,000	82,070	-	82,070	0,002	-	0,002
	Beton K250	m3	0,72	0,002	100,000	-	100,000	0,720	-	0,720	0,002	-	0,002
	Plat Beton T 15 cm						-						
	Timbunan Sirtu	m2	2,70	0,001	100,000	-	100,000	2,700	-	2,700	0,001	-	0,001
	Bes Beton polos	kg	213,06	0,006	100,000	-	100,000	213,060	-	213,060	0,006	-	0,006
	Beton K250	m3	1,35	0,003	100,000	-	100,000	1,350	-	1,350	0,003	-	0,003
				100	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN						98,09	1,83	99,92
					RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN						100,00	-	100,00
					DEVIASI						-1,91	0,00	-0,08

Keterangan: Realisasi Rencana

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu
Sekolah Agama Islam Negeri Pontianak

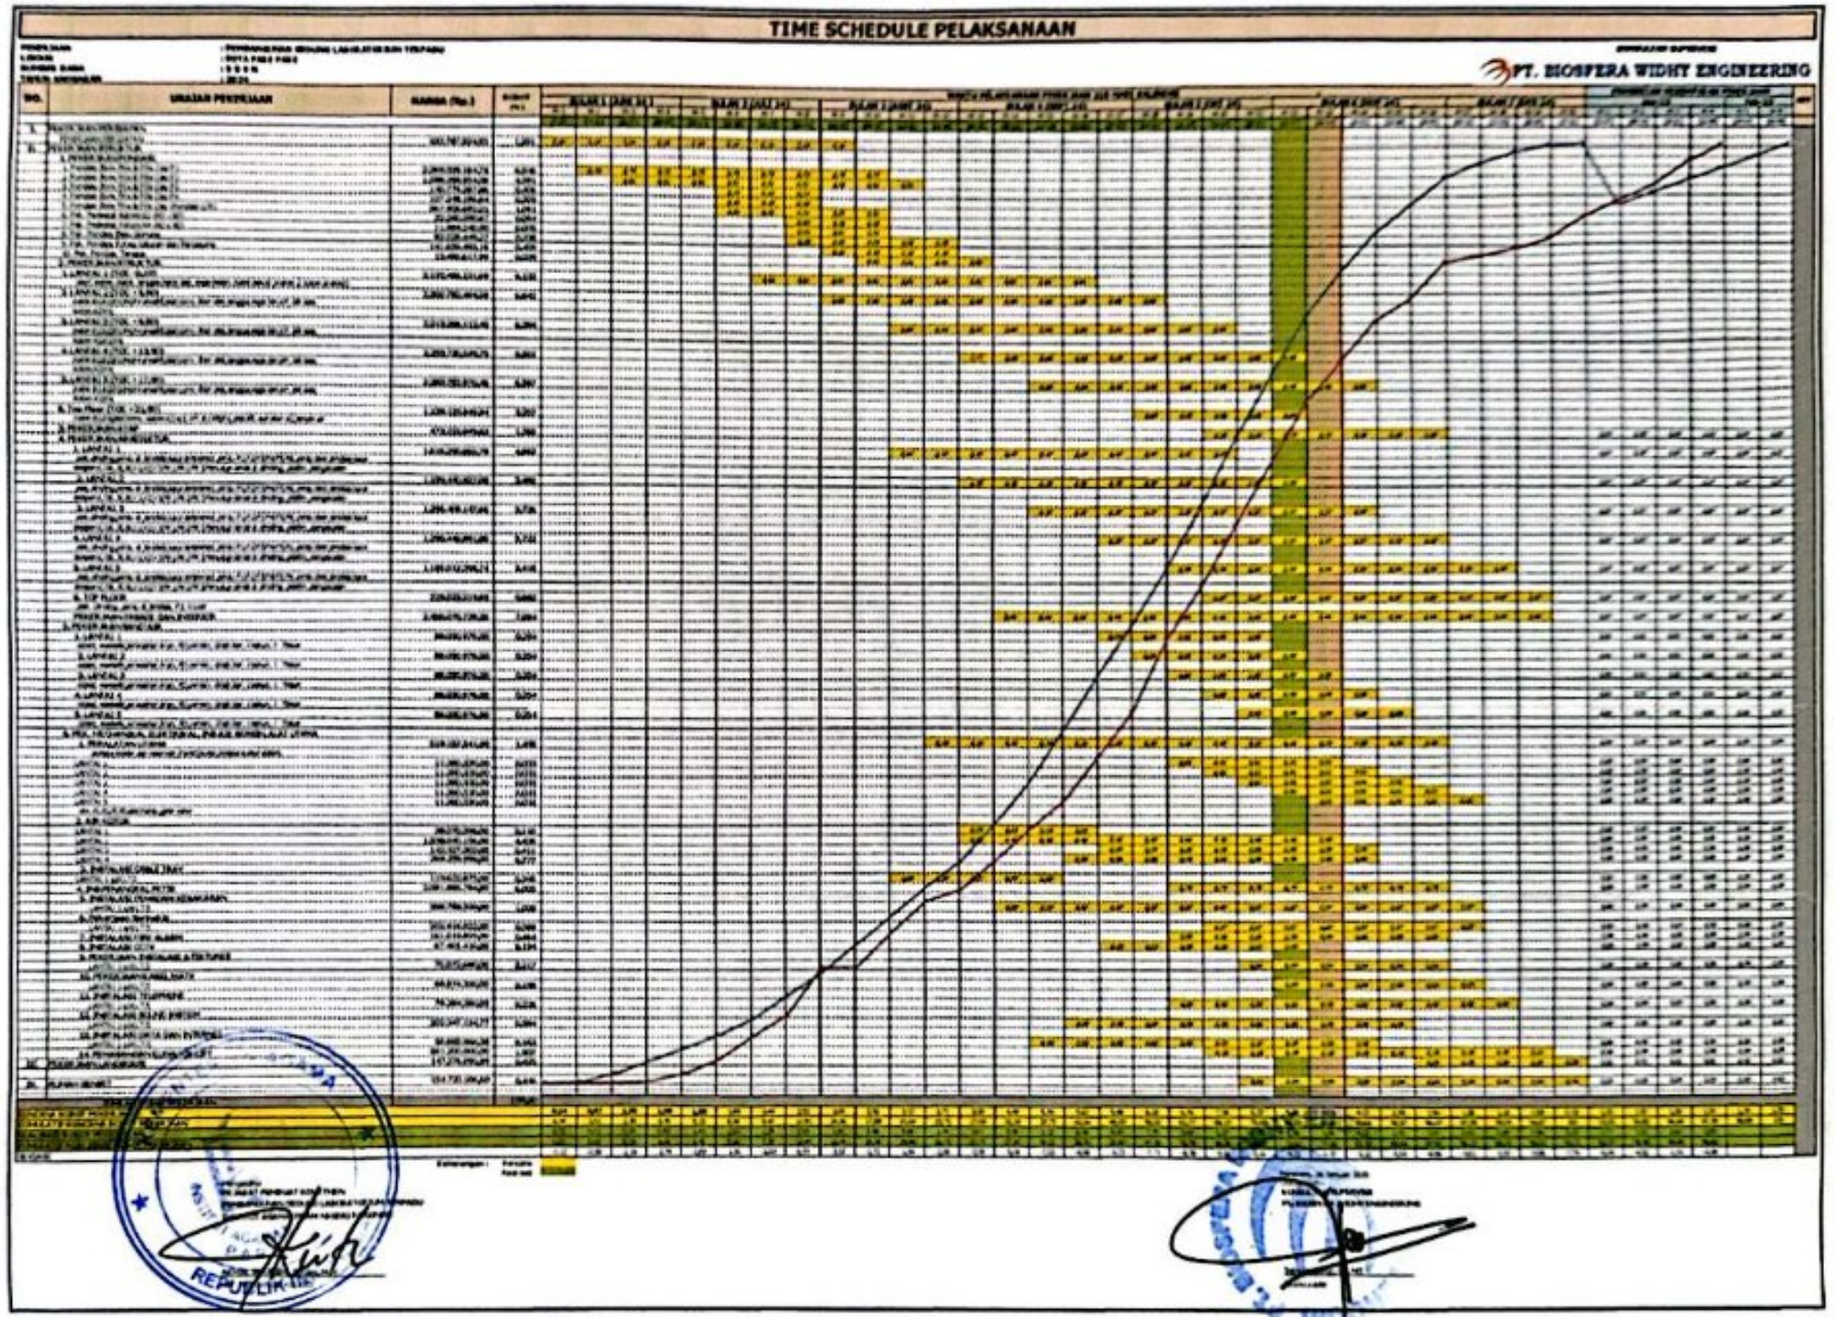
Akhmad Ibrahim, S.E.am., M.M
NIP. 198206222014111003

Dibuat Oleh :
Konsultan Supervisi
PT. Bintang Widhy Engineering

Iqbal Maulana, ST., MT
Team Leader

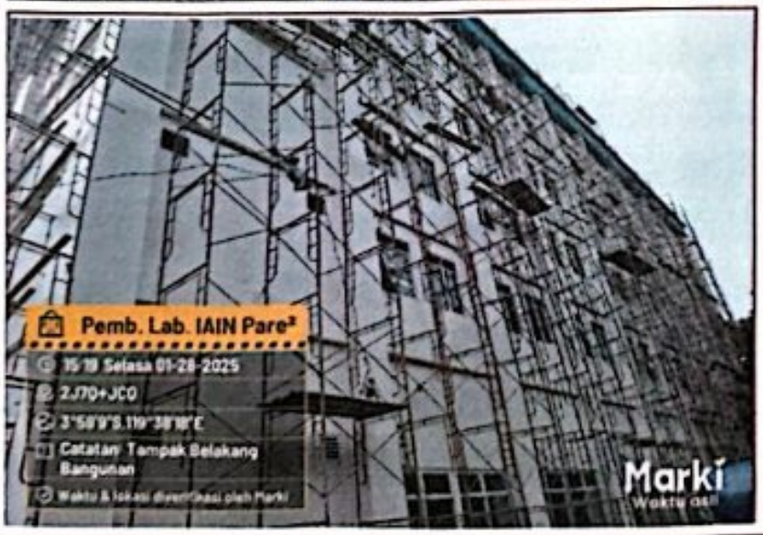
TIME SCHEDULE PELAKSANAAN

PT. BIOSFERA WIDHY ENGINEERING



	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE

	**TAMPAK DEPAN (ZONA A)**
	**TAMPAK DEPAN (ZONA B)**
	**TAMPAK BELAKANG BANGUNAN**

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE

	**PHO**
	**PHO**
	**PHO**

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE

	**PHO**
	**PHO**
	**PHO**

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN

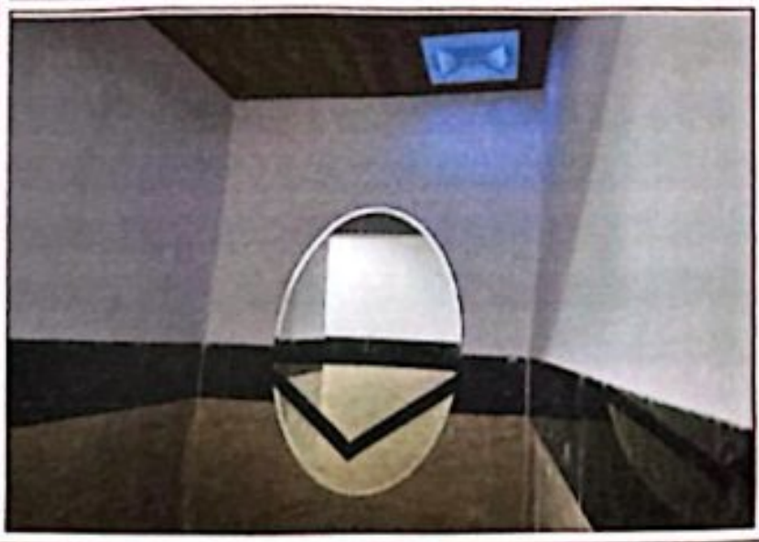
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE

	**PEKERJAAN RAMP WAY**
	**PEKERJAAN RUMAH TRAVO**
	**PEKERJAAN PINTU KACA**

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE

	**PEKERJAAN TOILET LANTAI 1**
	**PEKERJAAN TOILET LANTAI 1**
	**PEKERJAAN TOILET LANTAI 1**

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE



PINTU DALAM TOILET



PINTU LUAR TOILET

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

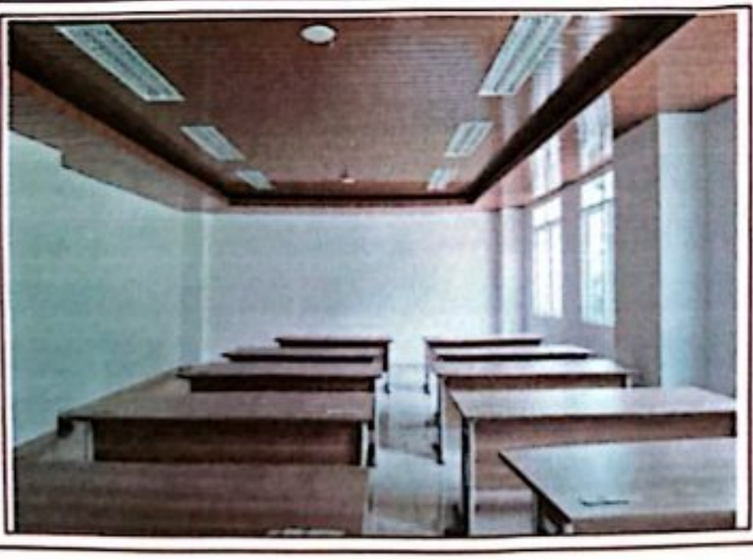
PEKERJAAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE

	**RAILING TANGGA LANTAI 1**
	**PLAFON LANTAI 2**
	**RAILING AREA VOID LANTAI 2**

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE

	**PINTU TOILET LANTAI 2**
	**KORIDOR LANTAI 2**
	**RUANGAN LANTAI 2**

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE

	**RUANGAN LANTAI 3**
	**RAILING TANGGA LANTAI 3**
	**KORIDOR LANTAI 3**

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE



RUANGAN LANTAI 4



RUANGAN LANTAI 4



PINTU TOILET LANTAI 4

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE



KUSEN JENDELA LANTAI 4



KORIDOR LANTAI 4



TANGGA LANTAI 4

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE

	**KORIDOR LANTAI 5**
	**PLAFON LANTAI 5**
	**TOILET LANTAI 5**

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE

	**TAMPAK DEPAN BANGUNAN**
	**TAMPAK DEPAN**
	**TAMPAK SAMPING KANAN**

	ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE SBSN 2024	**KONSULTAN PENGAWAS**

PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PARE-PARE



TAMPAK SAMPING KIRI



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK BELAKANG BANGUNAN
